



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS ASSUNTOS DE FINANÇAS PÚBLICAS

Relatório n.º 1/VII/2022

**Assunto: Acompanhamento do Relatório Intercalar da Execução
Orçamental do Ano de 2021 e dos Relatórios da Execução
Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração do 2.º e 3.º Trimestres de
2021**

I. INTRODUÇÃO

1. A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas (doravante designada por Comissão) foi constituída nos termos do artigo 29.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução n.º 1/1999, com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.os 1/2004, 2/2009, 1/2013, 1/2015 e 2/2017.

2. No dia 19 de Novembro de 2021, a Comissão aprovou, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º e no artigo 88.º do Regimento da Assembleia Legislativa, as regras relativas ao seu funcionamento - Regras de Funcionamento da Comissão de Acompanhamento para os



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Assuntos de Finanças Públicas (doravante designadas por “Regras de Funcionamento”) - constantes do Anexo da sua Deliberação n.º 1/2021.

3. De acordo com o n.º 1 do artigo 9.º das supracitadas Regras de funcionamento: “[a]s comissões de acompanhamento devem elaborar um relatório ou parecer sempre que terminem o acompanhamento de um assunto, podendo propor as medidas consideradas necessárias ou adequadas à matéria em análise”.
4. No exercício das suas competências, a Comissão reuniu-se nos dias 29 de Dezembro de 2021 e 28 de Janeiro de 2022 para o acompanhamento das seguintes matérias: Relatório Intercalar da Execução Orçamental do Ano de 2021, Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração do 2.º Trimestre de 2021 e Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração do 3.º Trimestre de 2021.
5. Estiveram presentes na reunião de 28 de Janeiro de 2022 para a apresentação e a prestação de informações à Comissão sobre o



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

assunto acima referido os representantes do Governo, nomeadamente, o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong; a chefe e o assessor do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, respectivamente, Ku Mei Leng e Lo Chi Fai; o director, a subdirectora e a chefe da Divisão de Orçamento e Contas Públicas da Direcção dos Serviços de Finanças, respectivamente, Long Kong Leong, Ho In Mui e Tam Lai Há; o chefe da Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Fung Kam Meng; os administradores do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais, respectivamente, Mak Kim Meng e Lam Sio Un; a administradora do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, Lei Ho Ian; o coordenador do Gabinete e a chefe do Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, respectivamente, Chio U Man e Chan Si Man; a directora, a chefe do Departamento de Administração e o chefe do Departamento de Sistema Informático da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, respectivamente, Kok Fong Mei, U Lai Kok e Ngou Kuok Lim; a chefe do Departamento de Organização e Gestão Administrativa e Financeira do Instituto Cultural, Chong Yi Man; o director substituto dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Wong Chiu Man; o coordenador-adjunto do Gabinete



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Sam Weng Chon; e o chefe do Centro de Gestão de Infra-estruturas Ambientais da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Chan Kwok Ho.

6. A Comissão, tendo concluído os referidos trabalhos de acompanhamento, apresenta o relatório que se segue.
7. Os valores referenciados no presente relatório têm como unidade monetária a Pataca.

II. PONTO DE SITUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO

8. Durante a reunião, o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, começou por proceder a uma breve apresentação à Comissão sobre o Relatório Intercalar da Execução Orçamental do Ano de 2021 e os Relatórios da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração do 2.º e 3.º Trimestres de 2021.
9. Segundo o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, em 2021, devido ao impacto contínuo da pandemia do novo tipo de coronavírus, o Governo lançou várias medidas de apoio económico e



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

de redução e isenção fiscais, tendo procedido também à correspondente articulação das despesas públicas financeiras. Para o efeito, através da Lei n.º 3/2021, que altera a Lei do Orçamento de 2021, foi prestado apoio financeiro às medidas referidas.

10. Após a referida alteração orçamental, a receita do orçamento ordinário integrado do Orçamento da RAEM para o ano económico de 2021 foi alterada para 104 mil 118 milhões e 700 mil patacas, a despesa do orçamento ordinário integrado foi alterada para 103 mil 521 milhões e 580 mil patacas, e o saldo do orçamento ordinário integrado foi de 597 milhões e 120 mil patacas, mantendo-se a receita do orçamento agregado dos organismos especiais em 15 mil 405 milhões e 800 mil patacas, enquanto a despesa do orçamento agregado dos organismos especiais foi alterada para 15 mil 831 milhões e 150 mil patacas, traduzindo-se num prejuízo operacional de 425 milhões e 350 mil patacas. O orçamento agregado de investimento dos organismos especiais mantém-se em 501 milhões e 780 mil patacas.

11. Até 30 de Junho de 2021, a receita ordinária integrada cobrada pela RAEM atingiu 52 mil 631 milhões e 760 mil patacas, com uma taxa de execução orçamental de 50,5%, incluindo a utilização da reserva extraordinária no valor de 21 mil 12 milhões e 240 mil patacas; por



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

outro lado, a despesa ordinária integrada liquidada ascendeu a 44 mil 13 milhões e 440 mil patacas, correspondendo a uma taxa de execução orçamental de 42,5%. Registou-se um saldo orçamental de 8 mil 618 milhões e 320 mil patacas. Quanto ao orçamento agregado dos organismos especiais, no 1.º semestre verificou-se uma receita de 9 mil 854 milhões e 680 mil patacas, uma taxa de execução orçamental de 64%, uma despesa de 6 mil 344 milhões e 440 mil patacas e uma taxa de execução orçamental de 40,1%, e um saldo positivo de 3 mil 510 milhões e 240 mil patacas.

-
12. Em relação ao relatório de execução orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (adiante designado por “PIDDA”), o orçamento inicial cifrou-se em 18 mil 510 milhões e 890 mil patacas, o orçamento do PIDDA autorizado no 3.º trimestre fixou-se em 18 mil 584 milhões e 250 mil patacas, a despesa efectiva fixou-se em 8 mil 631 milhões e 900 mil patacas, com uma taxa de execução orçamental de 46,4%, com um valor de cabimentação de 14 mil 780 milhões e 560 mil patacas, e com uma taxa de utilização de 79,5%.
13. Houve membros da Comissão que se mostraram preocupados com a insuficiência das despesas com as regalias do pessoal da Autoridade



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

[Handwritten signature]

Monetária de Macau (AMCM) questionando: atendendo à actual situação económica, será que ainda é suficiente para dar resposta à situação?

[Handwritten signature]

14. Segundo o representante da AMCM, a questão tem essencialmente a ver com as pensões de aposentação. De acordo com a avaliação da empresa actuarial, a AMCM tem de efectuar contribuições para o Fundo de Previdência do Pessoal da AMCM, no entanto, depois de feita uma avaliação do montante dos activos, a dimensão desses activos será suficiente para fazer face à insuficiência de capital, e para além disso, com vista à articulação com a política de contenção de despesas do Governo da RAEM, a AMCM decidiu não efectuar contribuições adicionais para o fundo em 2021, mas vai continuar a estudar o relatório de avaliação da empresa actuarial, para decidir se, no futuro, será necessário ou não efectuar contribuições para o fundo.
15. Além disso, houve membros da Comissão que se preocuparam com a existência, ou não, de critérios ou instruções de investimento definidos pelo Governo para os organismos especiais.
16. Segundo o representante da AMCM, esta autoridade dispõe de orientações de investimento e criou uma comissão de investimento, e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

é esta que define mensalmente as políticas de investimento da reserva cambial, aprova a respectiva decisão e submete-a à apreciação do Conselho de Administração. Quanto aos restantes organismos especiais, segundo os representantes da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), o Governo tem um critério básico, ou seja, os investimentos têm de ser mais seguros e de menor risco, no entanto, os organismos podem decidir qual é a empresa gestora de fundos que vão escolher para a prestação de apoio nos investimentos.

17. Posteriormente, os representantes da DSF, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), Instituto Cultural (IC), Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau (DSFSM) e Serviços de Polícia Unitários (SPU) apresentaram à Comissão as situações mais recentes dos projectos de execução orçamental do PIDDA nos 2.º e 3.º trimestres de 2021, a cargo dos seus serviços.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Finanças

18. Segundo os representantes da DSF, no orçamento do PIDDA referente aos 2.º e 3.º trimestres de 2021, esta Direcção procedeu ao reforço das despesas orçamentais de dois projectos - a aquisição do Edifício Ritz e a aquisição da Mansão Chiu:

18.1 Edifício Ritz

No 2.º trimestre de 2021, o orçamento do PIDDA foi reforçado com uma despesa orçamentada de 762 866,66 patacas, destinada à aquisição da quota-parte do direito de propriedade do Edifício Ritz, sito na Rua Sul do Mercado de S. Domingos. Em 1988, a Administração Portuguesa de Macau chegou a acordo com os três proprietários do Edifício Ritz para a sua aquisição, tendo concordado em efectuar o respectivo pagamento em quatro prestações. Em Janeiro de 1989, a Administração Portuguesa de Macau concluiu o pagamento da terceira prestação do edifício, no entanto, devido ao falecimento de dois proprietários, não foi possível concluir o procedimento de aquisição nos termos do prazo previsto. Posteriormente, a DSF conseguiu entrar em contacto com o proprietário que ainda está vivo, bem como com o herdeiro de um dos falecidos, e, em Julho de 2021, foi celebrado o



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

contrato de compra e venda relativo à aquisição de 2/3 da propriedade do edifício, que é actualmente utilizado pela Direcção dos Serviços de Turismo. Quanto ao restante 1/3, o Governo da RAEM vai continuar a tratar do assunto através de procedimento judicial.

18.2 Mansão Chiu

No 3.º trimestre de 2021, o orçamento do PIDDA foi reforçado com uma despesa de 8 milhões de patacas para a aquisição de um prédio, vulgarmente conhecido por "Mansão Chiu", sítio na Travessa da Porta n.º 24. A aquisição deveu-se ao facto de o IC, ouvido o Conselho do Património Cultural, ter considerado que o prédio possui determinado valor cultural e que existem condições para a sua conservação, planeando a sua revitalização de forma global. Tendo em conta a natureza do prédio e as funções atribuídas ao IC, após a conclusão do procedimento de aquisição, o prédio foi de imediato afecto a este Instituto, para a sua gestão e utilização.

19. Os representantes da DSF prestaram esclarecimentos à Comissão, em nome da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), dos Serviços de Saúde (SS), da Universidade de Macau (UM), da Direcção dos Serviços Correcionais (DSC) e dos Serviços



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

de Alfândega (SA), sobre a execução orçamental de alguns projectos do PIDDA referente aos 2.º e 3.º trimestres de 2021:

19.1 Embarcação em plástico reforçado a fibra de vidro (DSAMA)

O estudo preliminar do projecto foi aprovado pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas em 21 de Maio de 2021 e foi incluído no orçamento do PIDDA de 2021 da DSAMA. Decorrido o respectivo procedimento, o contrato foi celebrado em 30 de Novembro de 2021. De acordo com as cláusulas contratuais, a primeira prestação foi paga em Dezembro de 2021, no valor de 1 436 000,00 patacas, e a respectiva taxa de execução foi de 100%.

A entrega e a recepção provisória da embarcação estão previstas para finais de 2022. De acordo com as cláusulas contratuais, o fornecedor deve prestar um prazo de garantia de 48 meses para a embarcação em questão, devendo, em seguida, proceder-se à recepção definitiva e ao pagamento da última prestação, portanto, o pagamento da última prestação está previsto para 2026.

19.2 Obras de Melhoramento das Instalações do Centro Hospitalar Conde de São Januário (SS)



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Em 2021, a dotação total inscrita no projecto “Obras de Melhoramento das Instalações do Centro Hospitalar Conde de São Januário” foi de 18 363 800,00 patacas, destinada a suportar a execução da obra de renovação de equipamentos da sala de caldeiras (17 998 800 patacas) e os respectivos serviços de fiscalização (365 000,00 patacas).

Andamento das obras:

Relativamente às referidas obras, em Dezembro de 2019, os Serviços de Saúde lançaram o concurso público n.º 56/P/19 para a execução da “Obra de Renovação dos Equipamentos da Sala de Caldeiras Centro Hospitalar Conde de São Januário”. Devido à pandemia, os procedimentos administrativos, tais como a abertura de concurso, a selecção e a adjudicação foram adiados, portanto, não foi possível concretizar a adjudicação em 2020.

Posteriormente, no 1.º trimestre de 2021, a referida proposta de adjudicação foi submetida a aprovação. De forma a garantir a segurança e estabilidade do projecto e escolher o concorrente mais apropriado e que melhor satisfizesse o interesse público, a entidade tutelar propôs a revogação do concurso público n.º 56/P/19.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Neste sentido, os Serviços de Saúde procederam aos trabalhos preparatórios do novo concurso público, em Agosto de 2021 lançaram o concurso público n.º 23/P/21 para a execução da “Obra de Renovação dos Equipamentos da Sala de Caldeiras Centro Hospitalar Conde de São Januário”, e até ao dia 20 de Setembro de 2021, prazo limite para a entrega de propostas, foram recebidas duas propostas. Como os processos de selecção e adjudicação das propostas são complexos e levam algum tempo, previa-se, na altura, que a respectiva adjudicação não pudesse estar concluída em 2021, pelo que uma parte da dotação orçamental (8 463 800,00 patacas) foi transferida para outros projectos no 4.º trimestre, e o saldo remanescente (9 900 000,00) foi reduzido, de acordo com a política de austeridade.

Prevê-se que a proposta de adjudicação da referida obra seja apresentada no 1.º trimestre de 2022.

19.3 Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S34 da Universidade de Macau (UM)

Em 2020, a procura por alojamento em residências de docentes e funcionários abrandou, devido à pandemia. A Universidade de Macau, tendo em conta as suas necessidades reais, adiou o início dos



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

procedimentos de aquisição relativos às obras em causa do 4.º trimestre de 2020 para Abril de 2021. A proposta do concurso público e os outros documentos correspondentes foram aprovados pelo Chefe do Executivo e pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, em 27 de Abril e em 25 de Maio, respectivamente. O concurso público teve início em 2 de Junho, o acto público do concurso teve lugar em 6 de Julho e a proposta de adjudicação foi aprovada pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura em 24 de Setembro. Mais, os encargos plurianuais foram aprovados pelo Chefe do Executivo em 27 de Outubro e a minuta do contrato foi aprovada pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura em 26 de Novembro. Neste momento, as obras encontram-se na fase de execução, e o respectivo contrato foi celebrado no dia 23 de Dezembro de 2021, tendo sido o pagamento do adiantamento, no valor de 17 881 844,50 patacas, efectuado no mês de Dezembro. A conclusão da recepção das obras e o pagamento do valor remanescente terão lugar no 4.º trimestre de 2022.

19.4 Obras de melhoramento do sistema de electricidade da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC)

No processo de avaliação das propostas da presente empreitada, realizado pela DSC em 19 de Maio de 2020, verificou-se que o valor



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

global das propostas admitidas excedia significativamente o valor originalmente previsto, portanto, para fazer reflectir com maior precisão o preço actual de mercado, a DSC necessitava de redefinir o conteúdo das descrições das obras de melhoramento do sistema de electricidade e de prever, mais uma vez, o preço para este projecto, por isso, em Junho de 2020, submeteu a proposta para o cancelamento da respectiva adjudicação directa, tendo a mesma sido autorizada pelo Chefe do Executivo em 13 de Julho de 2020. Após a revisão das necessidades de consumo de energia eléctrica e a redefinição do conteúdo da descrição da obra, a proposta foi submetida, de imediato, à consideração superior, para se retomar o procedimento de aquisição.

Como a preparação das "Obras de melhoramento do sistema de electricidade" foi afectada pelo cancelamento das "Obras de alteração da Zona Prisional Masculina", causando uma redução significativa das necessidades quer de instalações quer de equipamentos eléctricos, após avaliação, verificou-se que o actual sistema de electricidade do Estabelecimento Prisional de Coloane pode manter o seu normal funcionamento e, com a previsão da entrada em funcionamento do novo estabelecimento prisional em 2024, não será necessária a instalação de qualquer sistema de electricidade adicional. Assim, para



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

responder aos princípios do bom uso dos recursos limitados e do controlo rigoroso das despesas do Governo da RAEM, a DSC decidiu cancelar este projecto em 2021, não sendo então necessário utilizar o orçamento respectivo.

Considerando que o orçamento de 2021 já tinha sido submetido à aprovação do Secretário para a Segurança em Outubro de 2020 e posteriormente transferido para a DSF, não foi possível proceder, em tempo oportuno, à actualização do respectivo orçamento, pelo que a dotação orçamental para 2021 manteve-se. Entretanto, a DSC procedeu, em Outubro de 2021, à alteração do orçamento de 2021, tendo sido deduzido o respectivo valor da dotação orçamental.

19.5 Serviços de Alfândega Inteligentes (SA da RAEM)

Propõe-se a não adjudicação dos respectivos serviços pelos seguintes motivos:

(1) No âmbito do preço:

Em relação ao projecto sobre os serviços de alfândega inteligentes, os SA procederam várias vezes à discussão do preço com a empresa concorrente, tendo esta apresentado, em 20 de Julho de 2021, um preço final que, após uma avaliação profunda por parte da equipa de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

projecto, foi considerado alto, ou seja, mais alto do que o nível razoável do mercado. A empresa concorrente não conseguiu ainda apresentar, de acordo com os requisitos dos SA, os respectivos dados e conteúdos do trabalho ao pessoal técnico, ao grupo, à supervisão, ao assessor profissional, e nem sequer apresentar explicações razoáveis acerca das razões que resultaram numa despesa de serviços mais alta no âmbito do plano, concepção, exploração e desenvolvimento, investigação e manutenção.

(2) No âmbito do prazo de entrega:

De acordo com a proposta do preço final apresentada pela empresa concorrente em 20 de Julho de 2021, o prazo de entrega geral do projecto dos serviços de alfândega inteligentes era de 100 dias, prazo este durante o qual a empresa não conseguiu fornecer o plano de desenvolvimento do projecto com os respectivos pormenores, o plano continha apenas simples explicações sobre a entrega dos produtos, não conseguindo assim satisfazer os requisitos de entrega do projecto em questão até ao dia 15 de Dezembro de 2021. A equipa de projecto pensou na complexidade do projecto dos serviços de alfândega inteligentes, nomeadamente o tempo necessário para a encomenda, a entrega, a montagem e o planeamento dos equipamentos de hardware, e para a realização dos testes integrados, bem como o



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

tempo necessário para a realização de estudos preliminares, o planeamento e o desenvolvimento do sistema de software, a realização de testes e a implementação do sistema. De acordo com o tempo de entrega do projecto apresentado pela empresa concorrente, a referida equipa considerou que não seria possível concluir a respectiva entrega em 2021 e que era elevado o risco de se verificar uma entrega fora do prazo.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

20. Segundo o representante da DSSOPT, até 30 de Setembro de 2021, a dotação final do orçamento do PIDDA destes Serviços era de 1 424 193 500,00 patacas e o orçamento global para 2020 era de 1 072 534 960,99 patacas, registando-se um aumento de cerca de 32,78%. No 2.º trimestre, a taxa de execução foi de 28,51%, o valor pago foi de 403 526 020,48 patacas, e a taxa de utilização foi de 56,12%. No 3.º trimestre, a taxa de execução foi de 41,50%, o valor pago foi de 591 071 659,83 patacas, e a taxa de utilização foi de 58%. O orçamento global destes Serviços para 2021, enquanto entidade executante, foi de 538 327 095,00 patacas e a taxa de execução do 3.º trimestre foi de 23,4%.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

21. Segundo o representante da DSSOPT, em 30 de Junho de 2021, a “Empreitada de concepção e instalação de equipamentos para eliminar as barreiras arquitectónicas da passagem superior situada na Rua Sul do Patane” teve início em Maio de 2021, ficou concluída em 27 de Janeiro de 2022, e foi aberta ao público em 28 de Janeiro de 2022. Os motivos que levaram a que a taxa de execução de alguns projectos fosse zero até 30 de Setembro de 2021 são os seguintes:

21.1 Obra de optimização da estrada adjacente ao novo armazém de substâncias perigosas

A obra foi consignada em 20 de Agosto do ano anterior, a sua conclusão está prevista para 15 de Agosto de 2022, e tudo está a decorrer de acordo com o plano de trabalhos. Neste momento, está a proceder-se à transferência/remoção das plantas existentes e ao nivelamento do terreno. A obra será paga em consonância com o seu efectivo andamento.

21.2 Depósito permanente do arquivo do Gabinete de Comunicação Social



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Em Abril de 2021, estes Serviços receberam um ofício do Gabinete de Comunicação Social (GCS) a solicitar apoio para a conclusão da obra em epígrafe. Em meados de Agosto, estes Serviços foram informados dos requisitos de concepção pelo GCS e, em seguida, deu-se início aos trabalhos relativos ao lançamento do concurso para a elaboração do respectivo projecto. Em 13 de Setembro, a directora destes Serviços aprovou a proposta sobre a realização duma consulta de preços para a elaboração do projecto, e em Novembro, autorizou a respectiva adjudicação. O estudo prévio foi aprovado pelo director substituto em 17 de Janeiro de 2022 e, logo em seguida, deu-se início à fase de elaboração do projecto de execução da obra. A conclusão deste projecto está prevista para o início de Março de 2022.

22. Alguns membros da Comissão prestaram atenção ao local e à área do depósito permanente do arquivo do GCS. Segundo o representante da DSSOPT, o referido depósito está localizado no lote 01 do Pac On, na Taipa, ou seja, no 9.º andar do edifício multifuncional do Governo, com uma área de cerca de 569 m².



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

23. O representante da DSPA procedeu a uma apresentação sobre o projecto das “Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos”, e o objectivo principal foi tomar como referência o exemplo bem-sucedido da ilha *Semakau*, em Singapura. Pretende-se executar este projecto na área marítima de 85 quilómetros quadrados sob a jurisdição da RAEM, construindo um aterro para resíduos de materiais de construção, o que é muito importante para o futuro desenvolvimento sustentável e a longo prazo da RAEM. Em 2021, a DSPA escolheu os locais para a fase preliminar do projecto e procedeu ao respectivo estudo de viabilidade. Como o relatório faseado não foi recebido no 3.º trimestre de 2021, não havia condições para o pagamento do montante em causa, mas, no 4.º trimestre, já foram pagos cerca de 14 milhões de patacas, e a respectiva taxa de execução foi de quase 100%.
24. Segundo o representante da DSPA, em relação ao projecto “Obras de Construção da 2.ª fase do Aterro de Cinzas Volantes”, que foi inscrito no 3.º trimestre de 2021, estes serviços planeiam construir instalações permanentes destinadas ao aterro e tratamento de cinzas volantes no Aterro para Resíduos de Materiais de Construção, situado na Avenida



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

do Aeroporto da Taipa. Em 2021, este projecto encontrava-se ainda em fase de concepção preliminar, assim, o orçamento efectivo só poderia ser obtido após a confirmação do projecto por parte da empresa de consultadoria independente. O representante da DSPA salientou que, uma vez que as cinzas volantes produzidas após a incineração contêm substâncias perigosas, como partículas de metais pesados, é necessário dispor de instalações permanentes para o seu tratamento, portanto, é necessário avançar com a 2.^a fase do aterro de cinzas volantes. Prevê-se que com esta 2.^a fase seja possível construir um aterro com cerca de 420 mil metros cúbicos para ser utilizado durante 12 anos.

25. Durante a reunião, alguns membros da Comissão manifestaram preocupação com as “Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos”, cujo prazo de execução é de 24 anos e envolve um orçamento de 15,59 mil milhões de patacas. Houve ainda membros da Comissão que se preocuparam com o facto de, no futuro, todos os resíduos de materiais de construção poderem ser transportados para o aterro, uma vez que se trata da construção de um aterro de grande dimensão que vai demorar 24 anos.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

26. Segundo o representante da DSPA, nos últimos 10 anos, foram recebidos cerca de 2,6 milhões de toneladas de resíduos de materiais de construção por ano. Se a conceção durar um ano, então, em 20 anos serão recebidos cerca de 50 milhões de toneladas de resíduos de materiais de construção, e a futura área para o aterro desses resíduos terá cerca de 2,5 quilómetros quadrados. Por outro lado, o projecto em causa só reúne condições para se contratar uma empresa de consultadoria para os trabalhos de selecção do local e de avaliação do impacto ambiental após a sua inscrição, e o representante da DSPA sublinhou que os 15,59 mil milhões de patacas inscritos no PIDDA do 2.º trimestre de 2021, destinados às "Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos", são apenas uma estimativa aproximada.

27. Além disso, dado que se trata duma construção na área marítima de 85 quilómetros quadrados sob a jurisdição da RAEM, a DSPA só estará em condições de iniciar os trabalhos de conceção e de sondagens geotécnicas após a autorização do Governo Popular Central. Por isso, o orçamento exacto tem de aguardar pelo lançamento do concurso do projecto em causa. O representante da DSPA referiu ainda que as "Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos" dependem de resíduos de materiais de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

construção, por isso é que a construção se prolonga por 20 anos, pois para a construção do referido aterro são apenas necessários cerca de 4 a 5 anos. Além disso, o Governo da RAEM elaborou e publicou o Regulamento Administrativo n.º 22/2020 - Regime de gestão de resíduos de materiais de construção, com o objectivo de reduzir, a partir da fonte, os resíduos em causa. Assim, no futuro, os resíduos de materiais de construção serão classificados na medida do possível, e os que não podem ser incinerados serão queimados e transportados para o aterro.

-
28. Houve ainda membros da Comissão que manifestaram a sua preocupação sobre a inscrição pela DSPA do novo projecto “Obras de Construção da 2.ª fase do Aterro de Cinzas Volantes” no PIDDA do 3.º trimestre, com a estimativa de um custo de 1,99 mil milhões de patacas, e um prazo de execução entre Julho de 2021 e Dezembro de 2032.
-
29. Segundo as explicações do representante da DSPA, as “Obras de Construção da 2.ª fase do Aterro de Cinzas Volantes” são relativamente mais simples do que as “Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos”. Como a obra se situa no actual aterro para resíduos de materiais de construção, a DSPA já concluiu



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

os trabalhos de avaliação do impacto ambiental da obra; os trabalhos de concepção estão em curso, e após a sua conclusão, será possível realizar o concurso público e, ao mesmo tempo, obter um orçamento mais preciso.

Instituto Cultural

30. Segundo o representante do IC, as “Obras de Construção da Nova Biblioteca Central de Macau” têm de articular-se com o plano de desenvolvimento do Governo da RAEM, assim, após análise e avaliação, ficou confirmado que a Nova Biblioteca Central de Macau vai ser construída no lote do antigo Hotel Estoril, e não no lote do Antigo Tribunal. Como a localização foi alterada, o orçamento estimado para o novo projecto é diferente do orçamento estimado para o projecto anterior, logo, as verbas destinadas às “Obras de Construção da Nova Biblioteca Central” não podem ser utilizadas para o novo projecto. Assim sendo, foi criado no PIDDA de 2021 o novo projecto “Concepção e Obras de Construção da Nova Biblioteca de Macau”. Depois de confirmado o novo local, deixaram de estar reunidas as condições para continuar com os serviços de Elaboração do Projecto da Nova Biblioteca, iniciados em 2018, e foi pedida a cessação do contrato à empresa responsável pelos referidos serviços



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

em Setembro de 2020. Após negociações, o IC considerou que o pedido de pagamento de honorários pelos trabalhos já concluídos, apresentado pela empresa, era razoável; e como não havia dotação orçamental para o projecto “Obras de Construção da Nova Biblioteca Central de Macau” do PIDDA de 2021, foi necessário transferir 1 338 000 patacas do novo projecto, a fim de proceder ao pagamento do referido montante, pagamento esse que foi concluído em Junho de 2021.

31. Em relação às “Obras de Remodelação da Sala de Ensaios da Orquestra Chinesa de Macau”, segundo as explicações do representante do IC, em 2021, foram cabimentadas 112 000 patacas para o pagamento dos remanescentes 20% das despesas dos serviços de arquitectura, estrutura, electricidade, instalações electromecânicas e ar-condicionado, águas e drenagem e sistemas de prevenção contra incêndios e acústica da referida sala de ensaios, serviços estes que foram adjudicados em 2014. Devido ao cancelamento do plano de arrendamento de um espaço no Edifício Nam Fong, na Avenida da Amizade, para ser utilizado como base para os ensaios da Orquestra Chinesa, não foi necessário realizar as obras de remodelação da sala de ensaios, e a empresa adjudicatária responsável pelos serviços mencionados não precisou de fornecer



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

apoio técnico *in loco* para a execução da obra. Após negociações, não foi necessário pagar, em 2021, a quantia remanescente, e o montante cabimentado foi deduzido no 4.º trimestre.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

32. O representante do GDI procedeu à apresentação sobre o ponto de situação da execução de alguns projectos, nomeadamente:

32.1 Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros

A dotação para o ano de 2021 destinada à “Empreitada de construção de habitação pública no lote B15 na Nova Zona A” era de 2 633 373,33 patacas para os serviços de concepção. Esta empreitada tinha sido projectada em Junho de 2020 e foi iniciada em 2021, porém, atendendo ao resultado final do ajustamento e melhoramento do planeamento da Zona A, concluído em Novembro de 2020, foram ajustados os períodos e o andamento do desenvolvimento dos lotes em causa. Em 2021, foram desenvolvidas, primeiramente, as empreitadas de construção de habitação pública, nomeadamente nos lotes A1, A2, A3, A4 e A12, enquanto a empreitada de construção de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

habitação pública no lote B15 seria desenvolvida posteriormente em função do plano definido, o que resultou numa taxa de execução zero.

32.2 Edifício de escritórios público no Lote 6B da Zona de Aterros do Porto Exterior

A dotação para o ano de 2021 destinada à “Empreitada de construção dos edifícios de escritórios para a administração no lote 6B na ZAPE”, era de 5 133 640,00 patacas para os serviços de concepção, e a taxa de execução do 3.º trimestre foi de 19,48%. Uma vez que estes serviços foram adjudicados em Julho de 2021, a taxa de execução não excede 50%. Atendendo ao andamento dos trabalhos de concepção, prevê-se que a taxa de execução alcance um nível normal no final de 2021.

32.3 Obra de reconstrução do Pavilhão de Mong Há

A dotação para o ano de 2021 destinada à “Empreitada de reconstrução do Pavilhão Desportivo de Mong Há” era de 1 846 000,00 patacas para o apoio técnico durante as obras, montante que seria pago após a conclusão da empreitada. A referida empreitada foi



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

concluída em Junho, portanto, a referida despesa foi paga integralmente em 2021.

32.4 Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande

A dotação para o ano de 2021 destinada à “Empreitada de construção do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande” era de 3 060 000,00 patacas para os serviços de concepção, e a taxa de execução do 3.º trimestre foi de 33,33%. Uma vez que estes serviços foram adjudicados em Agosto de 2021, a taxa de execução não excede 50%. Atendendo ao andamento dos trabalhos de concepção, prevê-se que a taxa de execução alcance um nível normal no final de 2021.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

33. Segundo o representante dos SAFP, o projecto “Aquisição da infra-estrutura de plataforma de escritório móvel” é o que apresenta uma taxa de execução zero no 3.º trimestre de 2021, e inclui, principalmente, a criação de um sistema de comunicação instantânea próprio do Governo da RAEM, para as comunicações confidenciais entre os



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

trabalhadores, envolvendo um montante de cerca de 9 milhões de patacas. Considerando a diferença entre o projecto e o plano inicial, procedeu-se a uma alteração orçamental no 3.º trimestre de 2021, o que resultou numa taxa de execução zero no PIDDA do 3.º trimestre. No entanto, o representante dos SAFP sublinhou que, como a aquisição e a liquidação do respectivo projecto já foram concluídas no 4.º trimestre, a taxa de execução respectiva foi de 100%.

34. Alguns membros da Comissão quiseram saber as razões, desde a inscrição até ao cancelamento do projecto “Aquisição da infra-estrutura de plataforma de escritório móvel”.

35. Segundo o representante dos SAFP, o orçamento do projecto “Aquisição da infra-estrutura de plataforma de escritório móvel” era de 16 milhões de patacas, mas como na altura não foi possível encontrar uma proposta economicamente viável, as verbas atribuídas a este projecto foram transferidas para o projecto “Aquisição de equipamentos de software e hardware para o Centro de Computação em Nuvem para a introdução do plano do Governo Digital”, e só em Julho de 2021 é que houve um reforço orçamental de 9 milhões de patacas para a “Aquisição da infra-estrutura de plataforma de escritório móvel”.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Instituto para os Assuntos Municipais

36. Os representantes do IAM procederam à apresentação sobre o ponto de situação da execução de alguns projectos, nomeadamente:

36.1 Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen

O projecto das “Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen” era inicialmente considerado como um projecto independente. No entanto, após um estudo aprofundado, concluiu-se que havia novas instalações a desenvolver junto desse parque, especialmente a construção da Praça Qingmao, e considerou-se ainda que era adequado transferir para o parque um viveiro que se encontrava ao seu lado. Tendo em consideração os terrenos disponíveis nas zonas envolventes e as necessidades de desenvolvimento da Praça Qingmao, considerou-se avançar com obras de melhoramento do parque, e foi elaborado um projecto geral, esperando-se assim obter melhores resultados. Portanto, foram suspensas as “Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Sun Yat Sen" e solicitou-se a elaboração do projecto geral da Praça Qingmao a uma empresa projectista.

36.2 Obra de Construção do Parque Desportivo no Troço Leste do Kartódromo

A ideia inicial do projecto da "Obra de Construção do Parque Desportivo no Troço Leste do Kartódromo" era aproveitar o terreno para proporcionar à população um espaço provisório quer para lazer quer para a prática de desporto. No entanto, após estudos aprofundados, considerou-se que a utilização do parque não seria muito elevada, uma vez que este está distante do complexo de habitação pública de Seac Pai Van, do complexo residencial One Oasis e dos bairros antigos, não sendo, portanto, acessível quer para as pessoas que se deslocam nos seus veículos, quer para as que vão a pé (não há lugares de estacionamento, passagens superiores para peões, semáforos e passadeiras). Além disso, a construção das instalações em causa envolve também o planeamento geral do trânsito naquela zona. Ao mesmo tempo, considerando que as obras da Linha de Seac Pai Van do metro ligeiro já foram iniciadas e que a construção das instalações recreativas e desportivas ao redor do Reservatório de Seac Pai Van, a cargo da DSSOPT, já está concluída, será possível



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

aliviar, de certo modo, a procura de zonas de lazer por parte dos moradores daquela zona, por isso, suspendeu-se o referido projecto.

36.3 Obra de Construção do Campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá

Em 2020, o Governo da RAEM divulgou uma notícia sobre o aproveitamento de um campo agrícola e de um terreno recuperado pelo Governo (com uma área total de 7 hectares), junto à Praia de Hac-Sá. Como se trata de um terreno demasiado grande, era necessário gastar muito tempo quer na elaboração de um plano global, quer na construção de instalações, assim, a fim de antecipar o uso do terreno por parte da população, foi então fixado um prazo (provisório) para a sua utilização, e a primeira fase das obras já está concluída (foi construído um churrasco maior junto ao antigo). Quanto à “Obra de Construção do Campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá”, a elaboração do respectivo projecto foi entregue a uma empresa projectista profissional, porém, depois de concluído o projecto, verificou-se que os custos de construção eram muito elevados (cerca de 30 milhões de patacas). Devido à recessão económica, o Governo apelou aos serviços públicos para economizarem nas despesas, e tendo em consideração a articulação



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

com o planeamento a longo prazo do terreno, durante este ano (2022), será acelerado o lançamento do projecto “Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac-Sá”, portanto, a “Obra de Construção do Campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá” foi suspensa e substituída pela construção de um parque provisório de bicicletas e quadriciclos em Hac-Sá, (destinada exclusivamente a crianças), que já entrou em funcionamento em Novembro de 2021. Além disso, o parque de areia provisório para bicicletas, destinado a adultos, vai entrar brevemente em funcionamento.

36.4 Obra de Construção duma Zona de Lazer nos Lotes BT8,9,11,12 na Taipa

O projecto abrange quatro lotes, mas trata-se de uma parcela integrada de terreno. Em 2020, o Governo entregou esta parcela de terreno ao IAM para uso provisório. Dado que, segundo o plano urbanístico, esta parcela não foi destinada a jardim ou a qualquer construção, o IAM procedeu a alguns estudos de viabilidade, orientando-se principalmente para o lazer, com a ideia inicial de construir um “parque de pneus” que recebeu opiniões diferentes da sociedade durante a sua divulgação.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Por outro lado, há que resolver também os problemas de higiene naquela parcela de terreno, sobretudo na antiga fábrica, junto ao Edifício Nam San, onde se acumulam muitas águas residuais sempre que chove. Por isso, neste momento, o IAM vai resolver, em primeiro lugar, o problema das águas estagnadas, e vai continuar a ouvir as opiniões de todas as partes sobre o aproveitamento da parcela de terreno em causa. Além disso, como a demolição da antiga fábrica implica o tratamento de substâncias poluentes (amiante), esse serviço foi adjudicado a uma empresa especializada de Hong Kong, mas, devido à pandemia, as pessoas de Hong Kong não puderam vir a Macau, por isso, não foi possível avançar com os respectivos trabalhos.

37. Durante a reunião, alguns membros da Comissão referiram que o planeamento, a concepção e o concurso público desses quatro lotes de terreno estavam demorados, e perguntaram se era possível construir instalações de lazer, simples e provisórias, para uso dos cidadãos. Perguntaram ainda se, tendo em conta a situação epidémica em Hong Kong, era possível contratar uma equipa profissional do Interior da China para tratar da demolição da antiga fábrica.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

38. Segundo os representantes do IAM, a adjudicação da demolição da antiga fábrica é da responsabilidade dos serviços de obras públicas, então, o IAM vai negociar com os referidos serviços, com vista a encontrar a melhor solução para a demolição da antiga fábrica. Quanto à possibilidade de se construírem algumas instalações de lazer, simples e provisórias, para uso dos cidadãos, os representantes do IAM sublinharam que é necessário demolir primeiro a antiga fábrica, para melhorar as condições de higiene nessa zona.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

39. Os representantes da DSFSM procederam à apresentação sobre o ponto de situação da execução de alguns projectos, nomeadamente:

No início de 2021, a DSFSM começou com os trabalhos preparatórios necessários, e no início de Março foi informada, pelos SPU, que tinham sido autorizados pelo Chefe do Executivo os projectos do PIDDA de 2021. Dado que o projecto “Policimento inteligente” é complexo e de grande dimensão e abrange vários departamentos (de serviços da tutela da Secretaria para a Segurança que partilham um sistema comum), e em relação ao qual não há precedentes em Macau, é necessário discutir e confirmar com os respectivos serviços utentes



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

as suas necessidades em relação ao projecto, que envolve exigências técnicas da DSFSM, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau. Em finais de Maio do mesmo ano, a DSFSM encaminhou os requisitos técnicos dos referidos 4 serviços aos SPU.

Posteriormente, os SPU solicitaram às empresas concorrentes a apresentação de preços, e após a recepção das respectivas cotações, procederam a uma análise global e solicitaram a apresentação de informações complementares sobre alguns projectos. No entanto, os elementos complementares apresentados não foram suficientes para permitir uma análise global, e as razões pelas quais as empresas concorrentes não conseguiram satisfazer os requisitos são muito semelhantes às justificações apresentadas pelos SA (vide ponto 19.5 do presente relatório). É de salientar que, com base no princípio da boa aplicação do erário público, a adjudicação do projecto em causa só pode ter lugar quando o mesmo esteja em plena conformidade com as exigências e as necessidades do trabalho.

Alguns dos requisitos de projectos recebidos pela DSFSM ainda se encontram na fase de testes, por isso, há que esperar pelo feedback dos serviços utentes para depois se dar início aos trabalhos da



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

próxima fase. Além disso, devido à pandemia e à escassez de chips no mundo o projecto foi adiado, e, por outro lado, depois da chegada dos equipamentos, é preciso tempo para estes serem testados, antes de poderem ser utilizados.

Pelos motivos expostos, a DSFSM não adjudicou os projectos de 2021, tendo o Chefe do Executivo autorizado, no 4.º trimestre de 2021, a devolução à DSF da totalidade dos montantes orçamentados relativos aos projectos da sua responsabilidade.

Por fim, o representante da DSFSM, na apresentação sobre o “Policiamento inteligente” à Comissão, afirmou que se trata de um plano quinquenal (de 2019 a 2023), e que entre 2019 e 2020, a DSFSM já executou 65% dos projectos desse plano. Alguns desses projectos que são de 2021 já foram executados em 2020, e os trabalhos posteriores serão aprofundados no âmbito da aplicação do plano quinquenal de “Policiamento Inteligente”. Quanto aos projectos que ainda não foram concluídos em 2021, a DSFSM irá, em 2022 e 2023, proceder à sua reanálise e conclusão.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Serviços de Polícia Unitários

40. O representante dos SPU procedeu à apresentação do projecto “Policimento inteligente” da sua responsabilidade:

O projecto “Policimento inteligente” é um sistema de gestão policial profissional, complexo e de grande envergadura. Pretende-se, através da aplicação da tecnologia *big data*, integrar todos os serviços policiais existentes, reconstruir o modelo de cooperação interdepartamental na área da segurança e promover eficazmente a partilha de recursos. O “Policimento Inteligente” é um novo conceito e um novo modelo para o desenvolvimento dos assuntos policiais em Macau. O seu planeamento e os trabalhos de construção compreendem uma ampla área que, para além da construção de *hardware*, envolve também o desenvolvimento de *software* em grande número e de ampla cobertura, exigindo, portanto, tecnologia complexa e de alto nível.

O início do projecto “Policimento inteligente” estava originalmente previsto para 2021, mas face à pressão da produção e transporte dos materiais causada pela situação epidémica, os fornecedores propuseram um prazo de entrega mais longo. Não tendo os



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

fornecedores cumprido o estipulado na proposta de adjudicação (conclusão em 2021), os SPU não concretizaram a adjudicação.

Para o efeito, depois de uma análise efectuada pelos serviços e forças de segurança e coordenada pelo Secretário para a Segurança, e com a autorização e concordância do Chefe do Executivo, os SPU devolveram as verbas orçamentadas destinadas à referida adjudicação ao Governo da RAEM. Em Dezembro de 2021, o Governo procedeu a alterações orçamentais através da Assembleia Legislativa, e o orçamento aprovado para os SPU no âmbito do PIDDA do ano de 2021 foi reduzido para zero patacas.

III. ANÁLISE FINANCEIRA

Situação Intercalar da Execução do Orçamento de 2021

41. Nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 15/2017, o Orçamento para 2021 é composto por três partes: (1) Orçamento ordinário integrado da RAEM, (2) Orçamento agregado dos organismos especiais e (3) Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Alterações orçamentais

42. Nos termos da Lei n.º 27/2020, a Assembleia Legislativa aprovou o Orçamento de 2021 e, posteriormente, através da Lei n.º 3/2021, alterou o Orçamento de 2021.
43. A receita do orçamento ordinário integrado da RAEM (doravante designado por “orçamento ordinário integrado”) foi alterada, passando de 95,81 mil milhões de patacas para 104,12 mil milhões de patacas, e a despesa orçamentada passou de 95,22 mil milhões de patacas para 103,52 mil milhões de patacas. O saldo orçamental mantém-se no valor de 600 milhões de patacas, envolvendo saldos orçamentais dos serviços e organismos autónomos.
44. As receitas orçamentais agregadas dos organismos especiais mantiveram-se em 15,46 mil milhões de patacas, enquanto as despesas orçamentais passaram de 15,35 mil milhões de patacas para 15,83 mil milhões de patacas, devido, principalmente, ao aumento das despesas orçamentais da Fundação Macau, no valor de 480 milhões de patacas, enquanto o resultado líquido do exercício passou de 58 milhões e 379 mil patacas para um valor negativo de 430 milhões de patacas.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

45. O Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais mantém-se na ordem dos 500 milhões de patacas.

Orçamento ordinário integrado da RAEM

46. No 1.º semestre de 2021, a receita efectiva do orçamento ordinário integrado foi de 52,63 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental foi de 50,5%, incluindo 21,01 mil milhões de patacas das verbas mobilizadas da reserva extraordinária, nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 8/2011 (Regime Jurídico da Reserva Financeira); mais, a despesa efectiva foi de 44,01 mil milhões de patacas, representando uma taxa de execução orçamental de 42,5%. Uma vez que as receitas foram superiores às despesas, até Junho de 2021, registou-se um saldo de execução orçamental de 8,62 mil milhões de patacas.

	milhões de patacas			
	Receita efectiva até 30/06/21	Taxa de execução orçamental até 30/06/21	Receita efectiva até 30/06/20	Variação homóloga
Impostos directos	2 211	30,7%	2 143	3,2%
Impostos indirectos	1 969	60,9%	1 640	20,1%
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	705	44,1%	617	14,2%
Rendimentos da propriedade	1 802	203,0%	399	351,6%
Receitas das concessões	19 806	39,3%	21 984	-9,9%



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Receitas financeiras	44	11,5%	114	-61,3%
Venda de bens e serviços	504	53,8%	423	19,3%
Transferências	24	9,5%	86	-72,2%
Contribuições para os regimes de protecção social	46	53,2%	45	1,8%
Outras receitas correntes	98	96,4%	115	-15,5%
Total das receitas correntes	27 208	41,8%	27 566	-1,3%
Venda de instalações e equipamentos	20	2 300,7%	135	-85,5%
Activos financeiros	381	54,0%	520	-26,8%
Venda de acções e outras participações	-	-	-	-
Outras receitas de capital	25 023	65,3%	45 394	-44,9%
Total das receitas de capital	25 424	65,2%	46 049	-44,8%
Receita ordinária integrada do Governo	52 632	50,5%	73 616	-28,5%

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

47. O valor mais elevado da receita efectiva é o do capítulo das “Outras receitas de capital” que atingiu 25,02 mil milhões de patacas, dos quais 21,01 mil milhões foram transferidos da reserva extraordinária da reserva financeira. Nos termos da Lei n.º 27/2020 e da Lei n.º 3/2021, foi, respectivamente, aprovado e alterado o Orçamento de 2021 e a utilização de 35,69 mil milhões de patacas da reserva extraordinária da reserva financeira, a fim de manter o equilíbrio financeiro do Orçamento de 2021. Assim, até Junho de 2021, havia ainda 14,68 mil milhões de patacas na reserva extraordinária, montante aprovado pela Assembleia Legislativa e que não foi integrado nas receitas orçamentais.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

48. O segundo valor mais elevado da receita efectiva é o capítulo das “Receitas das concessões”, no qual se registou uma receita de 19,81 mil milhões de patacas, menos 2,18 mil milhões face ao período homólogo de 2020, o que resultou numa redução de 9,9%, em comparação com o período homólogo de 2020, nas receitas do capítulo das “Receitas das concessões”. Neste capítulo, a principal fonte da receita provém das “Receitas dos jogos de fortuna ou azar”, cujo valor da receita efectiva atingiu 19,64 mil milhões de patacas, ou seja, menos 2,15 mil milhões de patacas face ao período homólogo de 2020.
49. A receita efectiva do capítulo das “Receitas financeiras” foi de 1,8 mil milhões de patacas, o que corresponde a um aumento de 1,4 mil milhões de patacas face ao período homólogo de 2020. Segundo a explicação do Governo, este aumento deve-se, principalmente, ao valor do prémio do lote P dos Novos Aterros da Areia Preta, que foi de 1,34 mil milhões de patacas.
50. Além disso, a receita efectiva do capítulo “Impostos indirectos” registou um aumento relativamente elevado em relação ao período homólogo de 2020, o que se reflecte, principalmente, no aumento da receita proveniente do “Imposto do selo”, no valor de 160 milhões de patacas,



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

e de “Vinhos e outras bebidas alcoólicas” integrados no “Imposto de consumo”, com um aumento de 130 milhões de patacas.

51. A despesa efectiva do orçamento ordinário integrado foi de 44,01 mil milhões de patacas, menos 2,29 mil milhões de patacas do que no período homólogo de 2020, ou seja, uma redução de 4,9%. Segundo os esclarecimentos do Governo, isto deve-se, principalmente, à redução da despesa com as participações em capital social.

	Despesa efectiva até 30/06/21	Taxa de execução orçamental até 30/06/21	Despesa efectiva até 30/06/20	Variação homóloga
Despesas com o pessoal	12 956	47,0%	12 802	1,2%
Despesas com o funcionamento	5 150	33,5%	4 925	4,6%
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	474	42,5%	347	36,4%
Regime de aposentação e sobrevivência	0	2,2%	0	-13,9%
Transferências, apoios e abonos	19 537	54,9%	21 572	-9,4%
Outras despesas correntes	0	0,0%	0	0,0%
Total das despesas correntes	38 118	46,1%	39 646	-3,9%
Instalações e equipamentos	5 749	28,7%	2 894	98,7%
Activos financeiros	147	19,9%	1 734	-91,5%
Acções e outras participações	0	0,0%	2 030	-100,0%
Total das despesas de capital	5 896	28,2%	6 657	-11,4%
Despesa ordinária integrada do Governo	44 013	42,5%	46 304	-4,9%

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

52. Em comparação com o período homólogo de 2020, a despesa efectiva do capítulo “Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública” aumentou 36,4%, atingindo 470 milhões de patacas. Segundo a explicação do Governo, foi efectuado o pagamento de 120 milhões de patacas das despesas da “Rede de iluminações públicas” no 1.º semestre de 2020, enquanto as referidas despesas foram pagas no 2.º semestre de 2020.
53. As despesas efectivas do capítulo das “Instalações e equipamentos” também aumentaram significativamente em relação ao período homólogo de 2020, atingindo 5,75 mil milhões de patacas, ou seja, um aumento de 98,7%, devido ao aumento substancial das despesas efectivas orçamentadas para o PIDDA, ou seja, mais 5,58 mil milhões de patacas, face ao período homólogo de 2020, em que as mesmas foram de 2,68 mil milhões de patacas.
54. A despesa efectiva do capítulo dos “Activos financeiros” sofreu uma redução significativa, foi de apenas 150 milhões de patacas, ou seja, menos 91,5% face aos 1,73 mil milhões de patacas registado no período homólogo de 2020. Segundo a explicação do Governo, devido ao impacto negativo da pandemia na economia de 2020, o Governo tem reforçado o apoio às pequenas e médias empresas com



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

dificuldades financeiras, consequentemente, as despesas do Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas registaram 1,66 mil milhões de patacas no 1.º semestre de 2020, e 77,06 milhões de patacas em 2021. No entanto, é de notar que a taxa de execução orçamental do Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas é de apenas 17,8%, sendo, portanto, baixa a taxa de execução orçamental.

55. A pedido da Comissão, o Governo prestou esclarecimentos complementares, afirmando que a principal razão disto reside no apoio às pequenas e médias empresas afectadas pela pandemia, através do Regulamento Administrativo n.º 4/2020, que veio alterar o Regulamento Administrativo n.º 9/2003 - Plano de apoio a pequenas e médias empresas, cuja primeira implementação terminou em 2020. De acordo com o Despacho do Chefe do Executivo n.º 159/2021, o referido plano, que voltou a ser implementado, entrou em vigor em 26 de Outubro de 2021 com um prazo de 1 ano, portanto, o número de pedidos aumentou no 2.º semestre desse ano.
56. A taxa de execução orçamental das “Acções e outras participações” é zero. O orçamento autorizado deste capítulo foi de 140 milhões de patacas, e segundo a explicação do Governo, esta despesa orçamentada inclui a verba que o Governo e o Fundo de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Desenvolvimento Industrial e de Comercialização injectaram na Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. (140 milhões de patacas), e ainda a verba injectada pela Universidade de Macau no capital social do Centro de Investigação e Ensaios em Engenharia da Universidade de Macau, Limitada e respectivo fundo de arranque (460 mil patacas), não tendo, porém, sido liquidada qualquer despesa no 1.º semestre de 2021.

57. Segundo os esclarecimentos adicionais prestados pelo Governo, o orçamento das participações financeiras do capítulo autónomo “Despesas Comuns” de 2021 inclui uma dotação orçamental de 131,6 milhões de patacas destinada à Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. Este orçamento destina-se, principalmente, à entrada em funcionamento, em 2021, de vários projectos da filial da Macau Investimento e Desenvolvimento S.A. (empresa do parque científico e industrial), no Interior da China. No entanto, devido à pandemia, os projectos não avançaram em 2021, portanto, o orçamento das despesas de capital não foi executado.
58. Por outro lado, as restantes 464,2 mil patacas foram destinadas à injeção de capital da Universidade de Macau no Centro de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Investigação e Ensaios em Engenharia da Universidade de Macau,
Limitada, cujo processo foi concluído em Agosto de 2021.

Orçamento agregado dos organismos especiais

59. A receita efectiva agregada dos organismos especiais no 1.º semestre de 2021 foi de 9,85 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 64%, a despesa efectiva foi de 6,34 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental foi de 40,1%. Uma vez que as receitas foram superiores às despesas, até Junho de 2021, registou-se um resultado líquido do exercício de 3,51 mil milhões de patacas.

	milhões de patacas			
	Receita efectiva até 30/06/21	Taxa de execução orçamental até 30/06/21	Receita efectiva até 30/06/20	Variação homóloga
Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	290	46,3%	291	-0,4%
Rendimentos da propriedade	43	50,4%	43	0,4%
Receitas das concessões	591	37,6%	412	43,3%
Receitas financeiras	4 723	79,3%	3 596	31,3%
Venda de bens e serviços	257	44,4%	248	3,6%
Transferências	2 904	62,0%	3 486	-16,7%
Contribuições para os regimes de protecção social	996	52,6%	1 005	-0,9%
Outras receitas correntes	51	369,0%	21	149,4%
Total das receitas correntes	9 855	64,0%	9 101	-8,3%

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

60. Na receita do orçamento agregado dos organismos especiais, verificou-se, no 1.º semestre, uma receita efectiva de 9,85 mil milhões de patacas, com uma taxa de execução orçamental de 64%, o que representa um aumento de 8,3% face ao período homólogo de 2020, em que a mesma foi de 9,1 mil milhões de patacas.
61. O capítulo “Receitas financeiras” foi o que apresentou o valor mais elevado de receitas efectivas, atingindo 4,72 mil milhões de patacas, e apresenta uma taxa de execução orçamental de 79,3%. Segundo as explicações do Governo, isto deveu-se principalmente ao facto de a situação dos investimentos em mercados internacionais no 1.º semestre de 2021 se mostrar optimista, o que fez com que o retorno global dos investimentos fosse superior ao previsto.
62. De acordo com os elementos complementares fornecidos pelo Governo, as “Receitas financeiras” dos organismos especiais apresentaram taxas de retorno entre 0,24% e 11,96%, em função dos tipos de investimento.

Tipos de investimento	Taxa de retorno
Depósitos a prazo	0,55% a 3,82%
Investimentos em mercados internacionais	3,07% a 11,96%
Títulos de obrigações	0,89% a 5,38%
Outros	0,24% a 0,69%



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

63. As receitas efectivas do capítulo de “Transferências” atingiram 2,9 mil milhões de patacas, entre as quais a classificação económica das “Receitas consignadas” registou um valor de 1,54 mil milhões de patacas. Isto deveu-se, principalmente, ao facto de, nos termos da Lei n.º 14/2019 - Consolidação dos recursos financeiros do Fundo de Segurança Social, ser atribuído 3% do saldo da execução do orçamento central ao Fundo de Segurança Social. Por outro lado, as receitas efectivas da classificação económica “Comparticipações” atingiram 1,31 mil milhões de patacas, e dizem respeito às dotações provenientes das receitas do jogo afectas ao Fundo de Segurança Social e ao Fundo de Pensões, bem como às comparticipações de 1% das receitas correntes da RAEM.
64. A despesa efectiva agregada dos organismos especiais foi de 6,34 mil milhões de patacas, representando um decréscimo de 51% face aos 12,96 mil milhões de patacas registados em 2020. O Governo não prestou esclarecimentos sobre as alterações em geral, mas é possível perceber as respectivas razões, com base nas explicações dadas pelo Governo em relação às alterações das despesas em cada capítulo e secção.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

	Despesa efectiva até 30/06/21	Taxa de execução orçamental até 30/06/21	Despesa efectiva até 30/06/20	Variação homóloga	milhões de patacas
Despesas com o pessoal	488	31,3%	628	-22,3%	
Despesas com o funcionamento	647	34,6%	188	245,0%	
Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3	12,9%	6	-45,7%	
Regime de aposentação e sobrevivência	1 298	45,5%	1 215	6,9%	
Despesas financeiras	133	11,7%	1 205	-89,0%	
Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	20	34,6%	13	50,7%	
Transferências, apoios e abonos	3 756	45,9%	9 703	-61,3%	
Outras despesas correntes	-	-	-	-	
Total das despesas correntes	6 344	40,1%	12 957	-51,0%	

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

65. A despesa efectiva do capítulo “Transferências, apoios e abonos” atingiu 3,76 mil milhões de patacas. Este capítulo é o que apresenta maior despesa efectiva, uma taxa de execução orçamental de 45,9%, e registou uma redução significativa de 61,3%, em comparação com a despesa efectiva do período homólogo de 2020, que foi de 9,7 mil milhões, devido, principalmente, à verba específica atribuída pelo Governo à implementação, em 2020, das medidas de apoio económico ao combate à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus. Através da Fundação Macau, foi atribuído um montante total de 6,36 mil milhões de patacas de apoio financeiro aos indivíduos e empresas



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

que preencheram os requisitos exigidos, e na primeira metade de 2021, os apoios financeiros concedidos pela Fundação Macau, incluindo os subsídios atribuídos pelo Fundo de Apoio ao Combate à Epidemia, atingiram 810 milhões de patacas.

66. As despesas efectivas do capítulo “Despesas financeiras” foram de 130 milhões de patacas e a taxa de execução orçamental foi de 11,7%, o que representa uma redução significativa de 89% em relação à despesa efectiva de 1,2 mil milhões de patacas no período homólogo de 2020. Segundo as explicações do Governo, isto deveu-se, principalmente, à tendência optimista da economia global e ao aumento contínuo da taxa de câmbio de moeda estrangeira no 1.º semestre, o que contribuiu para um melhor retorno do investimento dos organismos especiais, que foi registado nas receitas de investimentos e nas receitas dos ganhos cambiais.

	milhões de patacas		
	Montante efectivo até 30/06/21	Montante efectivo até 30/06/20	Variação homóloga
Receitas financeiras	4 723	3 596	31,3%
Despesas financeiras	133	1 205	-89,0%
Valor líquido	4 590	2 391	92,0%

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

67. O quadro acima mostra que o investimento no 1.º semestre de 2021 é superior ao de 2020, representando um aumento de 92%.
68. As despesas efectivas do capítulo “Despesas com o pessoal” registaram uma redução significativa de 22,3% face ao período homólogo de 2020, em que as mesmas foram de 490 milhões de patacas, e a taxa de execução orçamental foi de apenas 31,3%.
69. A pedido da Comissão, o Governo prestou esclarecimentos adicionais sobre a execução do capítulo das “Despesas com o pessoal”, segundo os quais o orçamento autorizado para estas despesas foi de 1,56 mil milhões de patacas, entre estas despesas, inclui-se o orçamento autorizado da AMCM, que foi de 740 milhões de patacas, representando 48% do Orçamento autorizado e uma despesa efectiva de 130 milhões de patacas, o que corresponde a uma taxa de execução orçamental de 18,2%. Segundo a explicação da AMCM, a razão principal disto prende-se com o facto de a dimensão do activo do Fundo de Previdência do Pessoal da AMCM continuar a ser suficiente para fazer face à insuficiência de capital no ano de 2021, pelo que não procedeu à contribuição adicional de 165 milhões de patacas para o Fundo de Previdência do Pessoal da AMCM, conforme o orçamento inicial.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

FJ
WZ
H
GE
KJ

Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

70. O investimento agregado dos organismos especiais registou uma despesa efectiva de 20 milhões e 274 mil patacas, e a taxa de execução foi de apenas 4%, registando-se um aumento de 3 milhões e 611 mil patacas, face aos 16 milhões e 663 mil patacas registados no período homólogo de 2020, representando assim um aumento de 21,7%.

	Despesa efectiva até 30/06/21	Taxa de execução orçamental até 30/06/21	Despesa efectiva até 30/06/20	Variação homóloga
Activos fixos e intangíveis	12	2,9%	14	-12,6%
Inventários	8	8,6%	3	171,0%
Total	20	4,0%	17	21,7%

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

71. De acordo com os esclarecimentos adicionais prestados pelo Governo, o orçamento autorizado do investimento agregado dos organismos especiais cifrou-se em 500 milhões de patacas, e entre essas despesas, inclui-se o orçamento autorizado da AMCM, que foi de 340 milhões de patacas; foram efectivamente utilizados 12 milhões e 952 mil patacas, e a taxa de execução orçamental foi de 3,8%, devido ao facto de parte dos projectos de infra-estruturas de grande envergadura



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

terem tido um investimento efectivo inferior ao previsto ou terem as respectivas infra-estruturas entrado em funcionamento no 2.º semestre de 2021; além disso, houve outros projectos em relação aos quais o respectivo investimento foi reduzido ou o respectivo início foi adiado para 2022, devido ao impacto da pandemia.

72. Por outro lado, o orçamento autorizado para investimentos da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações foi de 140 milhões de patacas e a despesa efectiva foi de 5 milhões e 462 mil patacas, correspondendo a uma taxa de execução orçamental de 4%, devido ao cancelamento definitivo da obra de reconstrução do edifício dos correios da Avenida da Praia Grande, e devido também ao facto de ainda não terem sido iniciadas as obras de alteração do edifício n.º 16 da Rua do Lilau (revitalização dos antigos edifícios para construção da sala de exposições filatélicas), uma vez que a entidade competente ainda não emitiu a planta de condições urbanísticas. O investimento em causa envolvia um montante orçamentado de 69,91 milhões de patacas.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Situação da execução orçamental do PIDDA no 2.º trimestre de 2021

73. O orçamento inicial do PIDDA para 2021 foi de 18,51 mil milhões de patacas e o orçamento autorizado até ao 2.º trimestre cifrou-se em 18,57 mil milhões de patacas, registando-se um aumento de 60 milhões de patacas em relação ao orçamento inicial, a despesa efectiva foi de 5,58 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 30%, o valor da cabimentação foi de 13,5 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 72,7%.

	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	milhões de patacas Taxa de utilização orçamental	Projectos
2.º trimestre	18 567	5 579	13 499	30,0%	72,7%	264
1.º trimestre	18 538	2 723	12 949	14,7%	69,9%	245
Variação	29	2 857	550	15,4%	2,9%	19

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

74. No 2.º trimestre de 2021, o orçamento autorizado do PIDDA aumentou cerca de 29 milhões de patacas face ao 1.º trimestre, a despesa efectiva aumentou 2,86 mil milhões de patacas, e o valor da cabimentação aumentou 550 milhões de patacas. Devido ao facto de os pagamentos efectuados no segundo trimestre terem sido superiores aos do primeiro trimestre, a taxa de execução orçamental cresceu exponencialmente de 14,7% para 30%, enquanto a taxa de utilização



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

orçamental subiu apenas 2,9%, o que se reflectiu num aumento de apenas 550 milhões de patacas no valor da cabimentação.

75. Por outro lado, até ao 2.º trimestre, registava-se um total de 264 projectos, um aumento líquido de 19 projectos em comparação com os 245 registados no 1.º trimestre. Durante o 2.º trimestre de 2021, registraram-se 21 projectos e foram cancelados 2; dos 21 projectos, 6 são projectos antigos que foram inscritos em 2020 ou até antes, e os restantes 15 são projectos recém-criados no 2.º trimestre de 2021. Estes 21 projectos inscritos envolvem um orçamento total de 95 milhões e 791 mil patacas.

Comissão de Desenvolvimento de Talentos

Designação do projeto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Empreitada de Remodelação do Edifício de Escritórios para a Administração no Lote 6K na ZAPE - 4º andar	189 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

Designação do projeto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Empreitada de remodelação do Complexo residencial (A,B,D) de Santa Sancha	3 071 472,00	0,00	3 071 472,00	Projecto antigo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Concepção e construção de instalações de acessibilidade na passagem superior para peões na Rua Sul do Patane	4 617 691,00	0,00	4 617 691,00	Projecto novo
Obra de Melhoramento do Sistema Eléctrico de Iluminação Decorativa na Ponte da Amizade	11 370 598,00	0,00	11 370 598,00	Projecto novo

Instituto Cultural

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obras de construção da nova Biblioteca Central de Macau	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	Projecto antigo

Instituto para os Assuntos Municipais

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hác-Sá	12 000 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Instituto de Habitação

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Empreitada de concepção e construção das fracções modelo de habitação pública	7 980 000,00	7 638 432,40	7 980 000,00	Projecto novo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Finanças

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Aquisição do Edifício Ritz situado no Largo do Senado	762 866,66	762 866,66	762 866,66	Projecto novo

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obra de Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base nos Lotes C1 a C3 do Lago Nam Van	5 730 000,00	0,00	0,00	Projecto novo
Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Segunda Instância nos Lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	434 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Remodelação dos Acessos ao nó e à Rotunda do Hotel Lisboa	7 615 430,39	0,00	0,00	Projecto antigo

Comissariado de Auditoria

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Empreitada de Remodelação do 5.º ao 10.º andar do Edifício Público no Lote 6K na ZAPE	675 000,00	0,00	0,00	Projecto novo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Serviços de Alfândega da RAEM

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Aquisição de Lancha de Fiscalização após a delimitação das águas na Área de jurisdição de Macau	14 784 300,00	0,00	0,00	Projecto antigo

Gabinete do Procurador

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Construção do Edifício do Tribunal Judicial de Base no Lote C4 do Lago Nam Van - Serviço do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Base	1 605 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais do Parque Industrial Transfronteiriço	2 280 000,00	300 000,00	2 280 000,00	Projecto antigo
Construção da Instalação Integrada de Madeiras Recicláveis	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	Projecto antigo
Obras de Construção na Área Marítima de Aterro para Resíduos	11 820 000,00	0,00	11 820 000,00	Projecto novo
Obra de Instalações do Centro Ambiental Alegria - Rua de Inácio Baptista	300 000,00	0,00	300 000,00	Projecto novo
Centro Carbono Zero das Zonas Húmidas	810 000,00	0,00	810 000,00	Projecto novo
Obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais na Zona B dos Novos Aterros Urbanos	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00	Projecto novo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais na saída de descarga da <i>box culvert</i> de águas pluviais da Avenida Marginal do Lam Mau	912 792,00	0,00	912 792,00	Projecto novo

76. Foram cancelados dois projectos: a “Aquisição de infra-estrutura de plataforma de escritório móvel” dos SAFP e o “Edifício Administrativo Ala Oeste Instituto Desporto” do Instituto do Desporto. Na reunião da Comissão para o acompanhamento do Relatório de Execução Orçamental do PIDDA do 1.º trimestre de 2021, os representantes dos dois organismos manifestaram a intenção de eliminar estes dois projectos, e prestaram explicações sobre as respectivas razões.
77. No 2.º trimestre de 2021, registou-se um aumento de 4,83 mil milhões de patacas no orçamento autorizado, face ao período homólogo de 2020; a despesa efectiva, aumentou 2,9 mil milhões de patacas; o valor da cabimentação aumentou 3,17 mil milhões de patacas; a taxa de execução orçamental subiu 10,5%, mas a taxa de utilização do orçamento registou uma diminuição ligeira de 2,4%.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

milhões de patacas

2.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Projectos
2021	18 567	5 579	13 499	30,0%	72,7%	264
2020	13 739	2 682	10 325	19,5%	75,1%	247
Variação	4 828	2 897	3 174	10,5%	-2,4%	17

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

78. No 2.º trimestre, 64 projectos registaram uma taxa de utilização orçamental zero (vide ponto 86 do relatório), menos 9 do que no 1.º trimestre, envolvendo um orçamento autorizado de 1,25 mil milhões de patacas.

79. Além disso, no Relatório sobre a Execução Orçamental do PIDDA do 1.º trimestre, o Governo refere o cancelamento ou suspensão de 7 projectos, e no Relatório da Execução Orçamental do 2.º trimestre, verifica-se que a DSSOPT procedeu à alteração da coluna das informações relativas ao andamento de dois projectos, substituindo a referência de que o projecto ia ser cancelado pela referência de que o projecto iria continuar a ser executado:

Projecto: Empreitada de Construção do Laboratório de LIDAR da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Projecto: Via de Acesso A2 Entre a Zona A Dos Novos Aterros

Urbanos e Península de Macau

80. No Relatório da Execução Orçamental do 2.º trimestre, verifica-se que 9 projectos novos não vão ser executados em 2021: 4 são propostos pelo IAM, 4 pelo Instituto de Habitação (IH), e 1 pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT):

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado
IAM	Obra de Construção da Ciclovia Norte da Taipa	379 100,00
IAM	Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	7 336 993,00
IAM	Obra de Construção da Zona de Lazer no Lote CN2C em Coloane	13 750 000,00
IAM	Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen	4 000 000,00
IH	1.ª fase da construção de habitação pública na Avenida Wai Long	4 185 000,00
IH	Empreitada de Construção de Habitação Pública na Zona A dos Novos Aterros Urbanos, Lote B14	3 037 000,00
IH	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	2 633 373,33
IH	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B5 da Zona A dos Novos Aterros	310 800,00
DSAT	Obras de Modificação da Estação de Autocarros e Auto-Silo da Praça de Ferreira do Amaral	28 000 000,00



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Situação da execução orçamental do PIDDA no 3.º trimestre de 2021

81. No 3.º trimestre de 2021, o orçamento autorizado atingiu 18,58 mil milhões de patacas, a despesa efectiva foi de 8,63 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 46,4%, o valor da cabimentação foi de 14,78 mil milhões de patacas, e a taxa de utilização orçamental foi de 79,5%. Os dados sobre a situação da execução orçamental dos diversos serviços no 3.º trimestre podem ser consultados no Anexo III.

						milhões de patacas
	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Projectos
3.º trimestre	18 584	8 632	14 781	46,4%	79,5%	273
2.º trimestre	18 567	5 579	13 499	30,0%	72,7%	264
Variação	17	3 053	1 282	16,4%	6,8%	9

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

82. No 3.º trimestre de 2021, registou-se um aumento de 17 milhões de patacas no orçamento autorizado do PIDDA face ao 2.º trimestre, enquanto a despesa efectiva aumentou 3,05 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação subiu 1,28 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental aumentou 16,4%, subindo de 30% no 2.º trimestre para 46,4% no 3.º trimestre, e a taxa de utilização orçamental



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

subiu para 79,5%, o que se reflectiu num aumento de 1,28 mil milhões de patacas no valor da cabimentação.

83. Até ao final do 3.º trimestre existiam 273 projectos, mais 9 do que os 264 do 2.º trimestre. Por outro lado, entre os 9 projectos inscritos, 2 são projectos antigos que foram inscritos em 2020 ou até antes, e os restantes 7 são projectos recém-criados no 3.º trimestre de 2021. Estes 9 projectos inscritos envolvem um orçamento total de 49 milhões e 33 mil patacas.

Direcção dos Serviços de Finanças

Designação do projeto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Aquisição do prédio sito n.º 24 da Travessa da Porta	8 000 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

Designação do projeto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obra de optimização da estrada adjacente ao novo armazém de substâncias perigosas	13 163 095,00	0,00	13 163 095,00	Projecto novo

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

Designação do projeto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obras de construção da 2.ª fase do aterro de cinzas volantes	6 994 790,00	1 529 000,00	5 351 500,00	Projecto novo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Trem Naval da DSAMA - embarcação em plástico reforçado a fibra de vidro	1 436 000,00	0,00	1 436 000,00	Projecto novo

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Última Instância na Avenida da Praia Grande	3 060 000,00	1 020 000,00	3 060 000,00	Projecto novo

Gabinete de Comunicação Social

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Depósito permanente do arquivo do Gabinete de Comunicação Social	400 000,00	0,00	0,00	Projecto novo

Comissariado contra a Corrupção

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Edifício de escritórios público no Lote 6B da Zona de Aterros do Porto Exterior	5 133 640,00	1 000 000,00	3 526 140,00	Projecto novo



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Instituto do Desporto

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Obra de reconstrução do Pavilhão de Mong Há	1 846 000,00	0,00	0,00	Projecto antigo

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Situação
Aquisição de infra estrutura de plataforma de escritório móvel	9 000 000,00	0,00	0,00	Projecto antigo

84. É de salientar que o projecto “Aquisição de infra-estrutura de plataforma de escritório móvel”, que foi novamente inscrito, foi objecto de discussão aquando da reunião da Comissão para o acompanhamento do “Relatório da Execução Orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2021”, tendo o representante dos SAFP referido que o projecto ia ser cancelado por não se encontrar uma solução que correspondesse aos benefícios económicos, e que os SAFP iriam explorar, autonomamente, um sistema de escritório comum para todos os serviços públicos. Para o efeito, no 2.º trimestre, os SAFP cancelaram o referido projecto e procederam à transferência do montante orçamentado para outros projectos. No 3.º trimestre, porém, o projecto voltou a ser inscrito, com um orçamento de 9 milhões de patacas, prevendo-se a sua conclusão para Setembro de 2021. No



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

entanto, até ao final do 3.º trimestre, não havia qualquer registo de utilização do orçamento para o projecto em causa. Nas descrições sobre o andamento dos projectos fornecidas pelos SAFP, refere-se apenas o seguinte: "A aquisição relevante foi iniciada e a avaliação da proposta está em andamento. A previsão é que a premiação e a instalação do sistema de mensagens instantâneas sejam concluídas ainda este ano". Durante a reunião, o representante dos SAFP prestou esclarecimentos complementares sobre a situação (vide ponto 35 do relatório).

85. No 3.º trimestre de 2021, o orçamento autorizado aumentou 4,82 mil milhões de patacas face ao período homólogo de 2020, a despesa efectiva aumentou 2,5 mil milhões de patacas; o valor da cabimentação aumentou 3,42 mil milhões de patacas; a taxa de execução orçamental subiu 1,8%, mas a taxa de utilização orçamental registou uma diminuição ligeira de 3%.

3.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Projectos
2021	18 584	8 632	14 781	46,4%	79,5%	273
2020	13 761	6 137	11 360	44,6%	82,5%	253
Variação	4 823	2 495	3 421	1,8%	-3,0%	20

* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

86. No 3.º trimestre, um total de 50 projectos apresentavam taxa de utilização orçamental zero, menos 14 do que no 2.º trimestre, envolvendo um orçamento autorizado de 1,08 mil milhões de patacas:

Serviço proponente	2.º trimestre	3.º trimestre
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	1	0
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	4	4
Instituto Cultural	2	2
Pólicia Judiciária	3	2
Instituto para os Assuntos Municipais	15	11
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1	1
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	1	1
Instituto de Habitação	4	4
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1	1
Direcção dos Serviços de Finanças	0	1
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	2	1
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	2	0
Comissariado da Auditoria	1	0
Gabinete de Comunicação Social	0	1
Serviços de Saúde	2	2
Universidade de Macau	7	4
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5	5
Serviços de Alfândega da RAEM	3	2
Instituto Politécnico de Macau	1	1
Gabinete do Procurador	1	0
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	2	1
Direcção dos Serviços Correccionais	4	3
Serviços de Polícia Unitários	2	2
Instituto do Desporto	0	1
Total	64	50



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

[Handwritten signatures]

87. No quadro acima, verifica-se que o IAM é aquele que tem mais projectos com taxa de utilização orçamental zero, com um total de 11 projectos, e em segundo lugar é a DSFSM, com 5 projectos.

[Handwritten signatures]

88. Existem 6 projectos com taxa de utilização orçamental zero ou que foram cancelados no 4.º trimestre de 2020, que voltaram a ser inscritos em 2021 e que, no entanto, até ao 3.º trimestre de 2021, mantinham a taxa de utilização orçamental em zero:

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado
IAM	Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen*	4 000 000,00
SAFP	Aquisição de infra estrutura de plataforma de escritório móvel	9 000 000,00
IH	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros*	2 537 000,00
SS	Obras de Melhoramento das Instalações de Centro Hospitalar Conde de S. Januário	18 363 800,00
UM	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S34 da Universidade de Macau	42 000 000,00
DSC	Direcção dos Serviços Correcionais - Obras de melhoramento do sistema de electricidade*	9 000 000,00

* Segundo se refere nas descrições sobre o andamento dos projectos referentes aos 1.º a 3.º trimestres, estes projectos não serão executados em 2021.

89. No Relatório da Execução Orçamental do 3.º trimestre, verifica-se que 10 projectos não iriam ser executados em 2021, de acordo com os



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

dados sobre o andamento dos projectos fornecidos pelos serviços proponentes: o IAM e a DSFSM tinham, respectivamente, três projectos, os SPU tinham dois projectos, e o IC e os SA tinham, respectivamente, um projecto:

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado
IAM	Obra de Construção do Parque Desportivo no Troço Leste do Kartódromo	10 500 000,00
IAM	Obra de Construção do Campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá	20 862 000,00
IAM	Obra de Construção duma Zona de Lazer nos Lotes BT8,9,11,12 na Taipa	3 460 184,20
DSFSM	Garantia inteligente	199 990 000,00
DSFSM	Prevenção e combate inteligente a incêndios	7 572 700,00
DSFSM	Escola superior inteligente	8 500 000,00
SPU	Protecção civil inteligente	22 000 000,00
SPU	Vida da população inteligente	10 000 000,00
IC	Remodelação da sala de ensaios da Orquestra Chinesa de Macau	112 000,00
SA	Serviços de Alfândega Inteligentes	41 410 500,00

IV. OPINIÕES E SUGESTÕES

90. No 1.º semestre de 2021, as taxas de execução das despesas orçamentadas do “Orçamento ordinário integrado” e do “Orçamento agregado dos organismos especiais” foram de 42,5% e 40,1%, respectivamente. A Comissão considera que estas taxas de execução orçamental são razoáveis.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

91. A taxa de execução orçamental a médio prazo do “Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais” foi de apenas 4%. Com base nos esclarecimentos prestados pela AMCM e pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, constata-se que a situação efectiva dos projectos ficou aquém da previsão inicial ou que houve necessidade de se proceder a ajustamentos nos projectos iniciais. A Comissão entende que, na fase de definição dos projectos, o Governo deve proceder a uma análise e a um planeamento mais aprofundados e pormenorizados, com vista a evitar discrepâncias em relação ao previsto só depois dos projectos serem iniciados e, consequentemente, a não utilização dos orçamentos inscritos.
92. Até ao 3.º trimestre de 2021, a taxa de execução e a taxa de utilização do orçamento do PIDDA foram, respectivamente, de 46,4% e 79,5%, o que demonstra que os trabalhos desenvolvidos pelo Governo na promoção geral do PIDDA foram satisfatórios, facto que foi reconhecido pela Comissão.
93. No entanto, das explicações apresentadas pelos representantes do Governo à Comissão sobre a suspensão ou o adiamento da execução dos projectos, verifica-se que os estudos de viabilidade de alguns projectos não foram suficientemente rigorosos e abrangentes. Por



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

exemplo, após uma análise profunda de alguns projectos por parte do IAM, verificou-se que havia necessidade de elaborar um plano geral tendo em consideração o meio envolvente, ou que existiam instalações semelhantes na vizinhança, por isso, foi necessário suspender ou adiar a execução das obras. O Governo deve então proceder a análises de viabilidade mais rigorosas e abrangentes aquando da definição dos projectos, e criar mesmo um mecanismo de cooperação intersetores, em prol da boa coordenação dos projectos.

94. A Comissão vai dar continuidade ao acompanhamento da execução do PIDDA.

V. CONCLUSÃO

95. A Comissão conclui o seguinte:

- (1) Entregar o presente relatório ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e propor a sua distribuição a todos os Deputados;
- (2) Enviar o presente relatório ao Governo.

Macau, 4 de Abril de 2022.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

A Comissão,

Wong Kit Cheng

(Presidente)

Ip Sio Kai

(Secretário)

Chan Chak Mo

Lau Teng Pio

Pang Chuan

Lam Lon Wai



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

梁鴻紹

Leong Hong Sai

張健中

Cheung Kin Chung

羅彩玲

Lo Choi In

黎永龍

Lei Leong Wong



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

孫
陳
黃
程
尹
林
鄭

ANEXO I

PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO — RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL NO 2.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2021

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

Relatório da Execução Orçamental no 2.º trimestre do ano económico de 2021



Julho 2021
DSF

Página em branco

Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 2.º trimestre do ano de 2021.

Desagregue-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito ou por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de cada projecto, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2021, cifrou-se em 18 510,89 milhões de patacas, o orçamento autorizado foi de 18 567,25 milhões de patacas, e a despesa efectiva foi de 5 579,32 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 30,0%¹, quanto às verbas cabimentadas, cifraram-se em 13 498,77 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 72,7%².

Em termos de programas, o “Programa de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 3 550,41 milhões de patacas e uma despesa efectiva no de 523,00 milhões de patacas; sendo, no qual, incluído o “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas-Construção de superestrutura”, com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 2 855,17 milhões de patacas, da despesa efectiva de 416,99 milhões de patacas e do cativo de 2 834,14 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 14,6% e de 99,3%; seguidamente o “Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”, com um orçamento autorizado no valor de 185,12 milhões de patacas, sendo ambas as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 0,0%.

Em termos orgânicos, o Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 6 569,43 milhões de patacas, perfazendo 35,4% do orçamento total, com as taxas

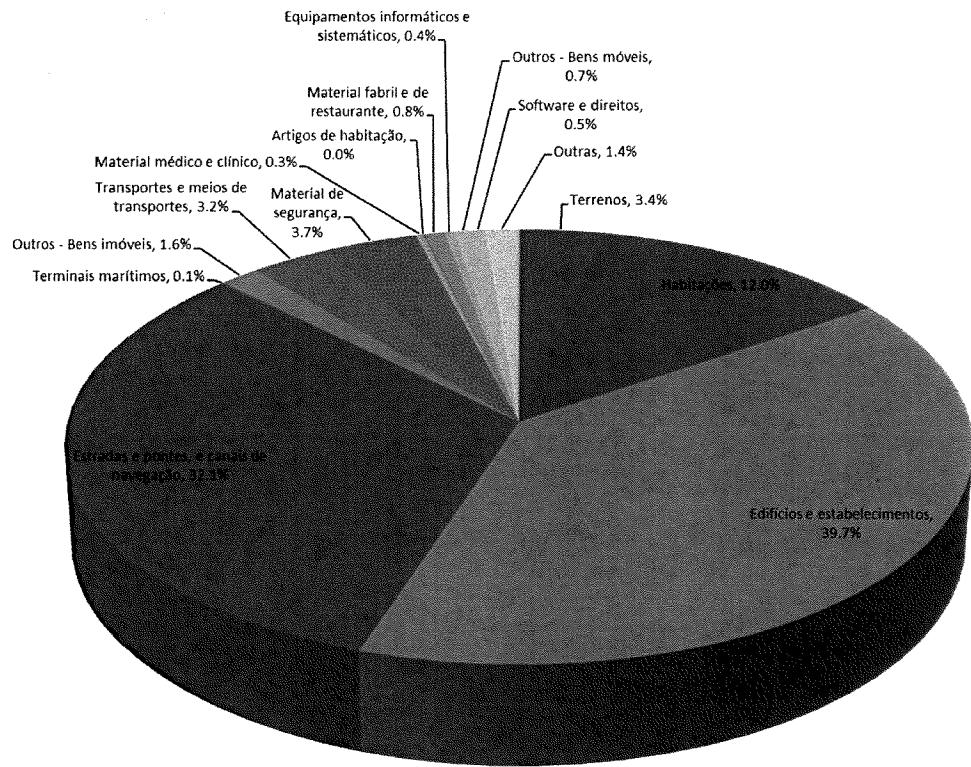
¹ Despesa efectiva/ orçamento autorizado

² Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 35,9% e 82,2%; de seguida, foram os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, cujo orçamento autorizado dos Serviços de Saúde ascendeu a 3 785,88 milhões de patacas, representando 20,4% do orçamento total, bem como 18,1% e 88,0% relativos às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental foi de 1 542,20 milhões de patacas, representando 8,3% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 29,5% e de 61,2%.

Por classificação económica, a dos “Edifícios e estabelecimentos” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 7 376,73 milhões de patacas, representando 39,7% do orçamento total, bem como 25,4% e 71,6% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos do “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.^a Fase” e dentre outros; seguindo-se, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação”, com o orçamento autorizado no valor de 5 963,47 milhões de patacas, representando 32,1% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 30,9% e de 74,4% ; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa”, da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, etc.


Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica



Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, sendo que o seu orçamento autorizado foi de 9 648,28 milhões de patacas, registando uma proporção de 52,0% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 28,7% e a de utilização orçamental de 67,5%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau – Taipa”, da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, etc.; seguindo-se a da “Saúde”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 842,51 milhões de patacas, representando 20,7% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 18,5% e de 88,0%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Empreitada de

Ampliação do Centro Hospitalar Conde de São Januário”, etc.

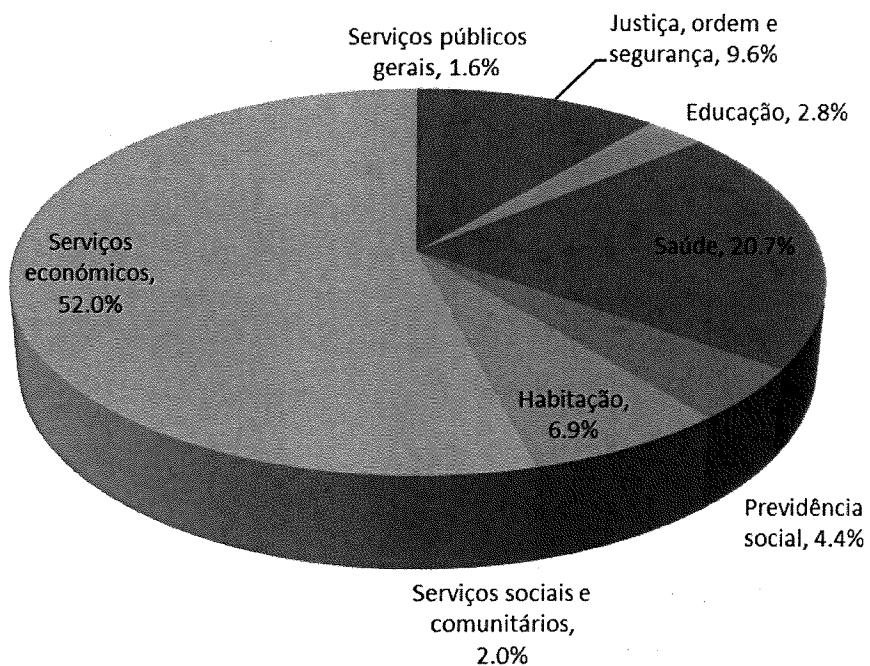Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional



Por programa

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2021 b
Obra de instalações públicas	3,280,209,700.00	3,280,209,700.00
Prog. Sist. Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,619,084,400.00	2,619,084,400.00
Habitação pública	1,892,128,900.00	1,892,128,900.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,109,430,200.00	3,109,430,200.00
Programa de aterros	281,457,400.00	281,457,400.00
Programa do novo campus da UM na Ilha de Hengqin	321,007,100.00	321,007,100.00
Obras de instalações de serviços	882,386,200.00	882,575,200.00
Prog. da const. do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	18,257,500.00	18,257,500.00
Equipamento de serviços	178,244,600.00	191,744,600.00
Programa do centro de transportes	26,886,000.00	26,886,000.00
Equipamento de instalações públicas	267,403,000.00	267,403,000.00
Prog. de construção do novo estabelecimento prisional	356,979,400.00	356,979,400.00
Meios de transporte	70,627,600.00	85,411,900.00
Prog. const. do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	3,550,406,300.00	3,550,406,300.00
Serviços de consultadoria para estudo	368,500.00	368,500.00
Instalações para água	52,752,300.00	52,752,300.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	340,627,000.00	340,627,000.00
Aquisição de Imóveis	0.00	27,879,866.66
Policlínico inteligente em nuvem	392,390,600.00	392,390,600.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	870,245,600.00	870,245,600.00
Total	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2021	Valor cabimentado até 30/6/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
874,483,514.67	1,744,614,970.78	26.7	53.2
1,000,046,087.29	1,713,278,262.38	38.2	65.4
1,192,572,056.84	1,843,708,260.26	63.0	97.4
893,305,117.30	2,824,891,103.19	28.7	90.8
92,963,467.81	279,872,763.65	33.0	99.4
56,775,615.18	141,321,792.04	17.7	44.0
472,161,987.83	654,521,831.13	53.5	74.2
11,198,769.20	12,681,922.00	61.3	69.5
10,500,600.45	96,596,056.28	5.5	50.4
4,422,790.70	26,592,141.15	16.5	98.9
1,176,000.00	82,471,696.00	0.4	30.8
59,812,996.21	270,000,582.60	16.8	75.6
4,650,603.20	65,357,843.20	5.4	76.5
523,001,140.31	3,131,860,585.00	14.7	88.2
0.00	0.00	0.0	0.0
33,275,681.67	51,570,451.10	63.1	97.8
227,520,922.49	339,155,293.17	66.8	99.6
27,879,866.66	27,879,866.66	100.0	100.0
0.00	10,050,000.00	0.0	2.6
93,574,427.50	182,340,053.10	10.8	21.0
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

Por classificação orgânica

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2021 b
Gab. Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	6,569,431,866.67
Polícia Judiciária	135,494,800.00	135,494,800.00
Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	694,792,366.66
Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	41,988,000.00
Dir. dos Serv. de Solos, Ob. Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	1,415,583,500.00
Dir. dos Serv. de Administração e Função Pública	72,416,000.00	85,916,000.00
Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	32,000,000.00
Dir. dos Serv. para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	222,620,000.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,542,200,000.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00
Instituto Cultural	49,285,000.00	49,285,000.00
Instituto do Desporto	72,249,100.00	72,249,100.00
Dir. dos Serv. das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	780,266,400.00
Dir. dos Serv. de Edu. e de Desenv. da Juventude	21,900,000.00	21,900,000.00
Dir. dos Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	162,930,000.00
Direcção dos Serviços Correcionais	395,947,300.00	395,947,300.00
Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	225,042,300.00
Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00
Instituto de Acção Social	820,993,000.00	821,933,000.00
Instituto de Habitação	665,099,000.00	653,990,033.33
Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	183,695,600.00
Universidade de Macau	321,007,100.00	321,007,100.00
Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	1,750,000.00
Comissário da Auditoria	0.00	675,000.00
Gabinete do Procurador do Ministério Público	0.00	1,605,000.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	0.00	6,164,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	342,710,000.00
Total	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2021	Valor cabimentado até 30/6/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
2,357,735,745.01	5,399,884,260.70	35.9	82.2
10,907,600.45	22,119,256.28	8.1	16.3
62,242,060.25	73,367,246.42	9.0	10.6
14,534,832.17	33,258,727.84	34.6	79.2
434,905,849.45	825,769,240.44	30.7	58.3
0.00	35,000,000.00	0.0	40.7
0.00	0.00	0.0	0.0
50,119,401.20	119,832,109.00	22.5	53.8
455,081,753.37	943,086,833.16	29.5	61.2
0.00	0.00	0.0	0.0
1,735,500.00	15,835,890.00	3.5	32.1
20,356,948.28	62,291,997.00	28.2	86.2
179,581,118.76	325,616,874.28	23.0	41.7
8,282,411.80	16,292,743.50	37.8	74.4
70,352,373.25	145,930,856.30	43.2	89.6
59,812,996.21	270,000,582.60	15.1	68.2
84,921,178.10	164,461,496.00	37.7	73.1
685,217,981.94	3,333,214,939.13	18.1	88.0
485,410,429.23	813,840,255.10	59.1	99.0
466,833,180.80	595,330,299.21	71.4	91.0
18,638,849.68	42,354,700.00	10.1	23.1
56,775,615.18	141,321,792.04	17.7	44.0
0.00	600,000.00	0.0	34.3
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
55,875,820.18	119,355,374.69	16.3	34.8
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

Por classificação económica

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/6/2021 b
Terrenos	617,498,100.00	622,048,100.00
Habitações	2,214,356,000.00	2,234,365,580.80
Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	7,376,726,262.06
Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	5,963,469,741.01
Terminals marítimos	20,720,000.00	20,720,000.00
Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	290,182,871.00
Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	597,088,602.00
Material de segurança	686,419,300.00	686,419,300.00
Material médico e clínico	53,700,000.00	53,700,000.00
Artigos de habitação	2,540,000.00	7,818,541.20
Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	153,727,600.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	79,496,700.00
Outros - Bens móveis	151,001,600.00	127,431,326.59
Software e direitos	86,000,000.00	99,000,000.00
Outras	251,355,800.00	255,050,842.00
Total	18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

Por classificação económica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2021	Valor cabimentado até 30/6/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
264,175,109.30	592,730,017.60	42.5	95.3
1,272,558,898.60	2,073,282,343.55	57.0	92.8
1,872,376,309.28	5,285,101,953.07	25.4	71.6
1,841,332,664.43	4,436,408,931.32	30.9	74.4
6,088,769.20	11,571,922.00	29.4	55.8
129,804,079.15	276,693,312.15	44.7	95.4
50,775,547.20	218,844,077.20	8.5	36.7
10,500,600.45	137,066,119.28	1.5	20.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	5,278,541.20	0.0	67.5
36,215,786.00	85,882,044.50	23.6	55.9
17,121,581.50	33,871,423.17	21.5	42.6
2,218,416.00	68,008,590.25	1.7	53.4
0.00	35,000,000.00	0.0	35.4
76,153,884.20	239,026,198.40	29.9	93.7
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7

Por classificação funcional

		2021	Orçamento
		Orçamento	autorizado
		Inicial	até 30/6/2021
		a	b
1-00	SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	264,764,900.00	292,376,699.71
1-01	Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	264,764,900.00	292,376,699.71
2-00	JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,762,270,600.00	1,786,126,337.00
2-01	Comando	65,447,200.00	65,479,240.00
2-02	Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	1,100,454,702.00
2-03	Bombeiros	48,372,400.00	48,547,295.00
2-04	Protecção civil	32,000,000.00	32,000,000.00
2-05	Justiça e ordem	135,494,800.00	143,697,800.00
2-06	Correcção	395,947,300.00	395,947,300.00
3-00	EDUCAÇÃO	514,952,700.00	514,952,700.00
3-02	Ensino	514,952,700.00	514,952,700.00
4-00	SAÚDE	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
4-02	Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
5-00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	821,201,000.00	822,141,000.00
5-02	Apoio social	821,201,000.00	822,141,000.00
6-00	HABITAÇÃO	1,281,844,600.00	1,280,904,600.00
6-01	Admin., regulamentação e investigação	105,888,000.00	105,888,000.00
6-02	Habitação pública	1,175,956,600.00	1,175,016,600.00

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2021	Valor cabimentado até 30/6/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
176,715,106.65	245,552,585.79	60.4	84.0
176,715,106.65	245,552,585.79	60.4	84.0
518,654,477.34	998,952,316.98	29.0	55.9
62,209,764.04	64,325,519.10	95.0	98.2
379,669,947.85	602,169,258.00	34.5	54.7
5,620,168.79	39,903,701.00	11.6	82.2
0.00	0.00	0.0	0.0
11,341,600.45	22,553,256.28	7.9	15.7
59,812,996.21	270,000,582.60	15.1	68.2
75,414,464.86	184,276,492.04	14.6	35.8
75,414,464.86	184,276,492.04	14.6	35.8
710,120,602.84	3,381,407,367.13	18.5	88.0
710,120,602.84	3,381,407,367.13	18.5	88.0
485,410,429.23	814,048,255.10	59.0	99.0
485,410,429.23	814,048,255.10	59.0	99.0
796,260,961.79	1,190,711,226.40	62.2	93.0
9,027,387.40	63,563,588.14	8.5	60.0
787,233,574.39	1,127,147,638.26	67.0	95.9

Por classificação funcional

		2021	Orçamento
		Orçamento	autorizado
		Inicial	até 30/6/2021
		a	b
7-00	SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.	388,008,800.00	379,952,345.00
7-01	Cultura	53,997,700.00	56,048,036.00
7-02	Desporto e recreio	315,511,100.00	305,404,309.00
7-04	Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	18,500,000.00
8-00	SERVIÇOS ECONÓMICOS	9,635,338,600.00	9,648,280,684.95
8-04	Instalações básicas	1,180,860,700.00	1,186,860,767.13
8-05	Transportes	6,243,036,500.00	6,238,423,132.82
8-08	Turismo	41,988,000.00	41,988,000.00
8-10	Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,355,902,000.00
8-11	Comércio e indústria	45,381,500.00	97,626,500.00
8-12	Ciências e tecnologias	72,416,000.00	85,916,000.00
8-99	Outras	694,593,900.00	641,564,285.00
Total		18,510,892,300.00	18,567,245,466.66

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/6/2021	Valor cabimentado até 30/6/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
47,838,476.52	170,815,998.61	12.6	45.0
7,444,377.28	22,598,854.55	13.3	40.3
40,394,099.24	147,720,144.06	13.2	48.4
0.00	497,000.00	0.0	2.7
2,768,907,126.08	6,513,001,231.64	28.7	67.5
419,399,507.72	933,593,463.67	35.3	78.7
1,797,712,532.82	4,466,781,561.22	28.8	71.6
14,534,832.17	33,258,727.84	34.6	79.2
455,081,753.37	925,921,593.16	33.6	68.3
2,926,500.00	2,926,500.00	3.0	3.0
0.00	35,000,000.00	0.0	40.7
79,252,000.00	115,519,385.75	12.4	18.0
5,579,321,645.31	13,498,765,473.69	30.0	72.7



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO II

PLANO DE INVESTIMENTOS E
DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL NO 3.º TRIMESTRE DO
ANO ECONÓMICO DE 2021

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

Relatório da Execução Orçamental no 3.º trimestre do ano económico de 2021



Página em branco

Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 3.º trimestre do ano de 2021.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte comprehende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito ou por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte comprehende informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de cada projecto, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2021, cifrou-se em 18 510,89 milhões de patacas, o orçamento autorizado foi de 18 584,25 milhões de patacas, e a despesa efectiva foi de 8 631,90 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 46,4%¹, quanto às verbas cabimentadas, cifraram-se em 14 780,56 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 79,5%².

Em termos de programas, o “Programa de construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 3 550,41 milhões de patacas e uma despesa efectiva no de 1 227,24 milhões de patacas; sendo, no qual, incluído o “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas-Construção de superestrutura”, com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 2 865,99 milhões de patacas, da despesa efectiva de 1 032,51 milhões de patacas e do cativo de 2 865,99 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 36,0% e de 100,0%; seguidamente o “Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”, com um orçamento autorizado no valor de 185,12 milhões de patacas, sendo ambas as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 0,0%.

Em termos orgânicos, o Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 6 562,43 milhões de patacas, perfazendo 35,3% do orçamento total, com as taxas

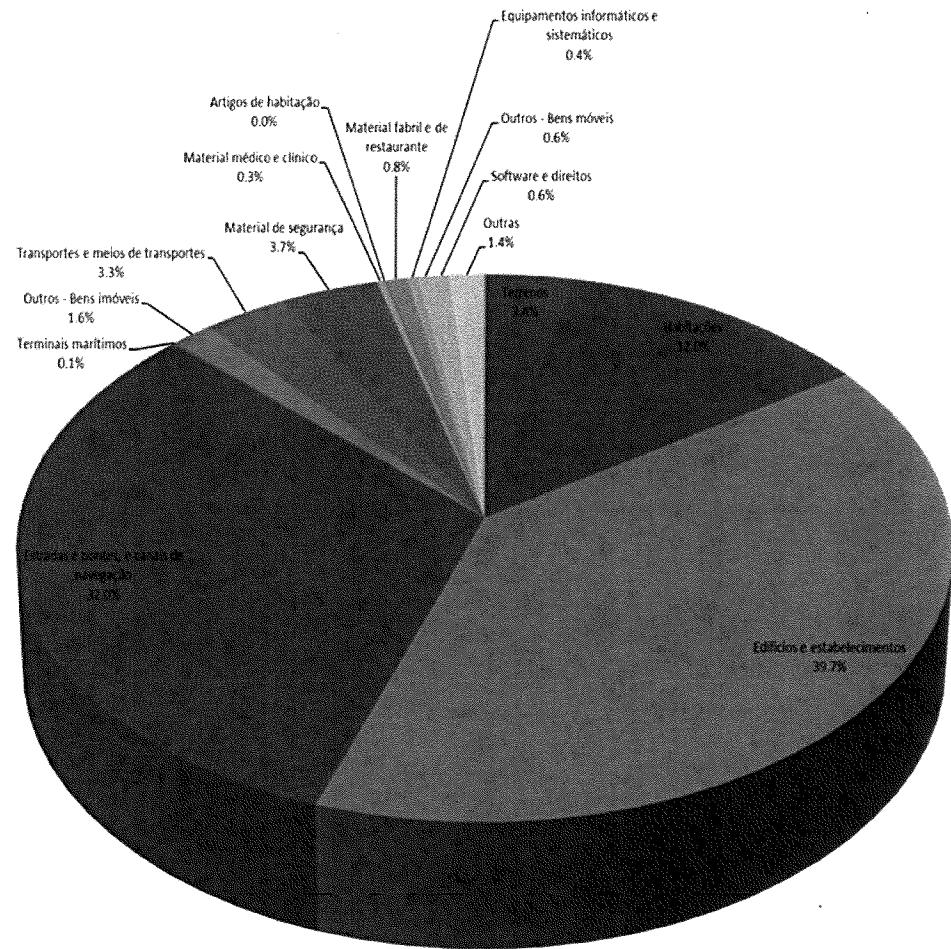
¹ Despesa efectiva/ orçamento autorizado

² Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 56,5% e 90,9%; de seguida, foram os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, cujo orçamento autorizado dos Serviços de Saúde ascendeu a 3 785,88 milhões de patacas, representando 20,4% do orçamento total, bem como 36,6% e 91,0% relativos às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental foi de 1 545,00 milhões de patacas, representando 8,3% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 48,1% e de 84,0%.

Por classificação económica, a dos “Edifícios e estabelecimentos” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 7 380,86 milhões de patacas, representando 39,7% do orçamento total, bem como 40,4% e 78,9% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos do “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.^a Fase” e dentre outros; seguindo-se, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação”, com o orçamento autorizado no valor de 5 947,24 milhões de patacas, representando 32,0% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 48,7% e de 81,4% ; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa”, da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, etc.


Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica



Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, sendo que o seu orçamento autorizado foi de 9 656,62 milhões de patacas, registando uma proporção de 52,0% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 46,3% e a de utilização orçamental de 78,1%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau – Taipa”, da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, etc.; seguindo-se a da “Saúde”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 842,51 milhões de patacas, representando 20,7% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 37,0% e de 90,9%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital, Edifício do Apoios

Logísticos, Edifício dos Serviços de Multi-usos e Administrativos dos Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Empreitada de Ampliação do Centro Hospitalar Conde de São Januário”, etc.

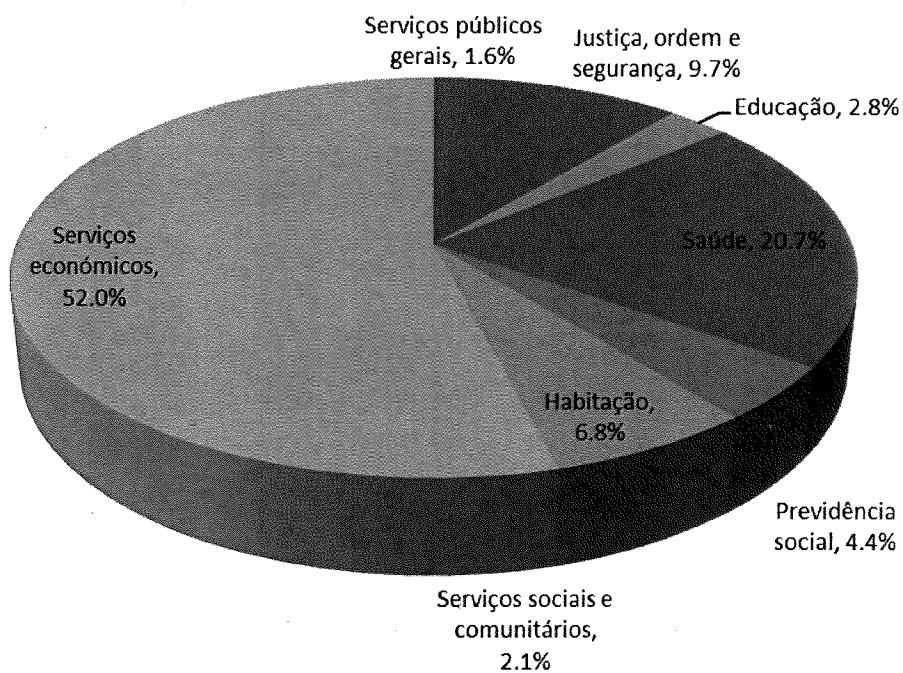Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional



Por programa

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2021 b
Obra de instalações públicas	3,280,209,700.00	3,280,209,700.00
Prog. Sist. Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,619,084,400.00	2,619,084,400.00
Habitação pública	1,892,128,900.00	1,892,128,900.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,109,430,200.00	3,109,430,200.00
Programa de aterros	281,457,400.00	281,457,400.00
Programa do novo campus da UM na Ilha de Hengqin	321,007,100.00	321,007,100.00
Obras de instalações de serviços	882,386,200.00	882,575,200.00
Prog. da const. do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	18,257,500.00	18,257,500.00
Equipamento de serviços	178,244,600.00	200,744,600.00
Programa do centro de transportes	26,886,000.00	26,886,000.00
Equipamento de instalações públicas	267,403,000.00	267,403,000.00
Prog. de construção do novo estabelecimento prisional	356,979,400.00	356,979,400.00
Meios de transporte	70,627,600.00	85,411,900.00
Prog. const. do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	3,550,406,300.00	3,550,406,300.00
Serviços de consultadoria para estudo	368,500.00	368,500.00
Instalações para água	52,752,300.00	52,752,300.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	340,627,000.00	340,627,000.00
Aquisição de Imóveis	0.00	35,879,866.66
Policimentação inteligente em nuvem	392,390,600.00	392,390,600.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	870,245,600.00	870,245,600.00
Total	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2021	Valor cabimentado até 30/9/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
1,310,633,245.92	2,166,869,317.11	40.0	66.1
1,569,207,207.60	2,116,204,261.84	59.9	80.8
1,451,373,768.46	1,847,884,311.86	76.7	97.7
1,526,269,499.58	3,000,400,024.96	49.1	96.5
161,900,615.39	279,872,763.65	57.5	99.4
102,259,117.06	216,065,453.04	31.9	67.3
553,700,462.22	672,268,779.29	62.7	76.2
14,549,542.03	17,581,922.00	79.7	96.3
26,111,524.35	149,674,095.18	13.0	74.6
11,093,765.71	26,826,601.15	41.3	99.8
75,118,496.00	82,471,696.00	28.1	30.8
103,986,663.31	270,000,582.60	29.1	75.6
22,085,903.20	81,578,143.20	25.9	95.5
1,227,241,341.42	3,242,242,575.20	34.6	91.3
0.00	0.00	0.0	0.0
44,175,651.54	51,570,451.10	83.7	97.8
283,594,452.92	338,780,589.42	83.3	99.5
27,879,866.66	27,879,866.66	77.7	77.7
10,050,000.00	10,050,000.00	2.6	2.6
110,669,074.77	182,340,053.10	12.7	21.0
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

Por classificação orgânica

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2021 b
Gab. Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	6,562,431,866.67
Polícia Judiciária	135,494,800.00	135,494,800.00
Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	699,976,226.66
Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	41,988,000.00
Dir. dos Serv. de Solos, Ob. Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	1,424,193,500.00
Dir. dos Serv. de Administração e Função Pública	72,416,000.00	94,916,000.00
Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00
Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	32,000,000.00
Dir. dos Serv. para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	221,010,000.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,545,000,000.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00
Instituto Cultural	49,285,000.00	49,285,000.00
Instituto do Desporto	72,249,100.00	72,249,100.00
Dir. dos Serv. das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	780,266,400.00
Dir. dos Serv. de Edu. e de Desenv. da Juventude	21,900,000.00	21,900,000.00
Dir. dos Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	160,130,000.00
Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	395,947,300.00
Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	225,042,300.00
Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00
Instituto de Acção Social	820,993,000.00	821,933,000.00
Instituto de Habitação	665,099,000.00	641,822,533.33
Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	183,695,600.00
Universidade de Macau	321,007,100.00	321,007,100.00
Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	1,750,000.00
Comissário da Auditoria	0.00	675,000.00
Gabinete do Procurador do Ministério Público	0.00	1,983,000.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	0.00	15,236,000.00
Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00
Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	342,710,000.00
Total	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2021	Valor cabimentado até 30/9/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
3,708,041,250.30	5,966,475,504.70	56.5	90.9
19,959,724.35	32,442,238.18	14.7	23.9
67,250,078.66	134,403,781.42	9.6	19.2
25,650,719.17	33,258,727.84	61.1	79.2
600,115,882.90	834,744,466.10	42.1	58.6
0.00	77,755,057.00	0.0	81.9
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
67,069,879.20	119,832,109.00	30.3	54.2
742,875,415.45	1,298,101,240.29	48.1	84.0
42,000.00	189,000.00	22.2	100.0
6,281,030.00	16,181,922.00	12.7	32.8
41,389,791.72	62,291,997.00	57.3	86.2
277,020,382.02	324,907,380.12	35.5	41.6
12,740,337.05	16,907,543.50	58.2	77.2
100,660,030.33	144,893,356.24	62.9	90.5
103,986,663.31	275,007,817.60	26.3	69.5
124,696,238.60	179,556,296.00	55.4	79.8
1,386,164,370.21	3,443,596,929.33	36.6	91.0
596,060,267.74	813,840,255.10	72.5	99.0
530,793,953.10	595,330,299.21	82.7	92.8
29,333,635.84	42,354,700.00	16.0	23.1
102,259,117.06	216,065,453.04	31.9	67.3
300,000.00	600,000.00	17.1	34.3
150,000.00	675,000.00	22.2	100.0
0.00	1,605,000.00	0.0	80.9
1,020,000.00	8,790,000.00	6.7	57.7
1,000,000.00	3,526,140.00	19.5	68.7
87,039,431.13	137,229,273.69	25.4	40.0
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

Por classificação económica

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2021 b
Terrenos	617,498,100.00	636,971,223.33
Habitações	2,214,356,000.00	2,235,684,184.84
Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	7,380,863,897.96
Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	5,947,237,272.74
Terminal marítimos	20,720,000.00	23,520,000.00
Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	290,182,871.00
Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	612,378,362.00
Material de segurança	686,419,300.00	686,419,300.00
Material médico e clínico	53,700,000.00	53,700,000.00
Artigos de habitação	2,540,000.00	7,818,541.20
Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	153,727,600.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	76,696,700.00
Outros - Bens móveis	151,001,600.00	114,199,901.59
Software e direitos	86,000,000.00	108,000,000.00
Outras	251,355,800.00	256,845,612.00
Total	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

Por classificação económica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2021	Valor cabimentado até 30/9/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
371,733,768.83	612,698,508.73	58.4	96.2
1,602,513,607.66	2,125,753,607.19	71.7	95.1
2,978,210,490.66	5,824,653,326.39	40.4	78.9
2,893,515,009.18	4,842,182,540.00	48.7	81.4
9,739,469.03	16,981,784.00	41.4	72.2
196,867,759.83	276,693,312.15	67.8	95.4
279,756,705.20	400,064,377.20	45.7	65.3
94,382,387.35	147,389,101.18	13.7	21.5
0.00	0.00	0.0	0.0
5,044,349.60	5,278,541.20	64.5	67.5
62,303,458.30	107,029,240.50	40.5	69.6
26,109,414.50	45,192,306.17	34.0	58.9
32,593,687.00	68,008,590.25	28.5	59.6
0.00	66,434,174.00	0.0	61.5
79,130,091.00	242,202,078.40	30.8	94.3
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5

Por classificação funcional

		2021	Orçamento
		Orçamento	autorizado
		Inicial	até 30/9/2021
		a	b
1-00	SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	264,764,900.00	290,795,583.71
1-01	Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	264,764,900.00	290,795,583.71
2-00	JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,762,270,600.00	1,800,120,693.00
2-01	Comando	65,447,200.00	64,889,956.00
2-02	Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	1,100,454,702.00
2-03	Bombeiros	48,372,400.00	48,547,295.00
2-04	Protecção civil	32,000,000.00	32,000,000.00
2-05	Justiça e ordem	135,494,800.00	158,281,440.00
2-06	Correcção	395,947,300.00	395,947,300.00
3-00	EDUCAÇÃO	514,952,700.00	514,952,700.00
3-02	Ensino	514,952,700.00	514,952,700.00
4-00	SAÚDE	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
4-02	Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
5-00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	821,201,000.00	822,141,000.00
5-02	Apoio social	821,201,000.00	822,141,000.00
6-00	HABITAÇÃO	1,281,844,600.00	1,268,737,100.00
6-01	Admin., regulamentação e investigação	105,888,000.00	93,720,500.00
6-02	Habitação pública	1,175,956,600.00	1,175,016,600.00

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2021	Valor cabimentado até 30/9/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
200,325,316.81	246,469,916.44	68.9	84.8
200,325,316.81	246,469,916.44	68.9	84.8
728,839,128.77	1,042,970,956.39	40.5	57.9
63,932,871.61	63,932,871.61	98.5	98.5
522,240,876.70	617,264,058.00	47.5	56.1
16,264,992.80	39,968,831.00	33.5	82.3
0.00	0.00	0.0	0.0
22,413,724.35	46,797,378.18	14.2	29.6
103,986,663.31	275,007,817.60	26.3	69.5
131,892,752.90	259,020,153.04	25.6	50.3
131,892,752.90	259,020,153.04	25.6	50.3
1,422,940,666.95	3,491,789,357.33	37.0	90.9
1,422,940,666.95	3,491,789,357.33	37.0	90.9
596,267,497.91	814,048,255.10	72.5	99.0
596,267,497.91	814,048,255.10	72.5	99.0
968,270,042.50	1,194,887,278.00	76.3	94.2
21,975,861.20	63,563,588.14	23.4	67.8
946,294,181.30	1,131,323,689.86	80.5	96.3

Por classificação funcional

		2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 30/9/2021 b
7-00	SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.	388,008,800.00	388,369,121.00
7-01	Cultura	53,997,700.00	64,048,036.00
7-02	Desporto e recreio	315,511,100.00	305,421,085.00
7-04	Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	18,500,000.00
7-06	Comunicação social	0.00	400,000.00
8-00	SERVIÇOS ECONÓMICOS	9,635,338,600.00	9,656,618,168.95
8-04	Instalações básicas	1,180,860,700.00	1,183,416,422.65
8-05	Transportes	6,243,036,500.00	6,241,867,477.30
8-08	Turismo	41,988,000.00	41,988,000.00
8-10	Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,355,239,484.00
8-11	Comércio e indústria	45,381,500.00	97,626,500.00
8-12	Ciências e tecnologias	72,416,000.00	94,916,000.00
8-99	Outras	694,593,900.00	641,564,285.00
Total		18,510,892,300.00	18,584,245,466.66

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 30/9/2021	Valor cabimentado até 30/9/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
110,668,136.74	186,202,655.61	28.5	47.9
12,852,657.86	22,944,886.55	20.1	35.8
97,318,478.88	162,760,769.06	31.9	53.3
497,000.00	497,000.00	2.7	2.7
0.00	0.00	0.0	0.0
4,472,696,655.56	7,545,172,915.45	46.3	78.1
611,040,397.39	931,098,070.97	51.6	78.7
3,000,292,276.28	5,048,636,304.60	48.1	80.9
25,650,719.17	33,258,727.84	61.1	79.2
740,011,151.45	1,275,373,484.29	54.6	94.1
2,940,365.00	61,440,365.00	3.0	62.9
0.00	77,755,057.00	0.0	81.9
92,761,746.27	117,610,905.75	14.5	18.3
8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4	79.5



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO III

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 3.º TRIMESTRE

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO SERVIÇO PROPONENTE

Anexo III

Execução Orçamental do PIDDAs 3.º trimestre - classificação segundo serviço proponente

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Valor pago	Valor de cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	Projectos com taxa de utilização zero
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	-	189,000.00	42,000.00	189,000.00	22.2%	100.0%	1	0
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	1,424,193,500.00	600,115,882.90	834,744,466.10	42.1%	58.6%	44	4
Instituto Cultural	49,285,000.00	49,285,000.00	6,281,030.00	16,181,922.00	12.7%	32.8%	8	2
Policia Judiciária	135,494,800.00	135,494,800.00	19,959,724.35	32,442,238.18	14.7%	23.9%	7	2
Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	342,710,000.00	87,039,431.13	137,229,273.69	25.4%	40.0%	29	11
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	221,010,000.00	67,069,879.20	119,832,109.00	30.3%	54.2%	3	1
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	72,416,000.00	94,916,000.00	-	77,755,057.00	0.0%	81.9%	3	1
Instituto de Habitação	665,099,000.00	641,822,533.33	530,793,953.10	595,330,299.21	82.7%	92.8%	15	4
Instituto de Acção Social	820,993,000.00	821,933,000.00	596,060,267.74	813,840,255.10	72.5%	99.0%	2	0
Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	41,988,000.00	25,650,719.17	33,258,727.84	61.1%	79.2%	1	0
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	160,130,000.00	100,660,030.33	144,893,356.24	62.9%	90.5%	13	1
Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	699,976,226.66	67,250,078.66	134,403,781.42	9.6%	19.2%	8	1
Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude	21,900,000.00	21,900,000.00	12,740,337.05	16,907,543.50	58.2%	77.2%	1	0
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	-	15,236,000.00	1,020,000.00	8,790,000.00	6.7%	57.7%	3	1
Comissariado Contra a Corrupção	-	5,133,640.00	1,000,000.00	3,526,140.00	19.5%	68.7%	1	0
Gabinete de Comunicação Social	-	400,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	6,562,431,866.67	3,708,041,250.30	5,966,475,504.70	56.5%	90.9%	43	0
Comissariado de Auditoria	-	675,000.00	150,000.00	675,000.00	22.2%	100.0%	1	0
Serviços de Saúde	-	3,785,880,100.00	1,386,164,370.21	3,443,596,929.33	36.6%	91.0%	9	2
Universidade de Macau	321,007,100.00	321,007,100.00	102,259,117.06	216,065,453.04	31.9%	67.3%	19	4
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	780,266,400.00	277,020,382.02	324,907,380.12	35.5%	41.6%	14	5
Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	1,750,000.00	300,000.00	600,000.00	17.1%	34.3%	1	0
Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	225,042,300.00	124,696,238.60	179,556,296.00	55.4%	79.8%	5	2
Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	183,695,600.00	29,333,635.84	42,354,700.00	16.0%	23.1%	2	1

Anexo III**Execução Orçamental do PIDDA 3.º trimestre - classificação segundo serviço proponente**

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Valor pago	Valor de cabimentação orçamental	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	Projectos com taxa de utilização zero
Gabinete do Procurador	-	1,983,000.00	-	1,605,000.00	0.0%	80.9%	1	0
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,545,000,000.00	742,875,415.45	1,298,101,240.29	48.1%	84.0%	31	1
Direcção dos Serviços Correcionais	395,947,300.00	395,947,300.00	103,986,663.31	275,007,817.60	26.3%	69.5%	5	3
Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
Instituto do Desporto	72,249,100.00	72,249,100.00	41,389,791.72	62,291,997.00	57.3%	86.2%	3	1
Total	18,510,892,300.00	18,584,245,466.66	8,631,900,198.14	14,780,561,487.36	46.4%	79.5%	273	50

O Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água executaram, em conjunto, a Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó

O Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas e o Instituto de Acção Social executaram, em conjunto, o projeto Habitação Pública no Bairro de Ilha Verde, Lotes 1 & 2 - Equipamentos Sociais

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau executaram, em conjunto, a Empreitada de Construção do Posto Operacional Provisório dos Bombeiros da Ilha Verde

22



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

孫
陳
黃
劉
許
梁
黎
尹

ANEXO IV

PROJECTOS DO PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 3.º TRIMESTRE COM TAXA DE UTILIZAÇÃO ORÇAMENTAL ZERO






Anexo IV

Projectos do PIDDA 3.º trimestre com taxa de utilização orçamental zero

Serviço proponente	Serviço executor	Designação do projecto	Orçamento autorizado
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Estudo do Plano Urbano de Seac Pai Van	368,500.00
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Via de Acesso A2 entre a Zona A Dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau	26,600,000.00
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Obra de instalação de elevadores na passagem superior para peões situada na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues	4,704,932.60
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Empreitada de reconstrução da Estação Elevatória das Águas Residuais da Barra (EP2)	1,208,890.27
Instituto Cultural	Instituto Cultural	Remodelação da sala de ensaios da Orquestra Chinesa de Macau	112,000.00
Instituto Cultural	Instituto Cultural	Concepção e Obras de construção da Nova Biblioteca Central de Macau	27,662,000.00
Policia Judiciária	Policia Judiciária	Judiciária inteligente	30,000,000.00
Policia Judiciária	Policia Judiciária	Plataforma de gestão de informações policiais e administrativas da Polícia Judiciária	20,300,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento Geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen	4,000,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Construção duma Zona de Lazer no Lote CN2C em Coloane	13,750,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Construção de um Parque Desportivo no Troço Leste do Kartódromo	10,500,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Construção do Campo de bicicletas de montanha e quadricíclos para crianças de Hac-Sá	20,862,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Repavimentação com asfalto e de beneficiacão de parte dos canais da Rua de Pequim e Rua de Luís Gonzaga Gomes e arruamentos envolventes	4,000,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Repavimentação com asfalto da estrada de Son On e das vias envolventes, na Taipa	5,000,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de pavimentação com asfalto na Praça das Portas do Cerco, no Bairro Iao Hon, na Avenida do Governador Jaime Silvério Marques e arruamentos envolventes	7,000,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento dos passeios e faixas de rodagem na zona dos NAPE Altinho de Ká Hó, em Coloane	4,000,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de bombagem dos canais de águas residuais na estrada do	10,000,000.00

Anexo IV**Projectos do PIDDAA 3.º trimestre com taxa de utilização orçamental zero**

Serviço proponente	Serviço executor	Designação do projecto	Orçamento autorizado
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Melhoramento das quadras públicas da Areia Preta e Iao Hon	8,272,655.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Construção duma Zona de Lazer nos Lotes BT8,9,11,12 na Taipa	3,460,184.20
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	Obras de Modificação da Estação de Autocarros e Auto-Silo da Praça de Ferreira do Amaral	28,000,000.00
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Aquisição de Infraestrutura de plataforma de escritório móvel.	9,000,000.00
Instituto de Habitação	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B5 da Zona A dos Novos Aterros	310,800.00
Instituto de Habitação	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B1 da Zona A dos Novos Aterros	938,000.00
Instituto de Habitação	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	2,537,000.00
Instituto de Habitação	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	2,633,373.33
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Trem Naval da DSAMA - Barco de Sondagem	654,000.00
Direcção dos Serviços de Finanças	Direcção dos Serviços de Finanças	Aquisição do prédio sítio n.º 24 da Travessa da Porta	8,000,000.00
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Obra de Construção do Edifício do Tribunal de Segunda Instância nos Lotes C12 e C14 do Lago Nam Van	4,934,000.00
Gabinete de Comunicação Social	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Depósito permanente do arquivo do GCS	400,000.00
Serviços de Saúde	Serviços de Saúde	Obras de Melhoramento das Instalações do Centro Hospitalar Conde de S. Januário	18,363,800.00
Serviços de Saúde	Serviços de Saúde	Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	185,119,739.88

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Anexo IV**Projectos do PIDDA 3.º trimestre com taxa de utilização orçamental zero**

Serviço proponente	Serviço executor	Designação do projecto	Orçamento autorizado
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S34 da Universidade de Macau	42,000,000.00
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Estação de Recepção de Dados de Satélite da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau	11,000,000.00
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Obras de construção do gabinete do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais no 6.º andar do Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau	3,300,000.00
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Obras de construção da residência de docentes e funcionários S33 da Universidade de Macau	7,943,582.80
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Garantia inteligente	199,990,000.00
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Prevenção e combate inteligente a incêndios	7,572,700.00
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Acréscimo de equipamentos para Inspeção Fronteiriça Integral no Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	23,000,000.00
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Escola superior inteligente	8,500,000.00
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin (primeira fase)	160,580,000.00
Serviços de Alfândega da RAEM	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau - Construção de Dois Desembarcadouros.	576,000.00
Instituto Politécnico de Macau	Serviços de Alfândega da RAEM	Serviços de Alfândega Inteligentes	41,410,500.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Instituto Politécnico de Macau	Obra de Acabamento da Nova Zona Escolar do Instituto Politécnico de Macau, na Taipa	23,947,700.00
Direcção dos Serviços Correcionais	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Obras de Construção da Instalação de Triagem e Armazenamento Temporário de Materiais Inertes de Demolição e Construção	15,459,093.67
	Direcção dos Serviços Correcionais	Direcção dos Serviços Correcionais - Obras de melhoramento do sistema de electricidade	9,000,000.00

Anexo IV**Projectos do PIDDAA 3.º trimestre com taxa de utilização orçamental zero**

Serviço proponente	Serviço executor	Designação do projecto	Orçamento autorizado
Direcção dos Serviços Correccionalis	Direcção dos Serviços Correccionalis	Correcção Inteligente	12,627,900.00
Direcção dos Serviços Correccionalis	Direcção dos Serviços Correccionalis	Direcção dos Serviços Correccionalis – Obras de alteração da zona prisional masculina	11,600,000.00
Serviços de Polícia Unitários	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	22,000,000.00
Serviços de Polícia Unitários	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	10,000,000.00
Instituto de Desporto	Instituto de Desporto	Obra de reconstrução do Pavilhão de Mong Há	1,846,000.00
		Total	1,075,045,351.75

47329192
47329192
47329192
47329192
