



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS ASSUNTOS DE  
FINANÇAS PÚBLICAS**

**Relatório n.º 2/VII/2022**

**Assunto: Acompanhamento do Relatório de Execução Orçamental do Plano de  
Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração do  
4.º Trimestre de 2021**

**I. INTRODUÇÃO**

1. A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas (doravante designada por “Comissão”) foi constituída nos termos do artigo 29.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução n.º 1/1999, com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.ºs 1/2004, 2/2009, 1/2013, 1/2015 e 2/2017.
2. No dia 19 de Novembro de 2021, a Comissão aprovou, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º e no artigo 88.º do Regimento da Assembleia Legislativa, as regras relativas ao seu funcionamento – Regras de Funcionamento da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like '林' and '青'.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(doravante designadas por “Regras de Funcionamento”) – constantes do Anexo da sua Deliberação n.º 1/2021.

3. De acordo com o n.º 1 do artigo 9.º das supracitadas Regras de Funcionamento: “[a]s comissões de acompanhamento devem elaborar um relatório ou parecer sempre que terminem o acompanhamento de um assunto, podendo propor as medidas consideradas necessárias ou adequadas à matéria em análise”.
4. No exercício das suas competências, a Comissão reuniu-se no dia 4 de Abril de 2022 para o acompanhamento do Relatório de Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) relativo ao 4.º Trimestre de 2021. Depois da reunião, a Comissão, de acordo com as matérias que foram discutidas, decidiu submeter ao Governo uma lista de questões sobre o referido relatório.
5. Em 13 de Maio de 2022, o Governo apresentou as respostas, e as informações complementares, às questões colocadas pela Comissão.
6. Após uma análise e um estudo profundos, a Comissão entendeu, por unanimidade, que o conteúdo das respostas e das informações complementares facultadas pelo Governo era detalhado, pelo que decidiu não convidar representantes do Governo para participarem nas reuniões da



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Comissão com a finalidade de apresentação e diálogo sobre o respectivo assunto.

7. A Comissão, tendo concluído os referidos trabalhos de acompanhamento, apresenta o presente relatório.

## II. PONTO DE SITUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO

8. Em relação às questões colocadas ao Governo pela Comissão e às respostas deste, o respectivo conteúdo foi apenas transcrito, de forma sucinta.

9. A Comissão solicitou esclarecimentos ao Governo sobre as despesas dos projectos que envolveram a libertação de 740 milhões de patacas de verbas cabimentadas no 4.º trimestre de 2021, e as razões da referida libertação.

10. Resposta do Governo:

Os projectos com maior valor de cabimentação libertado no 4.º trimestre de 2021 são os seguintes:

- (I) 16094 Quarta ponte Macau-Taipa (Direcção dos Serviços de Obras Públicas)



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

O andamento da obra foi atrasado devido ao impacto da epidemia e das condições geotécnicas *in loco*. Não foi possível efectuar o pagamento do valor orçamental, visto que a obra não alcançou o objectivo e não satisfaz as condições de pagamento.

- (II) 18032 Edifício do Hospital, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Usos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de Superestrutura (Serviços de Saúde)

A redução da dotação orçamental do projecto esteve apenas associada à acção da Obra 18.032.001. O orçamento inicial em 2021 foi de 2800 milhões de patacas, tendo sido integralmente cabimentado. Devido ao impacto da epidemia da COVID-19, a execução do projecto foi adiada e o valor de pagamento previsto foi menor do que o valor cabimentado. Por conseguinte, na referida acção foi reduzido o valor de 200 milhões de patacas, com a dotação orçamental final fixada em 2600 milhões de patacas, e o pagamento efectivo para o ano de 2021 foi de 2599 milhões de patacas. Na globalidade do projecto, a dotação orçamental final em 2021 foi de 2666 milhões de patacas, e o pagamento efectivo foi de 2665 milhões de patacas.

11. A Comissão solicitou esclarecimentos ao Governo sobre os motivos da inscrição no 4.º trimestre dos seguintes 7 projectos: Obra de planeamento da



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

urbanização de Seac Pai Van, Coloane, Construção de dois túneis subaquáticos adjacentes às partes laterais da Ponte General Nobre de Carvalho, Residência de docentes e funcionários S35 da Universidade de Macau, Finanças inteligentes, Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao, Obras de construção das instalações de tratamento para remoção de óleos por flotação e por ar dissolvido – ETAR da Taipa, e Projecto da obra de construção das instalações provisórias de formação de Seac Pai Van.

12. Resposta do Governo:

- (I) 10017 Obra de planeamento da urbanização de Seac Pai Van, Coloane  
(Direcção dos Serviços de Obras Públicas)

Após a análise por parte do Departamento de Planeamento Urbanístico da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, e tendo em consideração que as propostas do Departamento de Infra-estruturas prevalecem sobre o projecto viário da concepção inicial do empreiteiro, este não prestou serviços completos de assistência técnica para a obra referente às infra-estruturas na Avenida Vale das Borboletas.

1. 梁林任景



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Ao mesmo tempo, através de carta apresentada no dia 6 de Dezembro de 2021, o empreiteiro, por um lado, manifestou a desistência das despesas de indemnização em causa e, por outro, requereu o pagamento dos custos relativos a uma parte da assistência técnica prestada.

(II) 18009 Construção de dois túneis subaquáticos adjacentes às partes laterais da Ponte General Nobre de Carvalho (Direcção dos Serviços de Obras Públicas)

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes tinha apresentado, anteriormente, o relatório de estudo temático aos Ministérios e Comissões do Interior da China. No 4.º trimestre de 2021 foi recebida a resposta, na qual se referia que tinham sido consultados todos os Ministérios e Comissões do Interior da China, não tendo sido apresentados pareceres discordantes, assim sendo, houve condições para efectuar o respectivo pagamento no 4.º trimestre.

(III) 19035 Residência de docentes e funcionários S35 da Universidade de Macau (Universidade de Macau)

Apesar da conclusão das obras da Residência de docentes e funcionários S35 no final de 2020, devido à pandemia, a procura por alojamento em residências



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

de docentes e funcionários nesse ano abrandou. Atendendo às necessidades reais da Universidade de Macau, estava previsto que os requerimentos para o alojamento na referida Residência por docentes e funcionários elegíveis começassem a ser aceites em Dezembro de 2021. Com vista à melhoria das condições de residência em tempo oportuno, os procedimentos de aquisição dos itens relevantes tiveram lugar no 3.º trimestre de 2021, tendo sido a proposta de consulta escrita e a proposta de adjudicação aprovadas pela Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, em 21 de Setembro e 7 de Dezembro de 2021, respectivamente. Para realizar a respectiva inscrição de verba era necessário apresentar a proposta de adjudicação aprovada pela entidade competente, assim, a Universidade de Macau enviou um ofício, em 15 de Dezembro de 2021, à Direcção dos Serviços de Finanças para proceder à respectiva inscrição, tendo sido a inscrição do projecto em questão efectuada no 4.º trimestre de 2021.

(IV) 21074 Finanças inteligentes (Direcção dos Serviços de Finanças)

A Direcção dos Serviços de Finanças iniciou, em Dezembro de 2020, o trabalho de investigação e estudo sobre a criação de Finanças inteligentes, tendo o intuito de construir um sistema financeiro electrónico e uniformizado com diversas funções, designadamente, a elaboração colectiva, aprovação e autorização do orçamento, a gestão das diversas despesas orçamentais e a

1  
梁  
林  
能  
黃  
張



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

gestão dos diversos activos da RAEM, para substituir, então, os sistemas desenvolvidos há muitos anos, utilizados anteriormente e de forma mista, o sistema de contabilidade para fins de escrituração, as aplicações de *software* propriamente desenvolvidas e os instrumentos de expediente estandardizados, como o balancete. Dado que se envolvem vários módulos para se realizar uma concepção integrada, torna-se necessário um período de tempo mais longo para a investigação e estudo em causa.

No 3.º trimestre de 2021, a Direcção dos Serviços de Finanças apresentou uma proposta para a criação do projecto de Finanças inteligentes, tendo a respectiva aquisição sido autorizada em Dezembro de 2021.

(V) 21085 Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao (Serviços de Saúde)

O 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço Macau no Posto Fronteiriço Qingmao, reservado para gabinetes de escritório do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, entrou imediatamente em funcionamento a partir da data da criação do referido Instituto (em 1 de Janeiro de 2022). Em 23 de Setembro de 2021, a Direcção dos Serviços de Finanças procedeu à transferência temporária das referidas instalações para os Serviços de Saúde, para efeitos de gestão e, no sentido de apoiar o Instituto para a Supervisão e

吳  
林  
能  
黃  
張



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Administração Farmacêutica nos trabalhos referentes à execução da obra de remodelação. O prazo previsto para a execução deste projecto era entre Novembro de 2021 e Dezembro de 2022, o projecto tem uma área total de cerca de 2220,19 metros quadrados, portanto foi pedida a inscrição do projecto 21.085 - Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao.

(VI) 21087 Obras de construção das instalações de tratamento para remoção de óleos por flotação e por ar dissolvido – ETAR da Taipa (Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental)

De forma a atenuar e a reduzir o impacto de óleos e gorduras presentes nas águas residuais no funcionamento normal da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Taipa e na qualidade dos efluentes, foi necessário construir instalações de tratamento para remoção de óleos por flotação e por ar dissolvido nesta Estação, para aumentar a sua capacidade de tratamento e remoção de óleos e gorduras na fase de pré-tratamento. Depois de rever a execução do PIDDA de 2021 e de efectuar as necessárias adaptações aos orçamentos de outros projectos, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental concluiu a pesquisa inicial da fase preliminar e a criação de projectos, no 3.º trimestre de 2021, tendo as obras sido adjudicadas no 4.º trimestre.

羅  
林  
林  
林  
林  
林  
林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(VII) 21088 Projecto da obra de construção das instalações provisórias de formação de Seac Pai Van (Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais)

Em 11 de Janeiro de 2021, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais viu autorizada a concessão de dois terrenos nos Lotes D1 e D2 em Seac Pai Van, com vista ao uso do espaço para a realização de actividades de formação profissional. O Lote E, adjacente aos Lotes D1 e D2, actualmente é utilizado para a formação de operadores de veículos de elevação, e estes três terrenos têm uma área total de cerca de 10 000 metros quadrados. A fim de melhor aproveitar os referidos três terrenos, para iniciar as actuais actividades e o futuro planeamento da formação profissional, e construir gradualmente uma base de formação prática e de demonstração para a indústria da construção, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais efectuou os seguintes trabalhos:

(1) Entre Fevereiro e Abril de 2021, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais entrou em contacto com os co-organizadores dos cursos, organizações sociais e instituições do sector para discussão e recolha de opiniões;

Handwritten signatures and initials in the right margin, including characters like '梁', '林', '任', '黃', '李', and '陳'.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(2) Entre Abril e Maio de 2021, foi realizado o processo de contratação dos serviços do projecto arquitectónico para a Obra de Construção das Instalações Provisórias de Formação de Seac Pai Van, cuja adjudicação foi concluída em Junho de 2021;

(3) Entre Julho e Agosto de 2021, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais recebeu o projecto arquitectónico e o plano de construção elaborados pela empresa de construção civil, consultadoria e *design*, e foi feita a análise das Obras de Construção das Instalações Provisórias de Formação de Seac Pai Van;

(4) Entre Setembro e Outubro de 2021, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais concluiu a elaboração dos documentos do concurso e apresentou as propostas para a aprovação do projecto. Após a aprovação das propostas pela entidade competente, foram realizados imediatamente os procedimentos de contratação para as Obras de Construção das Instalações Provisórias de Formação de Seac Pai Van;

(5) Em Dezembro de 2021, foram concluídos a adjudicação e o pagamento do adiantamento das obras de construção.

1  
L.  
林  
任  
黃  
亞  
陸



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

13. A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau referiu que, no andamento da execução do projecto da Aquisição de veículos para a execução dos trabalhos de policiamento para a Unidade Especial de Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública "(...) a respectiva viatura foi considerada como viatura com 'dualidade de uso' por parte da autoridade espanhola e não foi permitida a sua exportação (...)". A Comissão solicitou esclarecimentos ao Governo sobre o significado concreto de "dualidade de uso".

14. Resposta do Governo:

Em relação ao projecto 19084 Aquisição de veículos para a execução dos trabalhos de policiamento para a Unidade Especial de Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública, referiu-se que, no andamento da sua execução, "(...) a respectiva viatura foi considerada como viatura com 'dualidade de uso' por parte da autoridade espanhola e não foi permitida a sua exportação (...)". Entende-se por "dualidade de uso" o seguinte:

De acordo com a carta da fornecedora, a viatura dotada de canhão de água adquirida pela Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau foi considerada como viatura com "dualidade de uso" por parte da autoridade espanhola, ou seja, pode-se utilizar a viatura respeitante como arma, razão pela qual não foi permitida a sua exportação. Esta Direcção dos Serviços ia adquirir

1  
L  
星  
林  
9  
黃  
亞  
亞



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

a viatura visada para fins de “controlo de motim”. No entanto, a autoridade espanhola considerou que a mesma poderia servir de “arma”. A União Europeia fez um ajustamento relativo à exportação de armas e produtos sensíveis pertinentes.

15. A Comissão solicitou esclarecimentos ao Governo sobre o actual conteúdo detalhado do plano, o andamento deste e o ponto de situação dos três projectos relacionados com a Empreitada de construção de habitação pública na Avenida Wai Long, constante do relatório da execução orçamental do PIDDA do 4.º trimestre, nomeadamente, a Empreitada de construção do Edifício de Equipamentos Públicos na Avenida Wai Long da Taipa, a Empreitada de construção de habitação pública na Avenida Wai Long e a 1.ª fase da construção de habitação pública na Avenida Wai Long.

16. Resposta do Governo:

- (I) 18004 Empreitada de construção de habitação pública na Avenida Wai Long  
(Direcção dos Serviços de Obras Públicas)

Suspensão temporária da obra devido à possibilidade de alteração no plano geral.

1  
L  
林  
能  
書  
子  
子



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(II) 19001 Empreitada de construção do Edifício de Equipamentos Públicos na Avenida Wai Long da Taipa (Direcção dos Serviços de Obras Públicas)

Em relação à empreitada de construção de habitações públicas na Avenida Wai Long, deu-se início de forma progressiva aos trabalhos de concepção relativos à 1.ª fase das habitações públicas, ao edifício das instalações públicas, às infra-estruturas viárias, etc., e ao mesmo tempo deu-se início ainda às obras de concepção e construção do ordenamento dos taludes. Neste momento, após o início da construção das habitações públicas nos 8 lotes situados na Zona A, iniciar-se-ão progressivamente os trabalhos de construção referentes às restantes parcelas no período compreendido entre 2022 e 2024 conforme o calendário do planeamento, portanto, o Governo da RAEM ponderará novamente sobre o planeamento da construção no lote situado na Avenida Wai Long e foram efectuados ajustamentos nos respectivos trabalhos já iniciados, entre os quais, os trabalhos de concepção das habitações públicas da 1.ª fase foram suspensos. A par disso, no que concerne aos trabalhos de concepção do edifício, as instalações públicas já estão na última fase de concepção e prevê-se que a sua conclusão seja no 4.º trimestre de 2021. Relativamente à obra de concepção e construção do ordenamento dos taludes, esta ficará concluída no 2.º trimestre de 2022.

羅長  
梁林  
龍  
黃  
張



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Em relação ao cabimento da verba, esta é destinada ao custo da elaboração do projecto de execução das instalações e foi previsto, inicialmente, que a mesma esteja concluída e que o pagamento seja efectuado em 2021, contudo, dado que foi iniciado o procedimento sancionatório devido a atraso nos trabalhos de concepção, ainda não estão reunidas condições para o pagamento da verba.

(III) 19019 1.ª fase da construção de habitação pública na Avenida Wai Long  
(Instituto de Habitação)

De acordo com as informações apresentadas pela Direcção dos Serviços de Obras Públicas, o contrato do referido projecto foi rescindido e o mesmo encontra-se temporariamente suspenso.

17. A Comissão pretendeu saber dos 27 projectos cancelados no orçamento do PIDDA do 4.º trimestre, que projectos vão ser reiniciados em 2022 ou nos anos seguintes, bem como os que deixam de ser realizados e quais os motivos da sua não realização.

18. Resposta do Governo:

梁林光



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Dos 27 projectos cancelados, alguns já têm verbas de cabimentação inscritas no orçamento do PIDDA de 2022, e os restantes que não têm verbas de cabimentação inscritas são os seguintes:

- (I) 11007 Estudo do plano urbano de Seac Pai Van (Direcção dos Serviços de Obras Públicas)

Neste momento, o referido projecto já está concluído.

- (II) 19064 Prevenção e combate inteligente a incêndios (Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau)

A adjudicação não foi efectuada em 2021, uma vez que as propostas não reuniram os requisitos exigidos, por isso, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau teve de voltar a abordar e a definir os requisitos técnicos aludidos, em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Prevê-se que, na segunda metade do corrente ano, sejam concretizados o estudo e o plano específico de construção em relação ao projecto de Prevenção e combate inteligente a incêndios, e que seja iniciado o procedimento de consulta em tempo oportuno, estando assim previsto que se possa concluir a vistoria e efectuar o pagamento até ao final de 2023. Assim, na elaboração da proposta

羅  
林  
林  
林  
林  
林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

de orçamento para o ano financeiro de 2023, serão contabilizadas as respectivas despesas orçamentais.

(III) 20024 Escola superior inteligente (Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau)

A adjudicação não foi efectuada em 2021, uma vez que as propostas não reuniram os requisitos exigidos, por isso, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau teve de voltar a abordar e a definir os requisitos técnicos aludidos, em conjunto com a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau. Prevê-se que, na segunda metade do corrente ano, sejam concretizados o estudo e o plano específico de construção em relação ao projecto da Escola Superior Inteligente, e que seja iniciado oportunamente o procedimento de consulta, estando assim previsto que se possa finalizar a vistoria e efectuar o pagamento até ao final de 2023. Assim, na elaboração da proposta de orçamento para o ano financeiro de 2023, serão contabilizadas as respectivas despesas orçamentais.

(IV) 19076 Acréscimo de equipamentos para inspecção fronteira integral no Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau)

1  
梁  
林  
紀  
青  
孫  
江



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Conforme consta do ofício da Administração do Comércio de Zhuhai, de 21 de Dezembro de 2020, em resultado da difícil situação actualmente enfrentada, tanto a nível nacional como internacional, com a prevenção e controlo da epidemia, registou-se um reduzido fluxo de passageiros em vários postos fronteiriços de Zhuhai e de Macau, designadamente, nos postos fronteiriços da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, estando longe de se atingir o número desejado, razão pela qual se planeia a suspensão do plano de reforço de passagens automáticas no âmbito do modelo de inspecção fronteiriça integral no Canal Zhuhai-Macau dos postos fronteiriços da Ponte. Neste contexto, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, previsivelmente, não dará início ao projecto em causa durante a epidemia. Por outro lado, prevê-se que a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau só possa concretizar o plano de aquisição e pedir de novo o orçamento alusivo aos canais de passagem automática depois de controlada ou atenuada a situação da epidemia, e após finalizadas as negociações entre as partes de Zhuhai e de Macau.

- (V) 20056 Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau e do Posto Fronteiriço de Hengqin (primeira fase) (Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau)

1  
7  
星  
林  
能  
景  
研  
27



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

No 1.º trimestre de 2022, o prestador de serviços de medição de materiais/trabalhos apontou que a parte de Hengqin tinha apresentado mais uma opinião complementar em relação ao valor de liquidação confirmado em Novembro de 2021, razão pela qual era preciso tempo para negociação, assim, ainda não foi finalizado o procedimento de liquidação do primeiro trimestre de 2022. Além disso, prevê-se que a liquidação final e o pagamento respeitantes ao projecto em causa sejam concluídos em 2022 e, face ao exposto, é necessário acompanhar junto da Direcção dos Serviços de Finanças o procedimento relativo ao reforço da dotação orçamental respeitante, após a confirmação do valor respectivo.

(VI) 19017 Empreitada de construção de habitação pública no lote B5 da Zona  
A dos Novos Aterros (Instituto de Habitação)

De acordo com as informações apresentadas pela Direcção dos Serviços de Obras Públicas, o contrato do referido projecto foi rescindido e o mesmo encontra-se temporariamente suspenso.

(VII) 19049 Empreitada de construção de habitação pública no lote B1 da Zona  
A dos Novos Aterros (Instituto de Habitação)



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

De acordo com as informações apresentadas pela Direcção dos Serviços de Obras Públicas, o contrato do referido projecto foi rescindido e o mesmo encontra-se temporariamente suspenso.

(VIII) 20031 Empreitada de construção de habitação pública no lote B14 da Zona A dos Novos Aterros (Instituto de Habitação)

De acordo com as informações apresentadas pela Direcção dos Serviços de Obras Públicas, o referido projecto encontra-se temporariamente suspenso.

(IX) 14027 Remodelação da sala de ensaios da Orquestra Chinesa de Macau (Instituto Cultural)

Segundo o despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 17 de Novembro de 2014, foi autorizada a adjudicação do Plano de Prestação de Serviços de Arquitectura, Estrutura, Electricidade, Instalações Electromecânicas e Ar Condicionado, Águas e Drenagens e Sistemas de Prevenção Contra Incêndios e Acústica nas Instalações Sitas no E r/c do Edifício Nam Fong, na Avenida da Amizade, n.º 985-1057C, pelo preço global de 558 000 patacas. A forma de pagamento destes serviços consistiria em pagar a primeira prestação no montante equivalente a 80% do preço global apresentado pela empresa, ou seja, 446 400 patacas, a qual seria paga após a

1  
羅  
星  
林  
仁  
貴  
海  
江



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

conclusão da aprovação do Plano pela entidade de obras públicas (esta prestação foi paga em 2014), seguida da segunda prestação no montante equivalente a 20% do preço global apresentado, ou seja, 111 600 patacas, a qual seria paga após a conclusão das obras e da prestação de apoio técnico *in loco* para a execução das mesmas. Devido ao reajustamento significativo do posicionamento no mercado e do rumo de desenvolvimento da Orquestra Chinesa de Macau, após uma ponderação detalhada, decidiu-se cancelar as obras das instalações sitas no E r/c do Edifício Nam Fong, na Avenida da Amizade, n.º 985-1057C, pelo que o referido projecto não será iniciado.

(X) 17083 Obras de modificação da estação de autocarros e auto-silo da Praça de Ferreira do Amaral (Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego)

As razões principais são as seguintes: tendo em conta que no referido parque de estacionamento se registaram inundações provocadas pelas chuvas intensas e que a obra em causa se deveu à modificação da estrutura original, os sistemas de drenagem e bombagem não podem ser alvo de modificações na estrutura existente, aliado ao facto de as obras de alteração da plataforma de autocarros no rés-do-chão já terem sido concluídas, considerando a segurança dos utilizadores e o uso adequado do erário público, as obras foram canceladas.

1  
L.  
林  
任  
黃  
A  
S



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(XI) 19062 Correção inteligente (Direcção dos Serviços Correccionais)

Devido à acção das Obras do sistema de baixa tensão e do sistema informático do novo estabelecimento prisional - 4.ª fase, já existe uma plataforma de gestão uniformizada, que inclui o desenvolvimento dos dois programas Sistema de avaliação de risco dos reclusos e Sistema de avaliação sintética dos reclusos do Sistema de supervisão e controlo prisional inteligente 3.0. Após a análise e a avaliação sintetizada da Direcção dos Serviços Correccionais em Novembro de 2020, para um melhor aproveitamento do dinheiro público, foi autorizado pelo Secretário para a Segurança, em 19 de Novembro de 2020, o cancelamento do desenvolvimento dos referidos dois programas do Sistema de supervisão e controlo prisional inteligente 3.0 da Acção Correção inteligente. Uma vez que o referido orçamento já foi transferido para a Direcção dos Serviços de Finanças, após a aprovação do Secretário para a Segurança em Outubro de 2020, o respectivo orçamento não foi ajustado oportunamente.

A revisão do orçamento do PIDDA referente ao ano de 2021, apresentada pela Direcção dos Serviços Correccionais em Outubro de 2021, após a dedução do valor do orçamento, é de zero e, ao mesmo tempo, prevê-se que, no Plano de Policiamento inteligente em nuvem, não haja necessidade de desenvolver esta acção entre os anos de 2022 e 2023, pelo que se torna desnecessária a respectiva reserva orçamental.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "梁林能" and the number "73".



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(XII) 21014 Direcção dos Serviços Correccionais – Obras de alteração da zona prisional masculina (Direcção dos Serviços Correccionais)

Devido ao impacto da pandemia, o aumento da população reclusa foi reduzido e, por outro lado, em consideração à construção do novo estabelecimento prisional e à previsão da sua entrada em funcionamento em breve, a fim de melhor aproveitamento do dinheiro público, após a revisão da Direcção dos Serviços Correccionais em Novembro de 2020, foi autorizado pelo respectivo director, em 27 de Novembro de 2020, o cancelamento das Obras de alteração das áreas da zona prisional masculina, mas, uma vez que o orçamento de 2021 só foi submetido à aprovação do Secretário para a Segurança e transferido para a Direcção dos Serviços de Finanças em Outubro de 2020, não foi possível ajustá-lo atempadamente.

A revisão do orçamento do PIDDA referente ao ano de 2021, apresentada pela Direcção dos Serviços Correccionais em Outubro de 2021, após a dedução do valor do orçamento, é de zero e, ao mesmo tempo, prevê-se que não haja necessidade de desenvolver esta acção no ano de 2022 e nos anos seguintes, pelo que se torna desnecessária a respectiva reserva orçamental.

(XIII) 18027 Direcção dos Serviços Correccionais – Obras de melhoramento do sistema de electricidade (Direcção dos Serviços Correccionais)

1  
畢  
上  
畢  
林  
能  
黃  
張  
張



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

O procedimento de avaliação das propostas orçamentais foi levado a cabo pela Direcção dos Serviços Correccionais em 19 de Maio de 2020, por motivo de se ter descoberto neste procedimento que as propostas orçamentais recebidas com os montantes gerais excediam significativamente o valor original previsto por esta Direcção de Serviços, portanto, para reflectir com maior precisão o preço actual de mercado, esta Direcção de Serviços necessitava de redefinir o conteúdo das descrições das obras de melhoramento do sistema de electricidade e de estimular de novo o preço previsto para este projecto, por isso, em Junho de 2020, esta Direcção de Serviços submeteu a proposta para o cancelamento da respectiva adjudicação directa, que foi autorizada em 13 de Julho de 2020.

Antes, foi feita a previsão de que, após a revisão das necessidades de electricidade e de redefinição do conteúdo das descrições das respectivas obras, iria ser de novo submetida a proposta para se reiniciar o procedimento de aquisição das respectivas obras.

Entre Julho e Novembro de 2020 – durante a preparação das Obras de melhoramento do sistema de electricidade, verificou-se que, no âmbito de uma outra acção do PIDDA - Obras de alteração das áreas da zona prisional masculina, houve uma tendência de alívio do aumento dos reclusos devido à epidemia e, por outro lado, considerando a construção do novo estabelecimento

Handwritten notes in Chinese characters on the right margin, including the name '林' (Lin) and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

prisional e a previsão da sua entrada em funcionamento em 2024, para responder aos princípios de fazer bom uso dos recursos limitados e controlar rigorosamente as despesas do Governo da RAEM, foi autorizado o cancelamento das Obras de alteração das áreas da zona prisional masculina pelo director respectivo, em 27 de Novembro de 2020.

O cancelamento das Obras de alteração das áreas da zona prisional masculina causou a redução significativa das necessidades de equipamentos e instalações do sistema de electricidade, pelo que, durante o período de preparação das Obras de melhoramento do sistema de electricidade, após avaliação, verificou-se que o actual sistema de electricidade do Estabelecimento Prisional pode manter o normal funcionamento e, com a previsão da entrada em funcionamento do novo estabelecimento prisional em 2024, não é necessária a instalação de um sistema de electricidade adicional. Para responder aos princípios de fazer bom uso dos recursos limitados e controlar rigorosamente as despesas do Governo da RAEM, a Direcção dos Serviços Correccionais decidiu cancelar esta acção, mas, devido ao orçamento de 2021 ter sido submetido à aprovação do Secretário para a Segurança e transferido para a Direcção dos Serviços de Finanças em Outubro de 2020, não foi possível ajustar atempadamente o referido orçamento.

梁林  
梁林  
梁林  
梁林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

A revisão do orçamento do PIDDA referente ao ano de 2021, apresentada pela Direcção dos Serviços Correccionais em Outubro de 2021, após a dedução do valor do orçamento, é de zero e, ao mesmo tempo, prevê-se que não haja necessidade de desenvolver esta acção no ano de 2022 e nos anos posteriores, pelo que se torna desnecessária a respectiva reserva orçamental.

(XIV) 21025 Obra de construção da zona de lazer no lote CN2C em Coloane  
(Instituto para os Assuntos Municipais)

Planeava-se aproveitar o lote CN2C para a construção de um espaço de lazer. Porém, de acordo com o Plano Director da RAEM (2020-2040), aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 7/2022, a finalidade do lote foi alterada para zona habitacional, pelo que este projecto deixa de ser iniciado em 2022.

(XV) 21026 Obra de construção do parque desportivo no troço leste do kartódromo (Instituto para os Assuntos Municipais)

Com vista a evitar que as obras em curso possam afectar a segurança e comodidade da travessia pedonal em redor, é necessário proceder ao planeamento geral do projecto da obra; por outro lado, a construção da zona de lazer junto do Reservatório de Seac Pai Van (1.ª fase), pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, já foi concluída. Tendo em



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

conta a semelhança no conteúdo e a funcionalidade das duas obras referidas, após considerações integradas, decidiu-se suspender o plano de trabalho da primeira. Assim sendo, não serão iniciados em 2022 os trabalhos relativos a este projecto.

(XVI) 21027 Obra de construção do campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá (Instituto para os Assuntos Municipais)

Devido à grande dimensão e à ampla cobertura deste projecto, à epidemia e à situação do ambiente económico, e ainda em articulação com o plano de desenvolvimento a longo prazo deste terreno, foi suspenso o projecto original e, simultaneamente, acelerou-se o ritmo dos trabalhos de construção do Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac-Sá, a fim de fornecer instalações complementares mais abrangentes, que correspondessem mais às políticas juvenis. Tendo em conta as necessidades temporais em termos de construção, para o aproveitamento eficaz do terreno, este foi transformado num estabelecimento de lazer, tendo sido concluída a construção de algumas infra-estruturas, que podem ser disponibilizadas em primeira instância para uso público. O trabalho geral de construção do Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac-Sá terá continuação em 2022.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

(XVII) Os 11 projectos reinscritos no orçamento do PIDDA de 2022 são os seguintes:

<b>Serviço</b>	<b>Designação do projecto</b>
Instituto Cultural	Concepção e obras de construção da nova Biblioteca Central de Macau
Instituto para os Assuntos Municipais	Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen
Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de pavimentação com asfalto na Praça das Portas do Cerco, no Bairro Iao Hon, na Avenida do Governador Jaime Silvério Marques e arruamentos envolventes
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Trem naval da DSAMA - Barco de sondagem
Serviços de Saúde	Obras de melhoramento das instalações de Centro Hospitalar Conde de S. Januário
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Aquisição de veículos para a execução dos trabalhos de policiamento para a Unidade Especial de Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Garantia inteligente
Serviços de Alfândega da RAEM	Serviços de alfândega inteligentes
Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente
Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente
Instituto do Desporto	Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estádio de Atletas

1  
L.  
早  
林  
E  
A  
K



### III. ANÁLISE FINANCEIRA

#### Situação da execução orçamental do PIDDA no 4.º trimestre de 2021

19. O orçamento inicial do PIDDA de 2021 foi de 18,51 mil milhões de patacas<sup>1</sup>, e o orçamento autorizado foi de 14,08 mil milhões de patacas, registando-se uma redução de 4,43 mil milhões de patacas. A despesa efectiva foi de 13,89 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 98,6%, o valor da cabimentação foi de 14,04 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 99,7%. Quanto à situação da execução orçamental dos respectivos organismos, *vide* o Anexo II a este relatório.

20. Até ao 4.º trimestre, o orçamento autorizado do PIDDA foi de 14,08 mil milhões de patacas, representando uma redução de 4,5 mil milhões de patacas, face aos 18,58 mil milhões de patacas registados no 3.º trimestre. De acordo com a proposta de alteração à Lei do Orçamento de 2021 (3.ª alteração orçamental), apresentada pelo Governo à Assembleia Legislativa, em Novembro de 2021, esta redução deve-se às anulações orçamentais do PIDDA, no valor de 4,5 mil milhões de patacas.

<sup>1</sup> Os valores referenciados na parte da análise financeira têm como unidade monetária a Pataca.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical mark and several illegible signatures.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

21. Até ao 4.º trimestre, a despesa efectiva anual atingiu 13,89 mil milhões de patacas, e a despesa efectiva só no 4.º trimestre atingiu 5,26 mil milhões de patacas, representando 37,8% do total da despesa efectiva anual.

milhões de patacas

	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Projectos
4.º trimestre	14 083	13 888	14 037	98,6%	99,7%	253
3.º trimestre	18 584	8 632	14 781	46,4%	79,5%	273
Variação	-4 501	5 256	-743	52,2%	20,1%	-20

\* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

22. Além disso, é de salientar que o valor de cabimentação do 4.º trimestre diminuiu cerca de 740 milhões de patacas em relação ao 3.º trimestre, o que reflecte que, das anulações orçamentais do PIDDA, no valor de 4,5 mil milhões de patacas, efectuadas pelo Governo, uma parte do orçamento destinava-se ao pagamento dos projectos adjudicados e das despesas dos compromissos assumidos, mas os respectivos planos de pagamento acabaram por ser cancelados. A Comissão deu atenção às razões que levaram à referida alteração, pelo que solicitou esclarecimentos ao Governo sobre os motivos que levaram à redução do valor da cabimentação. Quanto à resposta do Governo, *vide* o ponto 9 do presente relatório.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

23. No 4.º trimestre, registou-se um total de 253 projectos do PIDDA, uma redução de 20 projectos em comparação com os 273 registados no 3.º trimestre, dos quais 7 são projectos novos, tendo sido cancelados 27. Desses 7 projectos novos, 3 são projectos antigos que foram inscritos em 2020 ou até antes, e os restantes 4 foram recém-criados no 4.º trimestre de 2021:

**Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes <sup>2</sup>**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Obra de planeamento da urbanização de Seac Pai Van, Coloane	452 250,00	Projecto antigo	175 259 177,28	2010-03 2022-06
Construção de dois túneis subaquáticos adjacentes às partes laterais da Ponte General Nobre de Carvalho	7 445 250,00	Projecto antigo	106 715 300,00	2018-12 2025-12

**Universidade de Macau**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Residência de docentes e funcionários S35 da Universidade de Macau	2 323 988,80	Projecto antigo	50 895 266,80	2019-01 2022-12

<sup>2</sup> Actual Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Direcção dos Serviços de Finanças**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Finanças inteligentes	38 472 000,00	Projecto novo	96 180 000,00	2021-07 2024-12

**Serviços de Saúde**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Obras de remodelação do 19.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao	6 000 000,00	Projecto novo	23 369 990,00	2021-11 2022-12

**Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Obras de construção das instalações de tratamento para remoção de óleos por flotação e por ar dissolvido - ETAR da Taipa	17 308 186,00	Projecto novo	25 867 186,00	2021-12 2022-08

**Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais**

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/fim
Projecto da obra de construção das instalações provisórias de formação de Seac Pai Van	4 000 000,00	Projecto novo	23 639 244,00	2021-11 2022-12

1  
羅  
林  
能  
黃  
亞  
丹



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

24. Considerando que os referidos 7 projectos foram inscritos no 4.º trimestre de 2021, a Comissão solicitou ao Governo esclarecimentos sobre as razões que levaram à sua inscrição. Quanto à resposta do Governo, *vide* o ponto 11 do presente relatório.

25. Por outro lado, no 4.º trimestre de 2021 foram cancelados os seguintes 27 projectos:

**Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes**

Designação do projecto	3.º trimestre Orçamento autorizado
Estudo do plano urbano de Seac Pai Van	368 500,00

**Instituto Cultural**

Remodelação da sala de ensaios da Orquestra Chinesa de Macau	112 000,00
Concepção e obras de construção da nova Biblioteca Central de Macau	27 662 000,00

**Instituto para os Assuntos Municipais**

Obras de melhoramento geral do Parque Municipal Dr. Sun Yat Sen	4 000 000,00
Obra de construção da zona de lazer no lote CN2C em Coloane	13 750 000,00
Obra de construção do parque desportivo no troço leste do kartódromo	10 500 000,00
Obra de construção do campo de bicicletas de montanha e quadriciclos para crianças em Hac-Sá	20 862 000,00
Obra de pavimentação com asfalto na Praça das Portas do Cerco, no Bairro Iao Hon, na Avenida do Governador Jaime Silvério Marques e arruamentos envolventes	7 000 000,00

Handwritten signature: 譚卓榮  
Handwritten signature: 林  
Handwritten signature: 陸  
Handwritten signature: 承  
Handwritten signature: 陸



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego**

Obras de modificação da estação de autocarros e auto-silo da Praça de Ferreira do Amaral	28 000 000,00
--	---------------

**Instituto de Habitação**

Empreitada de construção de habitação pública no lote B5 da Zona A dos Novos Aterros	310 800,00
--	------------

Empreitada de construção de habitação pública no lote B1 da Zona A dos Novos Aterros	938 000,00
--	------------

Empreitada de construção de habitação pública no lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	2 537 000,00
---	--------------

**Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água**

Trem naval da DSAMA - Barco de sondagem	654 000,00
---	------------

**Serviços de Saúde**

Obras de melhoramento das instalações do Centro Hospitalar Conde de S. Januário	18 363 800,00
---	---------------

**Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau**

Garantia inteligente	199 990 000,00
----------------------	----------------

Prevenção e combate inteligente a incêndios	7 572 700,00
---	--------------

Acréscimo de equipamentos para inspecção fronteiriça integral no Posto de Migração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	23 000 000,00
--	---------------

Aquisição de veículos para a execução dos trabalhos de policiamento para a Unidade Especial de Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública	7 388 900,00
---	--------------

Escola superior inteligente	8 500 000,00
-----------------------------	--------------

Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau e do Posto Fronteiriço de Hengqin (primeira fase)	160 580 000,00
--	----------------

1 羅 七  
吳 林  
江 華  
陳 冠  
陳 冠



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

**Serviços de Alfândega da RAEM**

Serviços de alfândega inteligentes 41 410 500,00

**Direcção dos Serviços Correccionais**

Direcção dos Serviços Correccionais - Obras de  
melhoramento do sistema de electricidade 9 000 000,00

Correcção inteligente 12 627 900,00

Direcção dos Serviços Correccionais – Obras de  
alteração da zona prisional masculina 11 600 000,00

**Serviços de Polícia Unitários**

Protecção civil inteligente 22 000 000,00

Vida da população inteligente 10 000 000,00

**Instituto do Desporto**

Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de  
Atletas 4 888 100,00

26. Dos referidos 27 projectos cancelados, as razões de cancelamento de 21 deles, que já constavam dos relatórios da execução orçamental do PIDDA do 1.º até ao 3.º trimestres, apresentados pelo Governo, foram expostas na reunião em sede da Comissão. Em relação aos restantes 6 projectos, os esclarecimentos sobre as razões do cancelamento também constam do relatório de execução orçamental do PIDDA do 4.º trimestre apresentado pelo Governo. Os referidos 6 projectos são os seguintes:

1  
梁林  
任  
黃  
區  
區



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

1  
L.  
梁林  
任  
青  
承  
承  
承

Serviço proponente	Designação do projecto
Instituto Cultural	Concepção e obras de construção da nova Biblioteca Central de Macau
Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de pavimentação com asfalto na Praça das Portas do Cerco, no Bairro Iao Hon, na Avenida do Governador Jaime Silvério Marques e arruamentos envolventes
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Trem naval da DSAMA - Barco de sondagem
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Aquisição de veículos para a execução dos trabalhos de policiamento para a Unidade Especial de Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Informatização da Zona do Posto Fronteiriço de Macau e do Posto Fronteiriço Hengqin (primeira fase)
Instituto do Desporto	Edifício de Apoio ao Centro de Formação e Estágio de Atletas

27. Tendo em conta que, no passado, os projectos cancelados eram reinscritos no ano seguinte, para um melhor acompanhamento da execução desses projectos, a Comissão solicitou ao Governo informações sobre os que foram inscritos, novamente, no orçamento para o ano económico de 2022. Quanto à resposta do Governo, *vide* o ponto 18 do presente relatório.

28. No 4.º trimestre de 2021, existiam apenas 7 projectos (*vide* o Anexo III) com uma taxa de utilização orçamental de zero, envolvendo um orçamento autorizado de 6 milhões 925 mil patacas, menos 43 projectos do que no 3.º trimestre, devido sobretudo ao cancelamento de 27 projectos no 4.º trimestre e



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

1  
L.  
林  
林  
林  
林  
林

à não contabilização dos projectos com uma taxa de utilização orçamental de zero:

Serviço proponente	3.º trimestre	4.º trimestre
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	4	2
Instituto Cultural	2	
Polícia Judiciária	2	
Instituto para os Assuntos Municipais	11	1
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1	
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	1	
Instituto de Habitação	4	1
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1	
Direcção dos Serviços de Finanças	1	
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	1	
Gabinete de Comunicação Social	1	
Serviços de Saúde	2	1
Universidade de Macau	4	2
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5	
Serviços de Alfândega da RAEM	2	
Instituto Politécnico de Macau	1	
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1	
Direcção dos Serviços Correccionais	3	
Serviços de Polícia Unitários	2	
Instituto do Desporto	1	
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>7</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

29. O orçamento autorizado do PIDDA do 4.º trimestre de 2021 aumentou 2,49 mil milhões de patacas em comparação com o período homólogo de 2020, a taxa de execução orçamental aumentou 2,8% face a 2020, e a despesa efectiva foi de 13,89 mil milhões de patacas, aumentando 2,77 mil milhões de patacas face a 2020. Em relação aos projectos, registaram-se 253 projectos em 2021 e 238 projectos em 2020.

milhões de patacas

	<b>Orçamento autorizado</b>	<b>Despesa efectiva</b>	<b>Valor da cabimentação</b>	<b>Taxa de execução orçamental</b>	<b>Taxa de utilização orçamental</b>	<b>Projectos</b>
2021	14 083	13 888	14 037	98,6%	99,7%	253
2020	11 597	11 113	11 307	95,8%	97,5%	238
Variação	2 486	2 774	2 730	2,8%	2,2%	15

\* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

30. A taxa de execução orçamental do PIDDA de 2021 bateu o recorde registado desde 2020, devido ao elevado valor da despesa efectiva, e também à 3.ª alteração orçamental, que o Governo submeteu à apreciação da Assembleia Legislativa em 2021, onde foram propostas anulações orçamentais do PIDDA de 2021 no valor de 4,5 mil milhões de patacas.

31. Estabelecendo uma comparação com o orçamento inicial, até ao 4.º trimestre de 2021, registou-se uma redução no orçamento autorizado da maioria dos



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

serviços proponentes. Os seguintes serviços proponentes até registaram uma redução orçamental num valor superior a 100 milhões de patacas.

milhões de patacas

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Diferença	Variação orçamental
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6 559	5 501	(1 058)	-16,1%
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1 416	780	(635)	-44,9%
Serviços de Saúde	3 786	3 298	(488)	-12,9%
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780	317	(463)	-59,3%
Direcção dos Serviços de Finanças	675	215	(461)	-68,2%
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1 543	1 237	(306)	-19,8%
Direcção dos Serviços Correccionais	396	176	(220)	-55,6%
Instituto para os Assuntos Municipais	343	151	(192)	-56,0%
Instituto Politécnico de Macau <sup>3</sup>	184	45	(139)	-75,4%
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	223	119	(104)	-46,7%

\* Devido aos arredondamentos, os valores podem variar ligeiramente.

<sup>3</sup> Actual Universidade Politécnica de Macau



#### IV. OPINIÕES E SUGESTÕES

32. As taxas de execução e utilização orçamental do PIDDA de 2021 foram, respectivamente, de 98,6% e 99,7%, representando uma subida em relação ao ano de 2020, nomeadamente, a despesa efectiva, que atingiu 13,88 mil milhões de patacas, aumentou 2,77 mil milhões de patacas, face aos 11,11 mil milhões de patacas registados no mesmo período do ano de 2020, o que demonstra que o Governo tem promovido activamente a execução dos trabalhos respectivos, facto que foi reconhecido pela Comissão.

33. No entanto, de acordo com as informações fornecidas pelo Governo, verifica-se que o andamento da execução de alguns projectos ainda não é satisfatório, por exemplo: o projecto da quarta ponte Macau-Taipa, o projecto de construção da superestrutura do Edifício do Hospital, do Edifício de Apoio Logístico e do Edifício de Administração e Multi-Usos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, e o projecto das obras de construção do Estabelecimento Prisional de Macau, em que se registaram atrasos significativos no progresso da execução, nomeadamente, o projecto das obras de construção do Estabelecimento Prisional de Macau, que foi criado há muitos anos e registou vários atrasos. A Comissão pediu à assessoria para organizar as informações relativas ao projecto, a fim de serem analisadas e discutidas pormenorizadamente pela Comissão, com vista a decidir se o referido projecto deve ser objecto de acompanhamento exclusivo.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

34. Para além disso, no ano de 2021, foi cancelada a execução de 27 projectos e, apesar de o Governo ter prestado os devidos esclarecimentos, a Comissão entendeu que, se tivesse sido feita uma avaliação mais rigorosa sobre a viabilidade de cada projecto, aquando da criação do projecto ou da elaboração do orçamento, teria sido possível reduzir o surgimento das referidas situações.
35. A Comissão vai dar continuidade ao acompanhamento da execução do PIDDA.

## V. CONCLUSÕES

36. A Comissão conclui o seguinte:

- (1) Entregar o presente relatório ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e propor a sua distribuição a todos os Deputados;
- (2) Enviar o presente relatório ao Governo da RAEM.

Macau, aos 15 de Agosto de 2022

梁林  
任  
再  
强



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

A Comissão,

Wong Kit Cheng

(Presidente)

Ip Sio Kai

(Secretário)

Chan Chak Mo

Iau Teng Pio

Pang Chuan

Lam Lon Wai

1  
7  
2  
3



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

梁鴻細

Leong Hong Sai

張健中

Cheung Kin Chung

羅彩燕

Lo Choi In

李龍王

Lei Leong Wong

林  
任  
貴  
友

**ANEXO I**

**PLANO DE INVESTIMENTOS E**

**DESPESAS DE**

**DESENVOLVIMENTO DA**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO**

**ORÇAMENTAL NO 4.º TRIMESTRE**

**DO ANO ECONÓMICO DE 2021**

廖  
七  
星  
林  
能  
青  
海

# **Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração**

## **Relatório da Execução Orçamental no 4.º trimestre do ano económico de 2021**



Fevereiro 2022

DSF

Página em branco

# Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 4.º trimestre do ano de 2021.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito ou por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de diversos projectos, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

## Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2021, cifrou-se em 18 510,89 milhões de patacas que, posteriormente, através da Lei n.º 18/2021 que alterou a Lei do Orçamento de 2021, houve uma redução em 4 549,47 milhões de patacas, e com um outro valor em 121,83 milhões de patacas reforçado através da dotação orçamental, até ao 4.º trimestre do ano em apreço, o orçamento autorizado foi de 14 083,24 milhões de patacas, e a despesa efectiva de 13 887,51 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 98,6%<sup>1</sup>, quanto às verbas cabimentadas, cifraram-se em 14 037,40 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 99,7%<sup>2</sup>.

Em termos de programas, o da “Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 3 011,69 milhões de patacas e uma despesa efectiva no de 3 005,18 milhões de patacas; sendo, no qual, incluído o “Edifício do Hospital Geral, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 2 665,99 milhões de patacas, da despesa efectiva de 2 664,55 milhões de patacas e do cativo de 2 665,99 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 99,9% e de 100,0%; seguidamente o “Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas”, com um orçamento autorizado no valor de 151,75 milhões de patacas, sendo ambas as taxas de execução

---

<sup>1</sup> Despesa efectiva/ orçamento autorizado

<sup>2</sup> Verbas cabimentadas /orçamento autorizado


orçamental e de utilização orçamental de 100,0%.

Em termos orgânicos, o Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 5 500,93 milhões de patacas, perfazendo 39,1% do orçamento total, com as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 98,0% e 99,7%; de seguida, foram os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, o orçamento autorizado dos Serviços de Saúde situou-se em 3 298,29 milhões de patacas, representando 23,4% do orçamento total, bem como 99,8% e 99,9% relativos às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental foi de 1 236,90 milhões de patacas, representando 8,8% do orçamento total, e sendo ambas as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 99,7%.

Por classificação económica, a dos “Edifícios e estabelecimentos” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 5 626,95 milhões de patacas, representando 40,0% do orçamento total, bem como 99,0% e 99,6% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos do “Edifício do Hospital Geral, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.ª Fase” e dentre outros; seguindo-se, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação”, com o orçamento autorizado no valor de 3 864,09 milhões de patacas, representando 27,4% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 97,7% e de 99,7% ; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Extensão da Linha do Metro

Ligeiro na Ilha de Hengqin”, da “Quarta ponte Macau - Taipa”, etc.


Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica

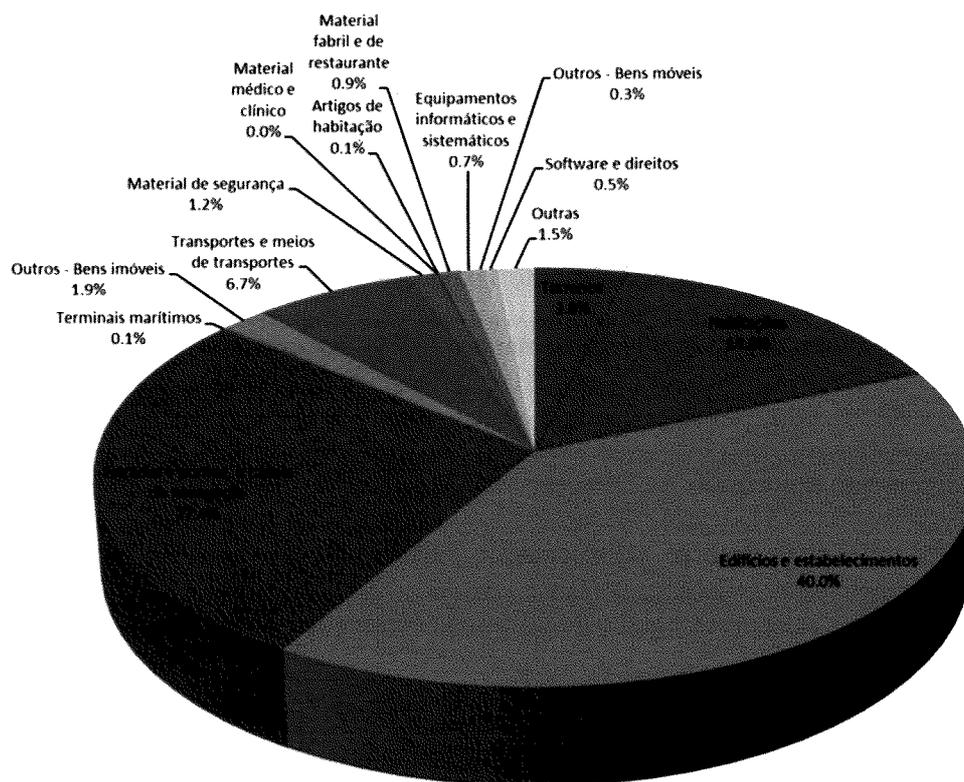

Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, o seu orçamento autorizado foi de 7 025,52 milhões de patacas, registando uma proporção de 49,9% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 98,2% e a de utilização orçamental de 99,7%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, da “Quarta ponte Macau - Taipa”, etc.; seguindo-se a da “Saúde”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 348,82 milhões de patacas, representando 23,8% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 99,8% e de 99,9%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital Geral, Edifício de

Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção de superestrutura”, da “Empreitada de Amplificação do Centro Hospitalar Conde de São Januário”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional

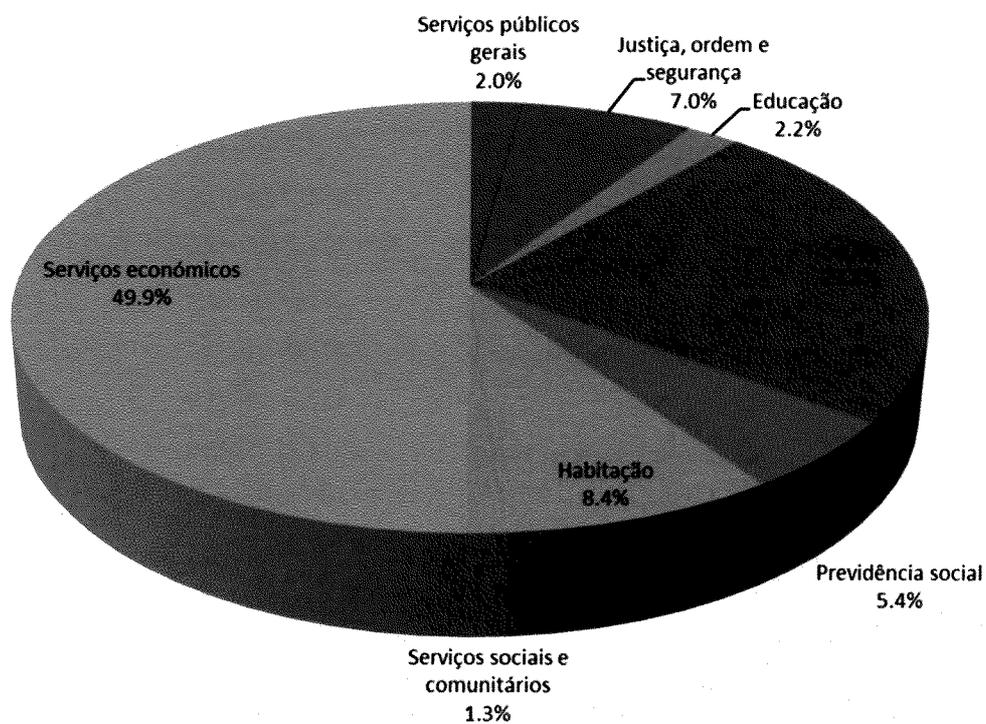

# Por programa

	<b>2021</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 31/12/2021</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Obra de instalações públicas	3,280,209,700.00	2,177,596,500.00
Prog. Sist. Transportes Colectivos Urbanos de Macau	2,619,084,400.00	2,603,928,300.00
Habitação pública	1,892,128,900.00	1,795,675,600.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	3,109,430,200.00	2,122,339,500.00
Programa de aterros	281,457,400.00	219,976,400.00
Programa do novo campus da UM na Ilha de Hengqin	321,007,100.00	257,174,800.00
Obras de instalações de serviços	882,386,200.00	672,066,700.00
Prog. da const. do Terminal Marítimo de Pac On na Taipa	18,257,500.00	17,680,000.00
Equipamento de serviços	178,244,600.00	224,076,500.00
Programa do centro de transportes	26,886,000.00	26,826,700.00
Equipamento de instalações públicas	267,403,000.00	82,317,800.00
Prog. de construção do novo estabelecimento prisional	356,979,400.00	170,816,500.00
Meios de transporte	70,627,600.00	74,219,300.00
Prog. const. do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	3,550,406,300.00	3,011,689,000.00
Serviços de consultadoria para estudo	368,500.00	0.00
Instalações para água	52,752,300.00	51,570,600.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	340,627,000.00	338,792,300.00
Aquisição de Imóveis	0.00	35,879,866.66
Policimento inteligente em nuvem	392,390,600.00	35,781,200.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	870,245,600.00	164,836,100.00
<b>Total</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

# Por programa

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 31/12/2021</b>	<b>Valor cabimentado até 31/12/2021</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
2,153,921,464.63	2,171,828,972.39	98.9	99.7
2,573,517,833.14	2,600,169,282.35	98.8	99.9
1,788,537,777.25	1,790,946,029.75	99.6	99.7
2,062,820,187.17	2,115,113,244.80	97.2	99.7
211,164,114.56	218,982,676.88	96.0	99.5
230,159,195.61	249,655,989.97	89.5	97.1
662,529,461.83	664,910,091.82	98.6	98.9
17,391,278.03	17,581,922.00	98.4	99.4
220,643,433.08	220,643,433.08	98.5	98.5
26,604,720.39	26,826,601.15	99.2	100.0
82,317,696.00	82,317,696.00	100.0	100.0
156,428,480.46	170,816,195.22	91.6	100.0
74,189,255.20	74,189,255.20	100.0	100.0
3,005,179,457.40	3,008,870,148.65	99.8	99.9
0.00	0.00	-	-
51,181,151.66	51,517,151.66	99.2	99.9
338,678,069.42	338,780,589.42	100.0	100.0
35,879,866.66	35,879,866.66	100.0	100.0
35,781,200.00	35,781,200.00	100.0	100.0
160,581,188.23	162,590,502.30	97.4	98.6
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

# Por classificação orgânica

	<b>2021</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 31/12/2021</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Gab. Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67
Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00
Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66
Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	4,000,000.00
Dir. dos Serv. de Solos, Ob. Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	780,388,500.00
Dir. dos Serv. de Administração e Função Pública	72,416,000.00	91,501,900.00
Gabinete de Comunicação Social	0.00	400,000.00
Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	0.00
Dir. dos Serv. para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	189,000.00
Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00
Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00
Dir. dos Serv. das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00
Dir. dos Serv. de Edu. e de Desenv. da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00
Dir. dos Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00
Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00
Serviços de Alfândega da RAEM	210,258,000.00	179,456,400.00
Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00
Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00
Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33
Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00
Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00
Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00
Comissariado da Auditoria	0.00	675,000.00
Gabinete do Procurador do Ministério Público	0.00	1,839,400.00

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2021	Valor cabimentado até 31/12/2021	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
5,391,155,048.38	5,483,568,422.03	98.0	99.7
77,832,243.08	77,832,243.08	96.9	96.9
203,878,186.97	211,600,485.69	95.0	98.6
30,476,157.17	30,481,223.17	100.0	100.0
3,998,244.00	3,998,244.00	100.0	100.0
771,274,496.74	777,003,148.97	98.8	99.6
90,593,590.00	90,593,590.00	99.0	99.0
31,800.00	31,800.00	8.0	8.0
0.00	0.00	-	-
118,681,604.00	118,681,604.00	100.0	100.0
1,232,876,673.13	1,233,427,259.92	99.7	99.7
189,000.00	189,000.00	100.0	100.0
15,799,922.00	16,181,922.00	97.6	100.0
63,031,288.30	63,040,473.00	100.0	100.0
317,072,770.86	317,072,770.86	99.9	99.9
16,907,543.50	16,907,543.50	100.0	100.0
143,009,916.38	143,345,916.38	99.7	99.9
161,435,715.46	175,823,430.22	91.8	100.0
179,451,796.00	179,456,296.00	100.0	100.0
3,291,671,236.15	3,295,505,500.18	99.8	99.9
756,401,157.55	756,407,618.58	100.0	100.0
580,854,975.51	581,636,749.13	99.9	100.0
45,026,890.77	45,027,531.50	99.7	99.7
230,159,195.61	249,655,989.97	89.5	97.1
600,000.00	600,000.00	100.0	100.0
675,000.00	675,000.00	100.0	100.0
1,697,073.40	1,839,400.00	92.3	100.0

## Por classificação orgânica

	<b>2021</b>	<b>Orçamento</b>
	<b>Orçamento</b>	<b>autorizado</b>
	<b>Inicial</b>	<b>até 31/12/2021</b>
	<b>a</b>	<b>b</b>
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	0.00	14,791,100.00
Comissariado contra a Corrupção	0.00	5,133,640.00
Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00
<b>Total</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

# Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 31/12/2021</b>	<b>Valor cabimentado até 31/12/2021</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
12,930,134.60	12,930,134.60	87.4	87.4
4,192,797.70	4,192,797.70	81.7	81.7
145,601,373.46	149,694,754.82	96.5	99.2
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

# Por classificação económica

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/12/2021 b
Terrenos	617,498,100.00	535,754,165.33
Habitacões	2,214,356,000.00	2,086,626,660.04
Edifícios e estabelecimentos	7,354,229,000.00	5,626,948,246.07
Estradas e pontes, e canais de navegação	5,987,341,900.00	3,864,088,684.63
Terminais marítimos	20,720,000.00	17,055,300.00
Outros - Bens imóveis	280,646,000.00	274,280,295.00
Transportes e meios de transportes	582,883,600.00	938,085,182.00
Material de segurança	686,419,300.00	175,645,000.00
Material médico e clínico	53,700,000.00	0.00
Artigos de habitação	2,540,000.00	8,863,030.00
Material fabril e de restaurante	153,727,600.00	126,537,136.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	68,473,400.00	100,391,900.00
Outros - Bens móveis	151,001,600.00	36,150,995.59
Software e direitos	86,000,000.00	75,181,000.00
Outros	251,355,800.00	217,636,072.00
<b>Total</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

# Por classificação económica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2021	Valor cabimentado até 31/12/2021	Taxa de execução orçamental (%) e=c/b	Taxa de utilização orçamental (%) f=d/b
c	d		
526,380,209.59	534,376,353.91	98.3	99.7
2,069,648,373.80	2,080,399,259.87	99.2	99.7
5,568,145,915.22	5,603,926,929.78	99.0	99.6
3,775,725,589.74	3,853,067,832.26	97.7	99.7
16,752,977.41	16,943,621.38	98.2	99.3
273,521,475.58	274,225,029.02	99.7	100.0
937,509,121.20	938,055,069.20	99.9	100.0
173,120,301.18	173,120,301.18	98.6	98.6
0.00	0.00	-	-
8,561,739.60	8,862,971.60	96.6	100.0
117,030,467.10	125,972,712.30	92.5	99.6
100,386,540.40	100,391,606.40	100.0	100.0
33,981,422.00	36,150,817.00	94.0	100.0
75,180,905.00	75,180,905.00	100.0	100.0
211,560,792.90	216,727,440.40	97.2	99.6
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

# Por classificação funcional

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/12/2021 b
<b>1-00 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS</b>	<b>264,764,900.00</b>	<b>286,569,383.71</b>
1-01 Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	264,764,900.00	286,569,383.71
<b>2-00 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA</b>	<b>1,762,270,600.00</b>	<b>991,296,193.00</b>
2-01 Comando	65,447,200.00	64,035,656.00
2-02 Polícia e alfândega	1,085,008,900.00	607,912,402.00
2-03 Bombeiros	48,372,400.00	40,969,195.00
2-04 Protecção civil	32,000,000.00	0.00
2-05 Justiça e ordem	135,494,800.00	102,555,140.00
2-06 Correção	395,947,300.00	175,823,800.00
<b>3-00 EDUCAÇÃO</b>	<b>514,952,700.00</b>	<b>306,944,900.00</b>
3-02 Ensino	514,952,700.00	302,944,900.00
3-03 Formação profissional	0.00	4,000,000.00
<b>4-00 SAÚDE</b>	<b>3,842,511,100.00</b>	<b>3,348,816,800.00</b>
4-02 Cuidados de saúde	3,842,511,100.00	3,348,816,800.00
<b>5-00 PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>821,201,000.00</b>	<b>756,616,100.00</b>
5-02 Apoio social	821,201,000.00	756,616,100.00
<b>6-00 HABITAÇÃO</b>	<b>1,281,844,600.00</b>	<b>1,178,710,600.00</b>
6-01 Admin., regulamentação e investigação	105,888,000.00	48,372,000.00
6-02 Habitação pública	1,175,956,600.00	1,130,338,600.00

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 31/12/2021</b>	<b>Valor cabimentado até 31/12/2021</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
<b>282,489,886.20</b>	<b>283,964,397.07</b>	<b>98.6</b>	<b>99.1</b>
282,489,886.20	283,964,397.07	98.6	99.1
<b>971,070,095.59</b>	<b>985,707,156.95</b>	<b>98.0</b>	<b>99.4</b>
63,932,871.61	63,932,871.61	99.8	99.8
607,804,430.00	607,911,450.00	100.0	100.0
40,810,829.74	40,810,829.74	99.6	99.6
0.00	0.00	-	-
97,086,248.78	97,228,575.38	94.7	94.8
161,435,715.46	175,823,430.22	91.8	100.0
<b>279,784,330.38</b>	<b>299,281,765.47</b>	<b>91.2</b>	<b>97.5</b>
275,786,086.38	295,283,521.47	91.0	97.5
3,998,244.00	3,998,244.00	100.0	100.0
<b>3,342,090,828.09</b>	<b>3,345,997,928.18</b>	<b>99.8</b>	<b>99.9</b>
3,342,090,828.09	3,345,997,928.18	99.8	99.9
<b>756,608,387.72</b>	<b>756,614,848.75</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
756,608,387.72	756,614,848.75	100.0	100.0
<b>1,170,831,826.76</b>	<b>1,173,952,910.75</b>	<b>99.3</b>	<b>99.6</b>
47,584,571.48	48,343,864.00	98.4	99.9
1,123,247,255.28	1,125,609,046.75	99.4	99.6

# Por classificação funcional

	2021 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/12/2021 b
<b>7-00 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.</b>	<b>388,008,800.00</b>	<b>188,773,796.00</b>
7-01 Cultura	53,997,700.00	30,800,436.00
7-02 Desporto e recreio	315,511,100.00	156,006,185.00
7-04 Meteorologia e geofísica	18,500,000.00	1,567,175.00
7-06 Comunicação social	0.00	400,000.00
<b>8-00 SERVIÇOS ECONÓMICOS</b>	<b>9,635,338,600.00</b>	<b>7,025,515,893.95</b>
8-04 Instalações básicas	1,180,860,700.00	832,947,222.65
8-05 Transportes	6,243,036,500.00	4,633,165,902.30
8-08 Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00
8-10 Protecção ambiental	1,357,062,000.00	1,223,095,784.00
8-11 Comércio e indústria	45,381,500.00	93,861,400.00
8-12 Ciências e tecnologias	72,416,000.00	91,501,900.00
8-99 Outros	694,593,900.00	120,462,285.00
<b>Total</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>

# Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

<b>Despesa efectiva até 31/12/2021</b>	<b>Valor cabimentado até 31/12/2021</b>	<b>Taxa de execução orçamental (%)</b>	<b>Taxa de utilização orçamental (%)</b>
<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e=c/b</b>	<b>f=d/b</b>
<b>182,712,207.76</b>	<b>186,142,009.00</b>	<b>96.8</b>	<b>98.6</b>
30,418,169.86	30,800,169.86	98.8	100.0
151,765,237.90	154,813,039.14	97.3	99.2
497,000.00	497,000.00	31.7	31.7
31,800.00	31,800.00	8.0	8.0
<b>6,901,918,268.22</b>	<b>7,005,739,833.13</b>	<b>98.2</b>	<b>99.7</b>
814,269,996.18	831,832,811.50	97.8	99.9
4,548,208,035.60	4,622,045,264.59	98.2	99.8
30,476,157.17	30,481,223.17	100.0	100.0
1,219,098,080.13	1,219,648,666.92	99.7	99.7
86,287,659.41	93,861,365.00	91.9	100.0
90,593,590.00	90,593,590.00	99.0	99.0
112,984,749.73	117,276,911.95	93.8	97.4
<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6</b>	<b>99.7</b>

**ANEXO II**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO**

**PLANO DE INVESTIMENTOS E**

**DESPESAS DE**

**DESENVOLVIMENTO DA**

**ADMINISTRAÇÃO**

**NO 4.º TRIMESTRE DO ANO**

**ECONÓMICO DE 2021**

**CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O**

**SERVIÇO PROPONENTE**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## Anexo II

## Execução Orçamental do PIDDA 4.º trimestre de 2021 - Classificação segundo o serviço proponente

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Projectos	Projecto com taxa de utilização zero
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	-	189,000.00	189,000.00	189,000.00	100.0%	100.0%	1	
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,415,583,500.00	780,388,500.00	771,274,496.74	777,003,148.97	98.8%	99.6%	45	2
Instituto Cultural	49,285,000.00	16,182,100.00	15,799,922.00	16,181,922.00	97.6%	100.0%	6	
Polícia Judiciária	135,494,800.00	80,357,000.00	77,832,243.08	77,832,243.08	96.9%	96.9%	7	
Instituto para os Assuntos Municipais	342,710,000.00	150,862,600.00	145,601,373.46	149,694,754.82	96.5%	99.2%	24	1
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	222,620,000.00	118,690,000.00	118,681,604.00	118,681,604.00	100.0%	100.0%	2	
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	72,416,000.00	91,501,900.00	90,593,590.00	90,593,590.00	99.0%	99.0%	3	
Instituto de Habitação	665,099,000.00	581,693,033.33	580,854,975.51	581,636,749.13	99.9%	100.0%	12	1
Instituto de Acção Social	820,993,000.00	756,408,100.00	756,401,157.55	756,407,618.58	100.0%	100.0%	2	
Direcção dos Serviços de Turismo	41,988,000.00	30,481,400.00	30,476,157.17	30,481,223.17	100.0%	100.0%	1	
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	162,930,000.00	143,430,000.00	143,009,916.38	143,345,916.38	99.7%	99.9%	12	
Direcção dos Serviços de Finanças	675,356,500.00	214,690,926.66	203,878,186.97	211,600,485.69	95.0%	98.6%	9	
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	21,900,000.00	16,907,600.00	16,907,543.50	16,907,543.50	100.0%	100.0%	1	
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	-	14,791,100.00	12,930,134.60	12,930,134.60	87.4%	87.4%	3	
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	-	4,000,000.00	3,998,244.00	3,998,244.00	100.0%	100.0%	1	
Comissariado Contra a Corrupção	-	5,133,640.00	4,192,797.70	4,192,797.70	81.7%	81.7%	1	
Gabinete de Comunicação Social	-	400,000.00	31,800.00	31,800.00	8.0%	8.0%	1	
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	6,558,912,900.00	5,500,931,866.67	5,391,155,048.38	5,483,568,422.03	98.0%	99.7%	43	
Comissariado da Auditoria	-	675,000.00	675,000.00	675,000.00	100.0%	100.0%	1	
Serviços de Saúde	3,785,880,100.00	3,298,293,300.00	3,291,671,236.15	3,295,505,500.18	99.8%	99.9%	9	1
Universidade de Macau	321,007,100.00	257,174,800.00	230,159,195.61	249,655,989.97	89.5%	97.1%	20	2
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	780,266,400.00	317,231,600.00	317,072,770.86	317,072,770.86	99.9%	99.9%	8	
Instituto de Formação Turística de Macau	1,750,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.0%	100.0%	1	
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	210,258,000.00	179,456,400.00	179,451,796.00	179,456,296.00	100.0%	100.0%	4	
Instituto Politécnico de Macau	183,695,600.00	45,170,100.00	45,026,890.77	45,027,531.50	99.7%	99.7%	2	
Gabinete do Procurador	-	1,839,400.00	1,697,073.40	1,839,400.00	92.3%	100.0%	1	
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,542,550,000.00	1,236,900,000.00	1,232,876,673.13	1,233,427,259.92	99.7%	99.7%	32	
Direcção dos Serviços Correccionais	395,947,300.00	175,823,800.00	161,435,715.46	175,823,430.22	91.8%	100.0%	2	
Serviços de Polícia Unitários	32,000,000.00	-	-	-	-	-	0	
Instituto do Desporto	72,249,100.00	63,040,500.00	63,031,288.30	63,040,473.00	100.0%	100.0%	2	
<b>Total</b>	<b>18,510,892,300.00</b>	<b>14,083,243,666.66</b>	<b>13,887,505,830.72</b>	<b>14,037,400,849.30</b>	<b>98.6%</b>	<b>99.7%</b>	<b>253</b>	<b>7</b>

O Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água executaram, em conjunto, a Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó

O Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas e o Instituto de Acção Social executaram, em conjunto, o projecto Habitação Pública no Bairro de Ilha Verde, Lotes 1 e 2 - Equipamentos sociais

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau executaram, em conjunto, a Empreitada de Construção do Posto Operacional Provisório dos Bombeiros da Ilha Verde

**ANEXO III**

**PROJECTOS DO PLANO DE  
INVESTIMENTOS E DESPESAS DE  
DESENVOLVIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO  
NO 4.º TRIMESTRE DO ANO  
ECONÓMICO DE 2021  
COM TAXA DE UTILIZAÇÃO  
ORÇAMENTAL DE ZERO**

周  
七  
早  
林  
能  
黃  
海  
陽

## Anexo III

## Projectos do PIDDA do 4.º trimestre de 2021 com taxa de utilização de zero

<b>Serviço proponente</b>	<b>Serviço executor</b>	<b>Designação do projecto</b>	<b>Orçamento autorizado</b>
Serviços de Saúde	Serviços de Saúde	Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	39.88
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Melhoramento do Dique do Porto Exterior	96.00
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Empreitada de Design e Construção da Sala de Aula G016 do Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau	6,448,600.00
Instituto de Habitação	Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	Empreitada de construcão de habitacao publica no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	73.33
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	Empreitada da reconstrução da Estação Elevatória das Águas Residuais da Barra (EP2)	90.27
Universidade de Macau	Universidade de Macau	Obras de construção da residência de docentes e funcionários S33 da Universidade de Macau	476,058.00
Instituto para os Assuntos Municipais	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de Construção de Zona de Lazer no Lote BT8,9,11,12 da Taipa	84.20
<b>Total</b>			<b>6,925,041.68</b>



Handwritten signature and stamp, likely an official approval or verification mark.
