



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas

Relatório n.º 3/VII/2024

Assunto: Acompanhamento dos “Relatórios da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) do 4.º trimestre do ano económico de 2023 e do 1.º trimestre do ano económico de 2024”

I. Introdução

1. A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas (doravante designada por “Comissão”) foi constituída nos termos do artigo 29.º do Regimento da Assembleia Legislativa, aprovado pela Resolução n.º 1/1999, com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.ºs 1/2004, 2/2009, 1/2013, 1/2015 e 2/2017.
2. No dia 19 de Novembro de 2021, a Comissão aprovou, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 77.º e no artigo 88.º do Regimento da Assembleia Legislativa, as regras relativas ao seu funcionamento – Regras de Funcionamento da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos

Handwritten signatures and initials on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

de Finanças Públicas (doravante designadas por “Regras de Funcionamento”) – constantes do Anexo da sua Deliberação n.º 1/2021.

3. De acordo com o n.º 1 do artigo 9.º das supracitadas Regras de Funcionamento: *“A Comissão deve elaborar um relatório ou parecer quando termine o acompanhamento de um assunto, podendo propor as medidas consideradas adequadas à matéria em análise”.*
4. No exercício das suas competências, a Comissão reuniu-se, no dia 30 de Abril de 2024, para o acompanhamento do “Relatório da Execução Orçamental do PIDDA do 4.º trimestre do ano económico de 2023” e no dia 18 de Junho de 2024, para o acompanhamento do “Relatório da Execução Orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024”. Depois das reuniões, a Comissão, de acordo com as matérias que foram discutidas, decidiu submeter ao Governo uma lista de questões sobre os referidos relatórios.
5. O Governo apresentou, respectivamente, nos dias 24 de Junho, 4 e 15 de Julho de 2024, as respostas às questões apresentadas pela Comissão, bem como os dados suplementares.
6. No dia 24 de Julho de 2024, a Comissão reuniu-se para a análise e discussão das respostas e dos dados suplementares apresentados pelo Governo e, após discussão, decidiu submeter novamente ao Governo uma

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

lista de questões para acompanhamento, a fim de esclarecer as dúvidas da Comissão.

7. No dia 8 de Agosto de 2024, o Governo apresentou as respostas às referidas questões.
8. A fim de garantir o conhecimento oportuno da sociedade sobre a execução orçamental do PIDDA dos referidos dois trimestres, a Comissão, com base nas informações recebidas, elaborou o presente relatório. Em relação às respostas do Governo referidas no ponto 7, as mesmas serão analisadas e discutidas posteriormente.
9. Os valores referidos no presente relatório têm como unidade monetária a Pataca.

II. Ponto de situação do acompanhamento

Situação da execução orçamental do PIDDA do 4.º trimestre do ano económico de 2023

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

10. Em relação às questões apresentadas ao Governo pela Comissão e às respostas deste, procedeu-se apenas a uma transcrição sucinta do respectivo conteúdo.
11. A Comissão deu atenção aos motivos que levaram à alteração dos valores orçamentados dos seguintes 10 projectos, durante o período entre o 3.º e o 4.º trimestres de 2023:

N.º de ordem Designação do projecto

- | | |
|----|--|
| 1 | Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos |
| 2 | Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE |
| 3 | Linha Leste do Metro Ligeiro |
| 4 | Quarta ponte Macau-Taipa |
| 5 | Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes |
| 6 | Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro |
| 7 | Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros |
| 8 | Túnel da Colina da Taipa Grande |
| 9 | Edifício do Hospital, Edifício de Apoio Logístico, Edifício dos Serviços Multiusos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção da Superestrutura |
| 10 | Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos |



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

12. Resposta do Governo:

“Os projectos seguintes apresentam erros na introdução de dados do 4.º trimestre de 2023, por parte da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, portanto, serão introduzidos ajustamentos nos relatórios sobre a execução orçamental dos trimestres posteriores, e será criada uma equipa de fiscalização para reforçar a revisão dos dados introduzidos no relatório trimestral. Após o devido ajustamento, apresentam-se os seguintes dados e motivos das alterações:

Designação do projecto	milhões de patacas	
	Valor do orçamento do projecto do 4.º trimestre, disponibilizado pela primeira vez pelo Governo	Valor do orçamento alterado do projecto do 4.º trimestre
Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE	782	366
Linha Leste do Metro Ligeiro	10 928	10 886
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes	2 018	1 879
Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro	2 819	2 729
Túnel da Colina da Taipa Grande	1 930	2 059

Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a checkmark at the top and several illegible signatures below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Zona Sul', procedeu-se ao ajustamento do valor da estimativa. Além disso, devido à divisão da empreitada em 6 projectos, aumentou-se o valor do apoio técnico, com vista à prestação de serviços de apoio técnico aos referidos 6 projectos.

Quarta ponte Macau-Taipa

Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos sobre a subida do índice de preços, tornou-se necessária a revisão do preço da obra, pelo que a nova estimativa da despesa sofreu alterações.

Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros

Existem variações nas estimativas dos valores entre o 3.º e o 4.º trimestres, uma vez que o valor de 110 milhões de patacas do 3.º trimestre foi integrado na despesa orçamental do ano de 2024, mas não foi efectuada a redução correspondente na estimativa da despesa do ano de 2025, por esta razão, isso resultou no aumento da estimativa do valor, atingindo 1,67 mil milhões de patacas, portanto, no relatório de execução do 4.º trimestre, este valor foi rectificado para 1,56 mil milhões de patacas.

Edifício do Hospital, Edifício de Apoio Logístico, Edifício dos Serviços Multiusos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção da Superestrutura

1
2
3
4
5
6
7
8



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

As obras do projecto e os respectivos pagamentos foram concluídos em 2023, sendo o valor estimado ajustado de acordo com a situação dos pagamentos efectivos.

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos

O projecto visa suportar as despesas com a instalação de equipamentos profissionais no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, pelo que as instalações e os equipamentos a adquirir serão ajustados de acordo com a situação real. O preço estimado do projecto foi ajustado, tendo em conta a redução dos custos de aquisição de algumas instalações e equipamentos, face à estimativa, e, com a criação do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do *Peking Union Medical College Hospital*, parte das instalações e equipamentos foi adquirida pelo próprio Centro, de modo que o valor estimado do projecto teve uma redução”.

13. Estabelecendo uma comparação entre os dados do 3.º trimestre e os do 4.º trimestre de 2023 fornecidos pelo Governo, verificou-se que foram adiadas as datas previstas de conclusão dos seguintes 4 projectos, mas não foram apresentadas as razões do adiamento da sua data de conclusão. A Comissão quis saber as respectivas razões.

Handwritten signature and vertical text on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

N.º de ordem	Designação do projecto
1	Serviços de Consultadoria, Verificação e Apreciação do Sistema de Metro Ligeiro
2	Linha da Taipa do Metro Ligeiro
3	Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos
4	Obras de Melhoramento das Instalações do Centro Hospitalar Conde de S. Januário

14. Resposta do Governo:

“Serviços de Consultadoria, Verificação e Apreciação do Sistema de Metro Ligeiro

Uma vez que, após a recepção provisória da Extensão da Linha da Taipa até à Estação da Barra do Metro Ligeiro, existem ainda documentos que necessitam de ser apresentados relativos ao projecto ‘09003016-C651 Verificação independente de segurança do sistema circulante’, havendo a necessidade de proceder ao respectivo pagamento, a data de conclusão sofreu atrasos.

Linha da Taipa do Metro Ligeiro

A Linha da Taipa do Metro Ligeiro entrou em operação em Setembro de 2019 e cada um dos subsistemas e componentes com características específicas da composição envolve prazos diferentes de serviços de garantia conforme

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

as exigências contratuais, portanto, a data de conclusão prevista teve um atraso face à data inicialmente prevista.

Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos

As infra-estruturas da Zona A dos Novos Aterros Urbanos incluem os arruamentos, as drenagens de água subterrânea e as galerias técnicas, sendo as respectivas despesas suportadas pelos dois projectos: 'Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos' e 'Empreitada de Construção de galerias técnicas nas vias centrais da Zona A dos Novos Aterros Urbanos'. Aquando da criação do projecto da 'Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos', foi planeada a construção de arruamentos e drenagens de água subterrânea nos lados leste, sul, oeste e norte da Zona A dos Novos Aterros Urbanos; com o início do projecto das galerias técnicas da Zona A, foi redefinida uma nova divisão das zonas para as áreas de construção dos arruamentos e drenagens de água subterrânea da Zona A, pelo que parte das áreas para a construção dos arruamentos e drenagens de água subterrânea foi integrada no projecto de 'Empreitada de Construção de galerias técnicas nas vias centrais da Zona A dos Novos Aterros Urbanos'. O prazo de conclusão previsto para 2025, constante do relatório do 3.º trimestre de 2023, deveu-se a um lapso

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

de escrita aquando da inserção de dados, portanto, deve-se manter o prazo de execução até 2028, conforme o previsto inicialmente.

Obras de Melhoramento das Instalações do Centro Hospitalar Conde de S. Januário

O projecto inclui a obra de renovação de equipamentos da sala de caldeiras, e os respectivos serviços de fiscalização e de concepção. A consignação das obras de renovação foi realizada em Maio de 2022 e o seu prazo de execução é de 525 dias, prevendo-se, na altura, a sua conclusão no 4.º trimestre de 2023. Tendo em conta que, entre Junho de 2022 e Setembro de 2023, a precipitação diária chegou a atingir mais de 20mm, e o sinal de chuva intensa amarelo ou vermelho ou as condições meteorológicas, como o sinal n.º 8, afectaram a segurança e a qualidade de execução da obra, o empreiteiro solicitou a prorrogação do prazo de execução por 57 dias, tendo sido necessário adiar a conclusão da obra para 2024. Actualmente, a execução da obra, a formação e os testes estão basicamente concluídos, e serão realizados os trabalhos de vistoria e recepção provisória, o que denota um atraso em relação ao plano inicialmente previsto”.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Situação da execução orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024

15. A Comissão prestou atenção ao orçamento estimado do projecto “Linha Leste do Metro Ligeiro”, que era de 10,93 mil milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e que teve um aumento para 13,78 mil milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Assim, solicitou esclarecimentos ao Governo sobre as razões concretas que levaram ao aumento do orçamento do projecto, e a descrição sobre o plano mais actualizado e o andamento previsto.

16. Resposta do Governo:

—

“No 1.º trimestre de 2024, devido ao acréscimo de mais uma adjudicação relativa ao sistema de circulação da Linha Leste do Metro Ligeiro, o valor estimado mais actualizado do projecto no 1.º trimestre de 2024 é superior ao valor projectado durante o 4.º trimestre de 2023. No entanto, é de referir que o valor estimado para o projecto em causa situa-se em cerca de 31,4 mil milhões de patacas, por isso, as actuais estimativas, no valor de 13,78 mil milhões de patacas, permanecem ainda muito abaixo do orçamento previamente definido, razão pela qual não se regista nenhuma situação sobre o excesso de despesas.

As obras de construção civil da Linha Leste do Metro Ligeiro foram adjudicadas e iniciadas em 2023, estando prevista a sua conclusão em

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

2028, enquanto a adjudicação da construção do respectivo sistema de circulação foi efectuada no 1.º trimestre de 2024, prevendo-se a conclusão dos respectivos trabalhos no 1.º semestre de 2029”.

17. A Comissão prestou atenção ao orçamento do projecto “Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes”, que era de 2,02 mil milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e que teve uma redução para 1,88 mil milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Assim, foram solicitados esclarecimentos ao Governo sobre isto.

18. Resposta do Governo:

— “O orçamento efectivo para o projecto ‘Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes’ foi de 1,88 mil milhões de patacas e, em 2023, prevendo-se que não era possível efectuar o pagamento de cerca de 140 milhões de patacas para as obras, este montante foi transferido para as despesas de orçamento de 2024 e, aquando do preenchimento do relatório trimestral referente ao 4.º trimestre de 2023, foi alterada a estimativa das despesas de 2024, passando de 360 milhões de patacas para 500 milhões de patacas, mas, como em 2023 estavam reunidas as condições para o pagamento de 140 milhões de patacas, resultando num aumento do respectivo orçamento, que passou de 1,88 mil milhões de patacas para 2,02 mil milhões de patacas, esta situação foi rectificada no 1.º trimestre de 2024”.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large vertical signature and several smaller ones.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

19. A Comissão deu atenção ao orçamento do projecto “Travessia pedonal ao longo da Avenida do Nordeste”, que era de 230 milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e teve uma redução significativa para 20,45 milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Assim, solicitou esclarecimentos ao Governo sobre as razões concretas que levaram à redução do orçamento do projecto, e a descrição sobre o plano mais actualizado.

20. Resposta do Governo:

“Efectuado o devido apuramento, verifica-se que o valor estimado de 20,45 milhões de patacas, preenchido no relatório do 1.º trimestre de 2024, refere-se ao montante das obras e serviços adjudicados, sendo que, aquando do preenchimento do referido relatório, não estavam integrados os orçamentos de quaisquer outras obras e serviços cujos processos de concurso/adjudicação ainda não tinham sido realizados.

O sistema pedonal é composto por três partes: corredor aéreo na Avenida do Nordeste, cobertura de protecção contra chuva no Parque Urbano da Areia Preta e passagem superior para peões interligada, cujas obras serão iniciadas por fases. O orçamento de cada parte será preenchido após a conclusão da concepção do projecto e o lançamento do concurso público, não existindo, neste momento, situações de derrapagens das despesas, nem alterações ao plano”.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a vertical line at the top, followed by several stylized signatures.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

21. A Comissão prestou atenção ao orçamento do projecto “Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos”, que era de 1,72 mil milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e teve uma redução para 1,45 mil milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Segundo a descrição do projecto disponibilizada pelo Governo, existem vários equipamentos e instalações adicionais que precisam de ser adquiridos, mas tendo um custo superior ao previsto. Assim, a Comissão quis saber da situação real deste projecto.

22. Resposta do Governo:

“Com a conclusão gradual da construção dos diversos edifícios no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, foi necessário proceder à alocação das instalações e equipamentos, a fim de otimizar os modelos de funcionamento, gestão e serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, bem como planear melhor a distribuição e a utilização dos recursos médicos locais. Por conseguinte, o orçamento do projecto foi ajustado de acordo com as necessidades efectivas, passando de 430 milhões de patacas, em 2014, para 1,45 mil milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Deste modo, para o orçamento (1,45 mil milhões de patacas para o 1.º trimestre de 2024) foi feito também o ajustamento correspondente (430 milhões de patacas em 2014, aquando da criação do projecto).

Y
A
F
林
林
L
L



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

O orçamento do projecto 'Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Equipamentos e instalações' era de 1,72 mil milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e teve uma redução para 1,45 mil milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024, devido ao ajustamento do valor real de aquisição de algumas instalações e equipamentos em relação ao estimado. Ao mesmo tempo, com a criação, no 4.º trimestre de 2023, do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do *Peking Union Medical College Hospital* (doravante designado por *Hospital Macau Union*), as instalações e equipamentos necessários para o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas passaram a ser adquiridos gradualmente em 2024 pelo *Hospital Macau Union* e suportados pelo seu orçamento. Por isso, relativamente ao orçamento da execução do projecto 'Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Equipamentos e instalações' dos Serviços de Saúde, o valor orçamentado para o 1.º trimestre de 2024 foi inferior ao do 4.º trimestre de 2023.

Situação actual do projecto 'Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Equipamentos e instalações':

Tendo em consideração a recepção, no final de 2023, do Edifício do Laboratório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, este destina-se ao uso por diferentes serviços públicos, incluindo o Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, o *Hospital Macau Union* e os Serviços de Saúde, conforme o planeamento da sua finalidade. Os

Handwritten signatures and marks on the right margin, including a checkmark at the top and several illegible signatures below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Serviços de Saúde pretendem instalar o laboratório de saúde pública, o laboratório de patologia clínica, o laboratório de anatomia patológica, etc. no edifício do laboratório central, pelo que se tornou necessário proceder a obras de remodelação e instalação de equipamentos de apoio para laboratórios especializados. Por conseguinte, até ao 2.º trimestre de 2024, a estimativa mais recente do projecto ‘Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Equipamentos e instalações’ foi actualizada para 1,5 mil milhões de patacas, dos quais 1,06 mil milhões de patacas já foram adjudicados (sendo o pagamento acumulado em 430 milhões de patacas). O valor não adjudicado de 430 milhões de patacas destina-se a suportar as instalações e equipamentos dos laboratórios, da sala do ciclotrão e das respectivas salas de apoio, da sala do simulador de ressonância magnética e do sistema de gestão do tráfego automóvel, etc., prevendo-se que o prazo de execução do projecto seja até 2027”.

23. A Comissão prestou atenção ao orçamento do projecto “Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE”, que era de 780 milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e que teve uma redução para 370 milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. Assim, solicitou esclarecimentos ao Governo sobre as razões concretas que levaram à redução do orçamento do projecto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

24. Resposta do Governo:

“Devido a erros na introdução de dados no 4.º trimestre de 2023, foi rectificado o relatório de execução do 1.º trimestre de 2024, sendo de 370 milhões de patacas o valor correcto do orçamento do projecto”.

25. A Comissão deu atenção ao orçamento do projecto “Túnel da Colina da Taipa Grande”, que era de 1,93 mil milhões de patacas, no 4.º trimestre de 2023, e que teve uma redução significativa para 63,33 milhões de patacas, no 1.º trimestre de 2024. A Comissão quis saber as razões que levaram à redução do orçamento do projecto, bem como o plano mais actualizado do projecto, incluindo o ponto de situação e o conteúdo.

26. Resposta do Governo:

“Efectuado o devido apuramento, verifica-se que o valor estimado de 63,33 milhões de patacas, preenchido no relatório do 1.º trimestre de 2024, refere-se ao montante das obras e serviços adjudicados, sendo que, aquando do preenchimento do referido relatório, não estavam integrados os orçamentos de quaisquer outras obras e serviços cujos processos de concurso/adjudicação ainda não tinham sido realizados.

Conforme o planeamento actualizado e as razões técnicas, os concursos para o Túnel da Colina da Taipa Grande serão lançados de forma faseada e iniciados sucessivamente. O anúncio do concurso para o troço do túnel

Handwritten signatures and initials on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

foi publicado no dia 29 de Maio de 2024, pelo que o respectivo valor e o prazo de execução serão actualizados na sequência da conclusão do procedimento do concurso”.

27. Estabelecendo uma comparação entre os dados do 1.º trimestre de 2024 e os do 4.º trimestre de 2023 disponibilizados pelo Governo, verificou-se que as datas de conclusão previstas dos 4 projectos seguintes foram adiadas. Assim, a Comissão solicitou esclarecimentos detalhados ao Governo sobre as razões que levaram ao adiamento das datas de conclusão previstas dos projectos:

Designação do projecto

Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II

Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau

Empreitada de Concepção e Construção do Viaduto entre a Zona A e a Zona B dos Novos Aterros

Túnel da Colina da Taipa Grande

28. Resposta do Governo:

“Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) realizou, no 3.º trimestre de 2023, o acto público de abertura das propostas e a respectiva

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

avaliação para o projecto 'Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II' e foi feita a adjudicação, no 4.º trimestre de 2023.

Contudo, tendo em conta o facto de o Governo da RAEM ter recebido, subsequentemente, reclamações contra o resultado da adjudicação por parte de concorrentes, dirigidas ao Chefe do Executivo, e de ter sido por eles interposto recurso contencioso junto do tribunal, bem como o facto de algumas das justificações apresentadas terem sido consideradas fundamentadas após averiguação, o Chefe do Executivo declarou a caducidade da referida adjudicação, no 1.º trimestre de 2024.

Após ter sido concluída a reavaliação das propostas do concurso, o Governo da RAEM adjudicou o projecto 'Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II', no 2.º trimestre de 2024. A DSPA está actualmente a dar seguimento aos procedimentos administrativos pertinentes, depois da adjudicação do projecto, prevendo-se que a empreitada seja iniciada em Setembro de 2024, de acordo com os progressos mais recentes.

Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau

O projecto 'Obras de Construção da Residência de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau' está a decorrer conforme previsto,

Handwritten notes in Chinese characters, including a large vertical stroke at the top, followed by several characters and symbols, possibly indicating a signature or official mark.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

tendo os procedimentos de aquisição para a elaboração do plano sido iniciados em 2023, conforme previsto; de acordo com o plano mais recente, devido ao aumento da área de construção das obras de 35 000 metros quadrados para 38 550 metros quadrados, e ao ajustamento do período de construção de 14 meses para 16 meses, está previsto que as obras acima referidas estejam concluídas no 4.º trimestre de 2026. Tendo em consideração que o mobiliário e os electrodomésticos serão recebidos após a conclusão das obras, está previsto que a recepção do mobiliário e electrodomésticos apenas seja concluída em 2027.

Empreitada de Concepção e Construção do Viaduto entre a Zona A e a Zona B dos Novos Aterros

O projecto adopta a forma de concurso limitado por prévia qualificação, que se divide em fases de apreciação de qualificação e de avaliação das propostas; por ser um longo ciclo de concurso, o prazo de execução será actualizado na sequência da conclusão do procedimento do concurso. O projecto tem um prazo máximo de execução de 900 dias de trabalho, e o ano final de conclusão poderá ser preenchido com exactidão após a consignação da obra.

Túnel da Colina da Taipa Grande

Os concursos para o Túnel da Colina da Taipa Grande serão lançados de forma faseada e iniciados sucessivamente. O anúncio do concurso para o

1
A
F
E
K
E
L
M
L
7



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

troço do túnel foi publicado no dia 29 de Maio de 2024 e divide-se em fases de apreciação de qualificação e de avaliação das propostas; por ser um longo ciclo de concurso, o prazo de execução será actualizado na sequência da conclusão do procedimento do concurso. O projecto tem um prazo máximo de execução de 1165 dias de trabalho, e o ano final de conclusão poderá ser preenchido com exactidão após a consignação da obra”.

29. Segundo as informações do no 1.º trimestre de 2024 disponibilizadas pelo Governo, em articulação com o andamento da execução dos projectos “Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II” e “Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau”, foram adiadas as datas de execução dos projectos “Construção da Estação de Água Reciclada de Coloane - Fase II” e “Empreitada de Construção da Estação de Água Reciclada na Ilha Artificial” para 2026 e 2025, respectivamente. Assim, a Comissão solicitou ao Governo informações sobre o seguinte: se existem outros projectos relacionados com os projectos “Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II” e “Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau”, se existem outros projectos que precisam de articular-se com os referidos dois projectos e, como coordenar a execução dos respectivos projectos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

30. Resposta do Governo:

“O projecto ‘Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II’ está previsto iniciar-se em Setembro de 2024. Após a conclusão e entrada em funcionamento do projecto, a água bruta para produção de água reciclada será abastecida ao projecto ‘Construção da Estação de Água Reciclada de Coloane - Fase II’.

O projecto ‘Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau’ está previsto iniciar-se no final de 2024. Após a conclusão e entrada em funcionamento do projecto, água reciclada será abastecida ao projecto ‘Empreitada de Construção da Estação de Água Reciclada na Ilha Artificial’.

Quanto à situação de execução dos projectos ‘Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II’ e ‘Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau’, a DSPA continuará a coordenar e comunicar, de forma estreita, com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), no sentido de implementar e avançar com a execução dos respectivos projectos.

Com a excepção da ‘Construção da Estação de Água Reciclada de Coloane - Fase II’ e da ‘Empreitada de Construção da Estação de Água Reciclada na Ilha Artificial’, até ao momento, a DSAMA não está envolvida

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

nem necessita de colaborar nas obras de 'Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II' e de 'Construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ilha Artificial de Macau'. ”.

31. A Comissão solicitou ao Governo esclarecimentos sobre o ponto de situação da execução da “Obra de optimização de vias públicas da zona do Porto Exterior e dos Novos Aterros do Lago Nam Van” e do “Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”, e a descrição dos planos para o futuro.

32. Resposta do Governo:

— **“Obra de optimização de vias públicas da zona do Porto Exterior e dos Novos Aterros do Lago Nam Van**

Para melhorar a segurança da circulação do trânsito e a durabilidade do pavimento das vias da zona do Porto Exterior e dos Novos Aterros do Lago Nam Van, actualmente, está planeada a obra de optimização da Avenida Doutor Stanley Ho e das vias adjacentes e, em articulação com as disposições do trânsito, o processo do concurso público da respectiva obra será iniciado no 2.º trimestre de 2024, após a conclusão da obra de optimização da Avenida de D. João IV e das vias adjacentes. De acordo com a avaliação do progresso actual do projecto, a obra de optimização da Avenida Doutor Stanley Ho e das vias adjacentes terá início em Julho de 2024, e a sua conclusão está prevista para o 3.º trimestre do corrente ano.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical line at the top, a signature, and several vertical lines of text.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Por outro lado, o Instituto para os Assuntos Municipais continuará a verificar a situação do pavimento nesta zona e a elaborar o plano de obras de optimização das vias públicas, em tempo oportuno.

Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

Segundo Terminal do Aeroporto

Devido à recuperação lenta do tráfego de passageiros do aeroporto após a epidemia, o volume do tráfego de passageiros do aeroporto em 2023 foi apenas de cerca de 5,15 milhões. Embora o volume do tráfego de passageiros do aeroporto no 1.º trimestre deste ano tenha atingido 1,8 milhões de passageiros e tenha recuperado para cerca de 77% do pico do período homólogo de 2019, a actual capacidade do terminal de passageiros do aeroporto ainda é suficiente para dar resposta às necessidades do desenvolvimento actual do tráfego aéreo, já que a capacidade do terminal é de 10 milhões de passageiros por ano. Por isso, neste momento, a construção do segundo terminal do aeroporto encontra-se suspensa.

Tendo em conta que a obra de expansão do lado sul do terminal de passageiros do aeroporto foi concluída e entrou em funcionamento em 2022, a capacidade actual do terminal de passageiros é suficiente para responder às necessidades do desenvolvimento actual. No futuro, tendo

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

em conta a previsão do desenvolvimento do tráfego aéreo de Macau e o plano de desenvolvimento das instalações aeroportuárias, vai ser estudada, em tempo oportuno, a necessidade da reabertura do projecto do Segundo Terminal do aeroporto.

Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa

Considerando que, apesar da necessidade de operação do Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, este não reúne os requisitos necessários para a sua exploração. Assim, para que o Heliporto possa entrar em funcionamento em tempo oportuno, estão a ser preparados os documentos para o concurso público relativos às obras de modificação do heliporto, com vista a iniciar as obras o mais rápido possível.

Actualmente, encontram-se em preparação as obras de modificação do heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, a fim de iniciar as obras com a maior brevidade possível, para que este possa reunir os requisitos necessários para o seu funcionamento, tentando que este heliporto entre em funcionamento no 2.º semestre de 2025. Por outro lado, através da alteração do modelo de exploração e gestão do referido heliporto, prevê-se que se proporcione um ambiente mais aberto, atraindo mais companhias aéreas de helicópteros a prestar os respectivos serviços”.

33. A Comissão quis saber se as obras de remodelação referidas nos projectos da “Obra de remodelação das instalações sociais sitas no QR/C do Edifício

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Zhu Kuan” e da “Obra de remodelação das instalações da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais no Centro *Golden Dragon*” estão situadas no mesmo edifício.

34. Resposta do Governo:

“O Edifício Zhu Kuan é composto por 4 subpartes, nomeadamente, subparte A (Parque de estacionamento), subparte B (Parte comercial), subparte C (Instalações sociais e escritórios, também designada por Centro *Golden Dragon*,) e subparte D (Instalações sociais e habitações).

As instalações sociais, QR/C do Edifício Zhu Kuan (utilizadas pela Direcção dos Serviços de Finanças) estão situadas na área da subparte D, enquanto o 3.º andar do Centro *Golden Dragon* (utilizado pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais) está situado na área da subparte C.

As instalações sociais, QR/C do Edifício Zhu Kuan e o 3.º andar do Centro *Golden Dragon* estão separados apenas por um terraço”.

III. Análise financeira

Situação da execução orçamental do PIDDA no 4.º trimestre do ano económico de 2023

Handwritten signatures and marks on the right margin, including a vertical line at the top, a signature, and several other marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

35. O orçamento inicial do PIDDA para 2023 era de 22,31 mil milhões de patacas, e o orçamento autorizado até ao 4.º trimestre cifrou-se em 23,03 mil milhões de patacas, registando um aumento de 720 milhões de patacas em relação ao orçamento inicial; a despesa efectiva foi de 19,67 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 85,4%, o valor da cabimentação foi de 20,73 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 90%. Os dados sobre a situação da execução orçamental dos diversos serviços podem ser consultados no Anexo II.
36. No ano económico de 2023, os 5 serviços públicos com taxa de execução orçamental inferior a 50% foram os seguintes:

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	milhões de patacas	
						N.º de projectos	N.º de projectos com taxa de execução orçamental de zero
Autoridade de Aviação Civil	0	42	0	0	0,0%	1	1
Serviços de Polícia Unitários	36	36	0	0	0,0%	2	2
Comissariado contra a Corrupção	20	19	6	6	33,8%	1	0
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	42	42	18	38	43,6%	2	0
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	82	60	28	29	46,5%	2	0

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical mark at the top and several illegible signatures below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

37. É de salientar que, no ano económico de 2023, a Autoridade de Aviação Civil inscreveu apenas um projecto, “Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa”. Este projecto foi inscrito no 3.º trimestre de 2023 e teve como objectivo principal aumentar o Terminal de Passageiros do Aeroporto e melhorar as instalações do heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. Segundo a descrição do projecto disponibilizada pelo Governo no 4.º trimestre, o plano de construção do Segundo Terminal do Aeroporto vai ser suspenso, e estão a ser coordenados com as respectivas entidades os trabalhos relacionados com o plano de melhoramento do heliporto. A recuperação do aeroporto tem sido relativamente lenta, com 5,15 milhões de passageiros registados em 2023. Em comparação com o pico de 2019 (9,61 milhões), o número total de passageiros recuperou 54%. Prevê-se que o número de passageiros do aeroporto aumente entre 10% a 15% em 2024, face ao ano de 2023. Assim, a capacidade actual do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau, quando comparada com o volume actual do tráfego aéreo, é ainda suficiente para dar resposta às necessidades, por isso, neste momento, a construção do segundo terminal do aeroporto encontra-se suspensa.
38. No ano económico de 2023, os Serviços de Polícia Unitários inscreveram dois projectos: “Protecção civil inteligente” e “Vida da população inteligente”. Estes dois projectos foram inscritos em 2020, permanecendo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ambos nos orçamentos dos anos económicos de 2020 a 2024, e a sua taxa de execução orçamental foi de zero no ano económico de 2023, sendo de zero a taxa de execução orçamental do projecto “Vida da população inteligente”, durante três anos consecutivos (2021-2023). Segundo a descrição do projecto disponibilizada pelo Governo no 4.º trimestre de 2023, o mesmo vai ser novamente avaliado e analisado, e, no 1.º trimestre de 2024, terão início os estudos e análises de viabilidade do projecto.

39. Estabelecendo-se a comparação com o PIDDA do 3.º trimestre de 2023, no PIDDA do 4.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado mantém-se inalterado, a despesa efectiva aumentou 5,79 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 1,09 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental aumentou 25,1%, enquanto a taxa de utilização orçamental aumentou 4,7%.

milhões de patacas

2023	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
4.º trimestre	23 031	19 668	20 729	85,4%	90,0%	276
3.º trimestre	23 031	13 883	19 639	60,3%	85,3%	274
Varição	-	5 785	1 090	25,1%	4,7%	2

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

40. Até ao 4.º trimestre de 2023, registou-se um total de 276 projectos do PIDDA, entre os quais 2 foram inscritos no 4.º trimestre. Destes 2 projectos, um deles é um projecto antigo inscrito em 2018, e o outro foi criado no 4.º trimestre de 2023. Os referidos 2 projectos envolvem um orçamento autorizado de 11,4 milhões de patacas.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão
Construção de Dois Túneis Subaquáticos adjacentes às Partes Laterais da Ponte General Nobre de Carvalho	7 400 000,00	Projecto antigo	32 217 500,00	2018 2023

Instituto para os Assuntos Municipais

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão
Obra de optimização de vias públicas da zona do aterro entre as Ilhas de Coloane e da Taipa, do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço Hengqin e das suas zonas contíguas	4 000 000,00	Projecto novo	95 900 000,00	2023 2024

41. Até ao 4.º trimestre de 2023, o orçamento autorizado do PIDDA aumentou 4,07 mil milhões de patacas, em comparação com o período homólogo de 2022, a despesa efectiva aumentou 3,72 mil milhões de patacas, o valor da cabimentação aumentou 4,65 mil milhões de patacas e a taxa de



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

execução orçamental aumentou 1,3%, enquanto a taxa de utilização orçamental aumentou 5,2%. Apesar de o orçamento autorizado do 4.º trimestre de 2023 ter atingido 23,03 mil milhões de patacas, superior ao valor de 18,96 mil milhões de patacas registado no período homólogo de 2022, o valor calculado das taxas de execução e de utilização orçamental registou um aumento em relação ao mesmo período de 2022. Pode-se deduzir que a execução orçamental do PIDDA até ao 4.º trimestre de 2023 foi mais favorável do que a do período homólogo de 2022. Havia 276 projectos do PIDDA, portanto, verificou-se um aumento de 46 projectos face aos 230 registados no período homólogo de 2022.

milhões de patacas

4.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
Ano 2023	23 031	19 668	20 729	85,4%	90,0%	276
Ano 2022	18 958	15 952	16 077	84,1%	84,8%	230
Varição	4 073	3 716	4 652	1,3%	5,2%	46

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

42. Até ao 4.º trimestre de 2023, registaram-se 20 projectos com uma taxa de execução orçamental de zero, envolvendo um orçamento autorizado de 270 milhões de patacas:

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Designação do projecto	Orçamento autorizado
Empreitada de reconstrução da Ecoteca da Flora	5 810 828,40
Obra de Construção da Passagem Superior para Peões na Avenida de Venceslau de Morais	258 000,00
Obra de construção de um túnel subaquático nos Novos Aterros	0,02

Instituto Cultural

Designação do projecto	Orçamento autorizado
Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio Imperial em Macau	4 500 000,00
Renovação e Optimização do Museu de Macau	8 220 000,00
Plano de Reabilitação da Praça do Centro Cultural de Macau	6 000 000,00
<i>Design</i> de interiores e obra de decoração do Edifício dos Arquivos Históricos do Governo	1 119 200,00

Instituto para os Assuntos Municipais

Designação do projecto	Orçamento autorizado
Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	600 000,00
Obra de construção do espaço recreativo para crianças na Avenida Marginal do Lam Mau	20 000,00
Obra de construção da nova estação elevatória de águas pluviais e residuais (EP9 e EER) da Bacia Norte do Patane e <i>box-culvert</i> das vias circundantes	5 000 000,00

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Designação do projecto	Orçamento autorizado
Prevenção e combate inteligente a incêndios	7 572 700,00
Escola superior inteligente	11 559 000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Serviços de Polícia Unitários

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Protecção civil inteligente	16 000 000,00
Vida da população inteligente	20 000 000,00

Autoridade de Aviação Civil

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	42 112 000,00

Direcção dos Serviços de Turismo

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Restauração do Edifício Ritz	480 000,00

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água reutilizável que fazem ligação entre o bairro social de Seac Pai Van e a Universidade de Macau	1 555 000,00

Direcção dos Serviços de Finanças

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Finanças inteligentes 1.ª fase	19 236 000,00

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical mark at the top and several illegible signatures below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Serviços de Saúde

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Obras de remodelação de uma parte do 17.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao destinada aos Serviços de Saúde	7 320 000,00

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>
Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	110 801 064,50

43. Dos referidos 20 projectos com taxa de execução orçamental de zero, foram efectuados os procedimentos de cabimentação de 6, mas não tinham qualquer registo de pagamento, o que significa que, no ano económico de 2023, em relação a estes 6 projectos foram efectuados os procedimentos de adjudicação das despesas, tendo sido planeado efectuar o pagamento das despesas no próprio ano, mas o pagamento acabou por não ser realizado conforme o previsto, consoante os respectivos motivos:

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Valor da cabimentação</u>	<u>Despesa efectiva</u>
Design de interiores e obra de decoração do Edifício dos Arquivos Históricos do Governo	1 119 200,00	1 119 200,00	0,00
Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	600 000,00	600 000,00	0,00
Obra de construção do espaço recreativo para crianças na Avenida Marginal do Lam Mau	20 000,00	19 998,34	0,00
Obra de construção da nova estação elevatória de águas pluviais e residuais	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

<u>Designação do projecto</u>	<u>Orçamento autorizado</u>	<u>Valor da cabimentação</u>	<u>Despesa efectiva</u>
(EP9 e EER) da Bacia Norte do Patane e <i>box-culvert</i> das vias circundantes			
Finanças inteligentes 1.ª fase	19 236 000,00	19 236 000,00	0,00
Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	110 801 064,50	110 801 064,50	0,00

44. Após a análise das informações dos projectos do PIDDA do 4.º trimestre de 2023, e a comparação entre os 276 projectos e os projectos do PIDDA do 3.º trimestre de 2023, verificou-se que o Governo tinha alterado o prazo de execução de 21 projectos: em 19 destes, as datas de conclusão foram adiadas; mais, em 2 destes projectos as datas de conclusão foram antecipadas. Para informações mais detalhadas, consulte-se o Anexo III.
45. Por outro lado, estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do PIDDA do 4.º trimestre de 2023 e os valores das estimativas do 3.º trimestre de 2023, verificou-se que 27 projectos registaram aumentos nos valores das estimativas actualizadas, 132 projectos mantiveram os valores e 109 registaram reduções nos valores. Além disso, o valor da estimativa bruta de 6 projectos foi alterado para o valor da estimativa.
46. É de salientar que, estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do 4.º trimestre e do 3.º trimestre de 2023, os seguintes 11 projectos registaram alterações do valor global do orçamento superiores a 100 milhões de patacas:

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

milhões de patacas

Serviço proponente	Designação do projecto	4.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	3.º trimestre - Valor das estimativas actualizadas	Variação entre os valores
Direcção dos Serviços de Obras Públicas/ Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	3 008	2 397	611
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE	782	369	412
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha Leste do Metro Ligeiro	10 928	10 606	322
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Quarta ponte Macau-Taipa	6 554	6 361	192
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes	2 018	1 879	139
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha de Seac Pai Van do Metro Ligeiro	2 819	2 703	116
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin	4 836	4 735	102
Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A1 da Zona A dos Novos Aterros	1 567	1 670	-103
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel da Colina da Taipa Grande	1 930	2 059	-130
Serviços de Saúde	Edifício do Hospital, Edifício de Apoio Logístico, Edifício dos Serviços Multiusos e Administrativos do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Construção da Superestrutura	8 174	8 332	-158
Serviços de Saúde	Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos	1 724	1 942	-218

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

47. Os referidos 11 projectos apresentam uma variação superior a 100 milhões de patacas entre os valores das estimativas e, com excepção do projecto “Extensão da Linha do Metro Ligeiro na Ilha de Hengqin”, em que foi apresentada, por parte do Governo, uma descrição mais actualizada sobre as respectivas alterações, a descrição dos restantes projectos quanto à variação entre os valores das estimativas não foi apresentada. Assim, a Comissão solicitou esclarecimentos adicionais ao Governo.

Situação da execução orçamental do PIDDA no 1.º trimestre do ano económico de 2024

48. O orçamento inicial do PIDDA para 2024 era de 17,42 mil milhões de patacas, e o orçamento autorizado até ao 1.º trimestre cifrou-se em 17,48 mil milhões de patacas, registando um aumento de 59,79 milhões de patacas em relação ao orçamento inicial; a despesa efectiva foi de 5,2 mil milhões de patacas, a taxa de execução orçamental foi de 29,8%, o valor da cabimentação foi de 13,88 mil milhões de patacas e a taxa de utilização orçamental foi de 79,4%. Os dados sobre a situação da execução orçamental dos diversos serviços podem ser consultados no Anexo V.
49. Até ao 1.º trimestre de 2024, registou-se um total de 222 projectos do PIDDA, entre os quais, 9 foram inscritos no 1.º trimestre e 2 foram cancelados. Destes 9 projectos, 5 foram projectos antigos inscritos antes de 2024, e os restantes 4 foram criados no 1.º trimestre de 2024. Os

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large '1' at the top, followed by several illegible signatures.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

referidos 9 projectos envolvem um orçamento autorizado de 49,72 milhões de patacas.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Empreitada da Reconstrução da Estação Elevatória das Águas Residuais da Avenida do Almirante Lacerda (EP3)	1 697 500,00	Projecto novo	115 100 000,00	2024	2027
Serviços de Consultadoria, Verificação e Apreciação do Sistema de Metro Ligeiro	724 800,00	Projecto antigo	898 226 425,54	2009	2024
Linha da Taipa do Metro Ligeiro	440 000,00	Projecto antigo	3 444 120 295,57	2010	2024

Polícia Judiciária

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Aumento de equipamento auxiliar para investigação criminal - 2021	956 000,00	Projecto antigo	22 099 239,83	2021	2024

Instituto para os Assuntos Municipais

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Obra de construção do espaço recreativo para crianças na Avenida Marginal do Lam Mau	19 998,34	Projecto antigo	23 623 889,00	2020	2024

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical signature and several smaller marks.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Estrada Flor de Lótus no Cotai – Obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água	7 977 340,00	Projecto novo	9 336 000,00	2024	2024

Direcção dos Serviços de Finanças

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Obra de remodelação das instalações sociais sitas no QR/C do Edifício Zhu Kuan	14 637 000,00	Projecto novo	14 637 000,00	2024	2024

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Obra de remodelação das instalações da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais no Centro Golden Dragon	21 996 000,00	Projecto novo	21 996 000,00	2024	2024

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

Designação do projecto	Orçamento autorizado	Ponto de situação	Estimativa/ orçamento do projecto	Data de início/ conclusão	
Obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais junto do Terminal Marítimo do Porto Exterior	1 269 050,00	Projecto antigo	62 728 125,00	2020	2026



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

50. No 1.º trimestre de 2024 foram cancelados os seguintes 2 projectos:

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Construção da estação de água reciclada de Coloane fase II	2 700 000,00
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Empreitada de construção da estação de água reciclada na ilha artificial	3 438 000,00

51. Segundo a situação da execução de projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 disponibilizada pelo Governo, e tomando como referência a descrição sobre a situação da execução orçamental, a razão principal do cancelamento do projecto “Construção da estação de água reciclada de Coloane fase II” foi: de acordo com o Relatório das LAG para o ano de 2024, a modernização da ETAR de Coloane será concluída no 2.º semestre de 2030 (...) e, de acordo com o plano actual, a ETAR fornecerá água à Estação de água reciclada de Coloane fase II no início de 2029. Para coordenação com o cronograma da ETAR, a execução do projecto será adiada.

52. Por outro lado, a razão principal do cancelamento do projecto “Empreitada de construção da estação de água reciclada na ilha artificial” foi: de acordo com o Relatório das LAG para o ano de 2024, a construção da ETAR da ilha artificial será concluída no 1.º semestre de 2029, (...) de acordo com o

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

plano actual, a ETAR fornecerá água à Estação de água reciclada da ilha artificial no início de 2029. Para coordenação com o cronograma da ETAR, a execução do projecto será adiada.

53. Os referidos dois projectos foram criados aquando da elaboração do Orçamento para o ano económico de 2024. A razão do adiamento da execução dos projectos deveu-se à necessidade de acompanhar o andamento da execução de outros projectos referidos no Relatório das LAG para 2024, o que demonstra que os serviços, aquando da criação dos referidos dois novos projectos, não tiveram em conta a execução global de outros projectos com estes relacionados.

54. Além disso, para além dos referidos dois projectos cancelados, segundo a situação da execução de projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 disponibilizada pelo Governo, e tomando como referência a descrição sobre a situação da execução orçamental, previa-se que os seguintes dois projectos também não fossem executados em 2024.

Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de início	Data de conclusão
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Construção de Habitação Pública na Avenida Wai Long	4 776 000,00	2017	2025
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Ampliação e reordenamento do Reservatório de Seac Pai Van	402 000,00	2018	2027



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Descrição da situação de execução orçamental da “Empreitada de Construção de Habitação Pública na Avenida Wai Long”:

“Devido à suspensão da construção dos empreendimentos de habitação pública, os trabalhos de planeamento das infra-estruturas previstas também foram suspensos”.

Descrição da situação de execução orçamental do projecto “Ampliação do Reservatório de Seac Pai Van”:

“A Direcção dos Serviços de Obras Públicas é responsável pela coordenação e execução deste projecto, e a medição de trabalhos e materiais deste projecto foi adjudicada em Agosto de 2023. De acordo com o calendário mais recente da DSOP, a execução da ‘Ampliação do Reservatório de Seac Pai Van’ será suspensa em 2024 e iniciada em 2025”.

55. No 1.º trimestre de 2024, o orçamento autorizado teve uma redução de 5,11 mil milhões de patacas face ao período homólogo de 2023, a despesa efectiva aumentou 280 milhões de patacas, o valor da cabimentação diminuiu 1,72 mil milhões de patacas e a taxa de execução orçamental subiu 8%, enquanto a taxa de utilização orçamental subiu 10,4%. Havia 222 projectos do PIDDA, portanto, verificou-se uma redução de 31 projectos face aos 253 registados no período homólogo de 2023.

Handwritten notes in Chinese characters on the right margin, including a vertical line and several characters.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

milhões de patacas

1.º trimestre	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos
Ano 2024	17 478	5 205	13 878	29,8%	79,4%	222
Ano 2023	22 588	4 927	15 595	21,8%	69,0%	253
Varição	-5 109	278	-1 717	8,0%	10,4%	-31

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

56. Até ao 1.º trimestre de 2024, registaram-se 49 projectos com uma taxa de utilização orçamental de zero, envolvendo um orçamento autorizado de 750 milhões de patacas (para informações mais detalhadas, consulte-se o Anexo VI):

Serviço	1.º trimestre
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	6
Instituto Cultural	6
Instituto de Habitação	5
Direcção dos Serviços de Finanças	4
Universidade de Macau	4
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	4
Instituto para os Assuntos Municipais	3
Polícia Judiciária	2
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	2
Direcção dos Serviços de Identificação	2
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2
Serviços de Saúde	2
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	2
Serviços de Polícia Unitários	2
Autoridade de Aviação Civil	1
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	1
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do <i>Peking Union Medical College Hospital</i>	1
Total	49



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

57. Dos 49 projectos com taxa de utilização orçamental de zero, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas e o Instituto Cultural têm 6 cada; o Instituto de Habitação tem 5; e a Direcção dos Serviços de Finanças, a Universidade de Macau e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental têm 4 cada.

58. Após a análise das informações dos projectos do PIDDA do 1.º trimestre de 2024, e a comparação entre os 222 projectos do referido trimestre e os projectos do PIDDA do 4.º trimestre de 2023, verificou-se que o Governo alterou o prazo de execução de 12 projectos: em 9 destes, as datas de conclusão foram adiadas, e o Governo não prestou esclarecimentos sobre o adiamento da data de conclusão dos 3 projectos que se seguem; mais, em 3 destes projectos as datas de conclusão foram antecipadas. Para informações mais detalhadas, consulte-se o Anexo VII.

Serviço proponente	Designação do projecto	Data de conclusão prevista no 1.º trimestre de 2024	Data de conclusão prevista no 4.º trimestre de 2023	Variação (em anos)
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	2036	2030	6
Universidade de Macau	Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau	2027	2026	1
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Concepção e Construção do Viaduto entre a Zona A e a Zona B dos Novos Aterros	2030	2027	3

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large vertical mark at the top and several smaller marks and signatures below.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

59. Além disso, quanto ao adiamento da data de conclusão para 2029 do projecto “Túnel da Colina da Taipa Grande”, a descrição do projecto disponibilizada pelo Governo não conseguiu dissipar as dúvidas da Comissão. Assim, a pedido da Comissão, o Governo prestou esclarecimentos adicionais sobre os referidos 3 projectos cujas datas de conclusão foram adiadas e sobre o projecto “Túnel da Colina da Taipa Grande”, que se encontram no ponto 28 do presente relatório.
60. Estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do PIDDA do 1.º trimestre de 2024 e os do 4.º trimestre de 2023, verificou-se que 17 projectos registaram aumentos nos valores das estimativas actualizadas, 120 projectos mantiveram os valores e 44 registaram reduções nos valores. Além disso, o valor da estimativa bruta de um projecto foi alterado para o valor da estimativa.
61. É de salientar que, estabelecendo uma comparação entre os valores das estimativas actualizadas dos projectos do 1.º trimestre de 2024 e os do 4.º trimestre de 2023, os seguintes 6 projectos registaram alterações do valor global do orçamento superiores a 100 milhões de patacas:

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

milhões de patacas

Serviço proponente	Designação do projecto	1.º trimestre de 2024 - Valor das estimativas actualizadas	4.º trimestre de 2023 - Valor das estimativas actualizadas	Variação entre os valores
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha Leste do Metro Ligeiro	13 780	10 928	2 853
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais	1 879	2 018	-139
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Travessia pedonal ao longo da Avenida do Nordeste	20	229	-209
Serviços de Saúde	Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Instalações e equipamentos	1 447	1 724	-277
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE	366	782	-415
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel da Colina da Taipa Grande	63	1 930	-1 867

* Devido aos arredondamentos, os valores calculados podem variar ligeiramente.

62. Os referidos 6 projectos apresentam uma variação entre os valores das estimativas actualizadas superior a 100 milhões de patacas e, com excepção do projecto “Linha Leste do Metro Ligeiro”, que representa um aumento do valor, os restantes projectos representam uma redução do valor. O Governo não apresentou a descrição dos projectos “Travessia Pedonal ao Longo da Avenida do Nordeste” e “Melhoramento do Emissário Residual das Zonas ZAPE e NAPE” quanto à variação entre os valores das estimativas.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

63. Quanto aos restantes 4 projectos, embora o Governo tenha apresentado a respectiva descrição, a Comissão solicitou esclarecimentos adicionais ao Governo para melhor se inteirar das razões que levaram à alteração orçamental dos mesmos. Posteriormente, a pedido da Comissão, o Governo prestou os devidos esclarecimentos adicionais.

IV. Opiniões e sugestões

64. Até ao 4.º trimestre de 2023, a taxa de execução orçamental do PIDDA foi de 85,4%, enquanto a taxa de utilização orçamental foi de 90%, aumentando ligeiramente 1,3% e 5,2%, respectivamente, face a 2022, o que demonstra que os trabalhos desenvolvidos na sua promoção foram satisfatórios, facto reconhecido pela Comissão.

65. Até ao 1.º trimestre de 2024, a taxa de execução orçamental do PIDDA foi de 29,8%, enquanto a taxa de utilização orçamental foi de 79,4%, aumentando 8% e 10,4%, respectivamente, face ao período homólogo de 2023, o que demonstra que os trabalhos desenvolvidos na sua promoção foram satisfatórios, facto reconhecido pela Comissão.

66. O relatório trimestral da execução orçamental do PIDDA é um meio eficaz para conhecer a situação dos projectos de investimento do Governo. Assim, o Governo deve assegurar a exactidão dos dados dos projectos, isto é,

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large vertical signature and several smaller ones.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

para além de garantir a exactidão da inserção dos dados, deve ainda criar um mecanismo de verificação ou de confirmação, a fim de reforçar o controlo interno.

67. No dia 8 de Agosto, a Comissão recebeu as respostas do Governo às questões para acompanhamento dos projectos e, quanto ao conteúdo das respostas, a Comissão entende que ainda é necessário proceder à sua discussão e análise. Assim, será dada continuidade à discussão aquando do acompanhamento do relatório de execução orçamental do PIDDA do 2.º trimestre de 2024.

68. A Comissão vai dar continuidade ao acompanhamento da execução orçamental do PIDDA.

V. Conclusões

69. A Comissão conclui o seguinte:

- (1) Entregar o presente relatório ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa e propor a sua distribuição a todos os Deputados;
- (2) Enviar o presente relatório ao Governo.

Macau, 12 de Agosto de 2024

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like '林' and '李'.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

A Comissão,

Wong Kit Cheng

(Presidente)

Ip Sio Kai

(Secretário)

Chan Chak Mo

Iau Teng Pio

Pang Chuan

Lam Lon Wai



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Leong Hong Sai

Cheung Kin Chung

Lo Choi In

Lei Leong Wong



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO I

PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

4.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

Relatório da Execução Orçamental no 4.º trimestre do ano económico de 2023



Fevereiro 2024

DSF

Página em branco

Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 4.º trimestre do ano de 2023.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito e por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende as informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de diversos projectos, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2023, cifrou-se em 22 308,24 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 23 031,12 milhões de patacas, sendo a despesa efectiva de 19 667,87 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 85,4%¹, quanto às verbas cabimentadas, foram de 20 729,11 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 90,0%².

Em termos de programas, o da “Habitação Pública” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 4 703,77 milhões de patacas, sendo, no qual, a “Residência para Idosos” com o valor do orçamento autorizado mais elevado de 1 022,49 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 75,0% e de 75,1%; seguidamente, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros” com um orçamento autorizado no valor de 545,99 milhões de patacas, sendo a taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental de 99,9% e de 100,0% respectivamente.

Em termos orgânicos, a Direcção dos Serviços de Obras Públicas assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 8 721,84 milhões de patacas, perfazendo 37,9% do orçamento total, sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 97,3% e 99,1%; de seguida, foram o Instituto de Habitação e os Serviços de Saúde, o orçamento autorizado do Instituto de Habitação situou-se em 3 268,88 milhões de patacas, representando 14,2% do orçamento total, bem como 99,5% e 100,0% das taxas de


¹ Despesa efectiva/ orçamento autorizado

² Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado dos Serviços de Saúde foi de 2 858,80 milhões de patacas, representando 12,4% do orçamento total, e sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 55,4% e de 62,6% respectivamente.


Por classificação económica, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 7 268,79 milhões de patacas, representando 31,6% do orçamento total, bem como 96,7% e 98,8% das taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa”, da “Linha Leste do Metro Ligeiro” e dentre outros; seguindo-se, a dos “Edifícios e estabelecimentos”, com o orçamento autorizado no valor de 6 511,33 milhões de patacas, representando 28,3% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 83,4% e de 91,2%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos do “Edifício do Hospital Geral, Edifício de Apoio Logístico, Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Construção de superestrutura”, da “Construção das Instalações da Central de Incineração 3.^a Fase”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica

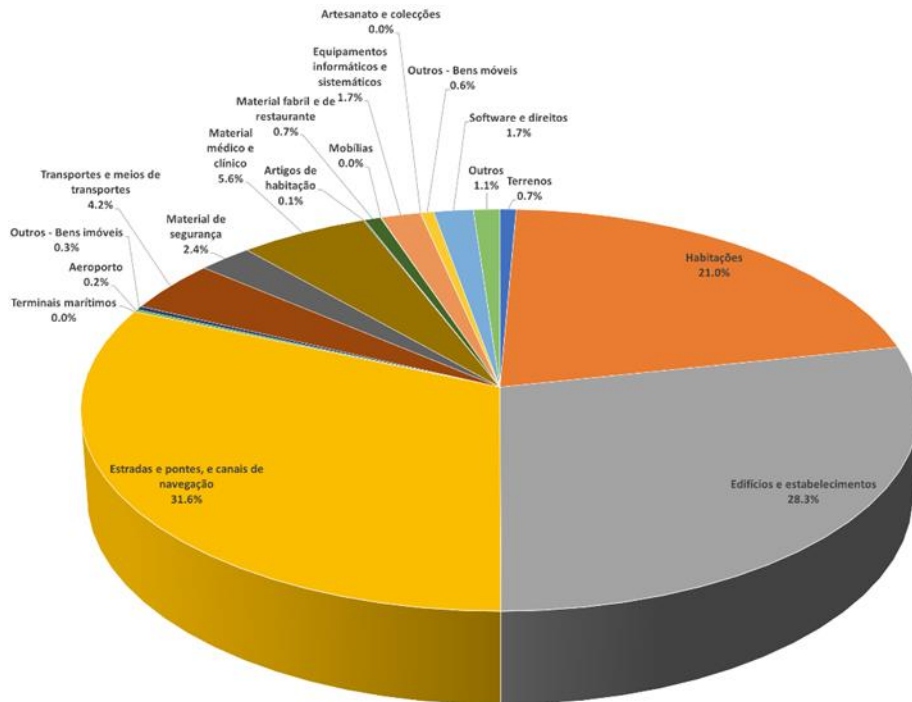

Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, o seu orçamento autorizado foi de 10 977,83 milhões de patacas, registando uma proporção de 47,7% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 91,0% e a de utilização orçamental de 97,3%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Quarta ponte Macau - Taipa”, da “Linha Leste do Metro Ligeiro”, etc.; seguindo-se a da “Habitação”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 3 798,83 milhões de patacas, representando 16,5% do orçamento total, as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 99,5% e de 99,9%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote B4 da Zona A dos Novos Aterros”, da “Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Moraes”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional

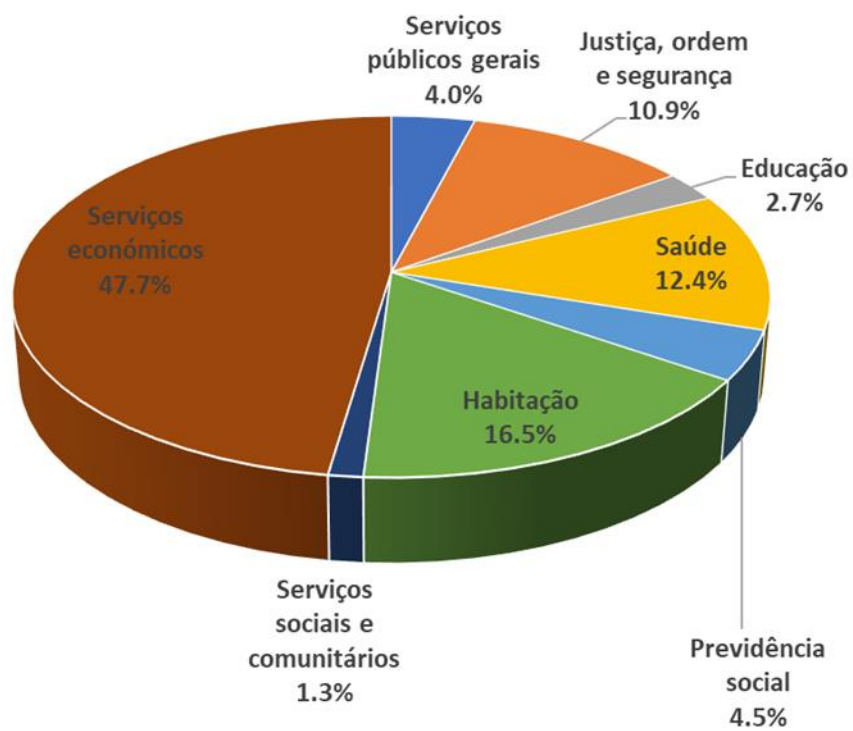

Por programa

	2023	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/12/2023
	a	b
Obra de instalações públicas	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
Habitação Pública	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	2,984,965,500.00	3,422,160,331.00
Aterros	33,462,800.00	33,462,800.00
Novo campus da UM na Ilha de Hengqin	313,021,600.00	313,021,600.00
Obras de instalações de serviços	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
Equipamentos de Serviços	942,504,300.00	942,504,300.00
Centro de transportes	925,000.00	7,295,700.00
Equipamento de instalações públicas	5,500,000.00	130,717,000.00
Equipamentos médicos	78,000,000.00	78,000,000.00
Construção do novo estabelecimento prisional	473,258,800.00	569,576,406.54
Meios de transporte	137,323,000.00	137,323,000.00
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
Instalação para água	60,985,900.00	60,985,900.00
Novo Acesso Front. Guangdong-Mac. (P. Front. Qingmao)	582,600.00	582,600.00
Policimento inteligente em nuvem	314,381,700.00	314,381,700.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	744,268,400.00	744,268,400.00
Total	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
2,185,108,375.50	2,605,298,836.93	78.3	93.3
4,163,792,502.86	4,193,190,353.82	98.8	99.5
4,430,394,355.18	4,448,447,701.90	94.2	94.6
3,223,107,477.20	3,347,795,152.34	94.2	97.8
33,423,384.32	33,462,761.62	99.9	100.0
285,775,259.95	290,823,922.95	91.3	92.9
1,776,351,446.75	1,803,579,486.38	90.9	92.2
675,537,349.95	870,392,046.67	71.7	92.3
7,295,602.00	7,295,602.00	100.0	100.0
128,385,666.00	128,385,666.00	98.2	98.2
5,272,694.70	10,863,789.00	6.8	13.9
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
132,872,936.50	132,872,936.50	96.8	96.8
1,447,790,196.20	1,637,162,973.30	55.5	62.7
42,277,047.29	59,238,050.20	69.3	97.1
582,520.00	582,520.00	100.0	100.0
71,560,285.69	71,560,285.69	22.8	22.8
647,830,318.25	667,938,049.48	87.0	89.7
19,667,870,161.08	20,729,107,858.92	85.4	90.0

Por classificação orgânica

	2023	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/12/2023
	a	b
Polícia Judiciária	156,013,800.00	167,059,800.00
Direcção dos Serviços de Finanças	980,333,600.00	1,143,047,077.97
Direcção dos Serviços de Identificação	44,500,000.00	44,500,000.00
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	252,780,000.00	252,780,000.00
Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	265,250,000.00	254,204,000.00
Gabinete de Comunicação Social	1,631,800.00	1,631,800.00
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	4,500,000.00	4,500,000.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	103,179,100.00	103,179,100.00
Serviços de Polícia Unitários	36,000,000.00	36,000,000.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	81,600,000.00	60,339,400.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	4,746,300.00	4,746,300.00
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40
Instituto Cultural	180,871,700.00	180,871,700.00
Instituto do Desporto	72,266,700.00	72,266,700.00
Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	694,481,100.00	842,062,100.00
Dir. dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	303,400,000.00	222,097,171.60
Direcção dos Serviços Correccionais	473,258,800.00	569,576,406.54
Serviços de Alfândega da RAEM	663,455,400.00	663,455,400.00
Dir. dos Ser. de Edu. e de Desen. da Juventude	41,870,000.00	41,870,000.00
Direcção dos Serviços de Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
Serviços de Saúde	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00
Instituto de Acção Social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00
Instituto de Habitação	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00
Autoridade de Aviação Civil	0.00	42,112,000.00
Universidade Politécnica de Macau	181,497,200.00	181,497,200.00
Universidade de Macau	313,021,600.00	313,021,600.00
Instituto de Formação Turística de Macau	77,400,000.00	71,617,500.00
Comissariado da Auditoria	19,541,600.00	19,541,600.00

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
123,230,587.84	126,015,673.85	73.8	75.4
1,092,686,807.32	1,141,604,393.42	95.6	99.9
38,673,026.50	38,673,026.50	86.9	86.9
142,181,472.68	233,020,719.41	56.2	92.2
159,203,357.00	206,603,357.00	62.6	81.3
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
4,387,511.98	4,430,000.00	97.5	98.4
98,281,277.60	102,679,663.60	95.3	99.5
0.00	0.00	0.0	0.0
28,038,749.28	29,244,450.03	46.5	48.5
961,108,939.60	1,310,163,842.62	69.6	94.9
4,574,279.05	4,632,662.25	96.4	97.6
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
8,483,673,363.01	8,645,759,348.45	97.3	99.1
109,689,180.46	115,286,672.02	60.6	63.7
64,989,824.69	65,505,998.30	89.9	90.6
635,161,025.74	636,271,714.49	75.4	75.6
188,563,922.34	212,932,092.35	84.9	95.9
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
573,765,239.37	580,879,907.35	86.5	87.6
18,252,370.00	37,733,045.00	43.6	90.1
2,286,655.10	2,286,655.10	51.0	51.0
1,583,139,030.09	1,789,917,635.14	55.4	62.6
769,768,682.29	770,834,273.21	75.1	75.2
3,251,050,536.84	3,267,720,207.40	99.5	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
152,894,258.87	170,006,472.89	84.2	93.7
285,775,259.95	290,823,922.95	91.3	92.9
48,518,556.00	50,537,182.00	67.7	70.6
18,906,572.98	19,213,084.78	96.8	98.3

Por classificação orgânica

	2023	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/12/2023
	a	b
Gabinete do Procurador do Ministério Público	14,558,700.00	14,558,700.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	129,464,600.00	132,464,600.00
Comissariado contra a Corrupção	19,620,000.00	19,170,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	239,634,000.00	311,366,083.00
Total	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
14,521,491.67	14,558,602.00	99.7	100.0
123,849,044.76	131,327,226.20	93.5	99.1
6,480,000.00	6,480,000.00	33.8	33.8
271,246,595.33	301,288,506.47	87.1	96.8
19,667,870,161.08	20,729,107,858.92	85.4	90.0

Por classificação económica

	2023	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/12/2023
	a	b
Terrenos	541,177,700.00	161,258,157.67
Habitacões	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40
Edifícios e estabelecimentos	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50
Estradas e pontes, e canais de navegação	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15
Terminais marítimos	4,184,100.00	4,381,271.60
Aeroporto	0.00	42,112,000.00
Outros - Bens imóveis	84,793,400.00	67,918,400.00
Transportes e meios de transportes	1,220,810,100.00	957,753,809.45
Material de segurança	411,359,500.00	541,376,500.00
Material médico e clínico	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12
Artigos de habitação	18,159,800.00	13,106,763.20
Material fabril e de restaurante	107,146,000.00	161,968,566.35
Mobiliás	812,000.00	4,812,000.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	362,631,100.00	396,285,900.00
Artesanato e colecções	1,500,000.00	1,500,000.00
Outros - Bens móveis	125,827,600.00	130,796,998.00
Software e direitos	405,862,300.00	391,325,580.00
Outros	300,534,000.00	261,387,812.10
Total	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

Por classificação económica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
158,027,525.57	158,188,984.89	98.0	98.1
4,571,131,547.08	4,590,002,821.90	94.6	95.0
5,431,794,091.21	5,940,559,589.52	83.4	91.2
7,031,131,191.19	7,185,099,690.11	96.7	98.8
4,372,862.45	4,372,862.45	99.8	99.8
0.00	0.00	0.0	0.0
44,893,822.29	62,840,395.20	66.1	92.5
918,880,182.05	932,531,109.06	95.9	97.4
325,207,434.01	326,163,209.98	60.1	60.2
207,288,087.31	364,763,048.20	16.2	28.5
11,474,272.20	11,474,272.20	87.5	87.5
120,659,354.80	125,039,354.80	74.5	77.2
1,540,694.00	2,622,754.00	32.0	54.5
276,077,067.92	347,418,468.18	69.7	87.7
0.00	0.00	0.0	0.0
64,039,805.57	73,287,124.00	49.0	56.0
246,102,769.09	345,411,555.09	62.9	88.3
255,249,454.34	259,332,619.34	97.7	99.2
19,667,870,161.08	20,729,107,858.92	85.4	90.0

Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/12/2023 b
1-00 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	858,237,000.00	932,008,728.00
1-01 Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	858,237,000.00	932,008,728.00
2-00 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	2,263,808,700.00	2,521,471,806.54
2-01 Comando	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 Polícia e alfândega	1,114,282,000.00	1,272,909,000.00
2-03 Bombeiros	115,931,700.00	116,100,200.00
2-04 Protecção civil	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 Justiça e ordem	467,336,200.00	469,886,200.00
2-06 Correccão	473,258,800.00	569,576,406.54
3-00 EDUCAÇÃO	625,347,800.00	619,565,300.00
3-02 Ensino	625,347,800.00	619,565,300.00
4-00 SAÚDE	2,875,340,600.00	2,855,465,255.00
4-01 Admin., regulamentação e investigação	7,320,000.00	22,916,655.00
4-02 Cuidados de saúde	2,868,020,600.00	2,832,548,600.00
5-00 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00
5-02 Apoio social	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00
6-00 HABITAÇÃO	3,727,514,200.00	3,798,831,700.00
6-01 Admin., regulamentação e investigação	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 Habitação pública	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
868,186,406.99	922,863,497.66	93.2	99.0
868,186,406.99	922,863,497.66	93.2	99.0
1,967,924,536.50	2,000,511,474.96	78.0	79.3
24,210,000.00	24,315,000.00	42.5	42.7
1,035,134,858.26	1,043,213,051.54	81.3	82.0
104,077,500.00	104,077,500.00	89.6	89.6
0.00	0.00	0.0	0.0
393,989,435.50	408,688,199.28	83.8	87.0
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
505,440,444.82	549,100,622.84	81.6	88.6
505,440,444.82	549,100,622.84	81.6	88.6
1,581,904,615.24	1,786,508,629.79	55.4	62.6
4,954,155.00	8,557,935.00	21.6	37.3
1,576,950,460.24	1,777,950,694.79	55.7	62.8
769,768,682.29	770,834,273.21	75.1	75.2
769,768,682.29	770,834,273.21	75.1	75.2
3,779,436,732.52	3,796,543,984.09	99.5	99.9
116,340,309.63	116,393,305.40	99.0	99.0
3,663,096,422.89	3,680,150,678.69	99.5	100.0

Por classificação funcional

	2023 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/12/2023 b
7-00 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.	334,053,200.00	300,916,728.40
7-01 Cultura	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 Desporto e recreio	129,929,700.00	113,543,228.40
7-04 Meteorologia e geofísica	21,620,000.00	4,870,000.00
7-06 Comunicação social	1,631,800.00	1,631,800.00
8-00 SERVIÇOS ECONÓMICOS	10,527,594,100.00	10,977,825,802.60
8-01 Admin., regulamentação e investigação	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 Instalações básicas	1,026,972,700.00	889,522,460.03
8-05 Transportes	6,983,949,000.00	7,621,859,494.67
8-08 Turismo	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 Protecção ambiental	1,579,122,300.00	1,374,923,822.03
8-12 Ciências e tecnologias	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 Outros	415,034,200.00	580,050,125.87
Total	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/12/2023	Valor cabimentado até 31/12/2023	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
200,250,544.13	222,072,168.66	66.5	73.8
109,689,180.46	115,286,672.02	60.6	63.7
84,672,051.69	100,853,696.64	74.6	88.8
4,757,511.98	4,800,000.00	97.7	98.6
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
9,994,958,198.59	10,680,673,207.71	91.0	97.3
142,181,472.68	233,020,719.41	56.2	92.2
828,868,786.48	865,045,277.84	93.2	97.2
7,332,928,031.30	7,490,919,234.58	96.2	98.3
2,286,655.10	2,286,655.10	51.0	51.0
954,821,319.60	1,303,876,222.62	69.4	94.8
159,203,357.00	206,603,357.00	62.6	81.3
574,668,576.43	578,921,741.16	99.1	99.8
19,667,870,161.08	20,729,107,858.92	85.4	90.0



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO III

4.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2023

PIDDA - PROJECTOS COM ALTERAÇÕES DO PRAZO DE EXECUÇÃO

(COMPARAÇÃO ENTRE O 3.º TRIMESTRE E O
4.º TRIMESTRE DE 2023)

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Anexo III

PIDDA do 4.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução
 (comparação entre o 3.º e o 4.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no 4.º trimestre	Data de conclusão prevista no 3.º trimestre	Varição
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Construção de Vias Públicas e Rede de Drenagem na Zona A dos Novos Aterros Urbanos	76,779,972.95	2028	2025	3 anos
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha Leste do Metro Ligeiro	1,608,531,535.07	2028	2027	1 ano
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Serviços de Consultadoria, Verificação e Apreciação do Sistema de Metro Ligeiro	7,066,800.00	2024	2023	1 ano
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha da Taipa do Metro Ligeiro	500,000.00	2024	2023	1 ano
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra de Construção da Passagem Superior para Peões na Avenida de Venceslau de Moraes	258,000.00	2024	2023	1 ano
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Via de Acesso (A3) entre a Zona 'A' dos Novos Aterros Urbanos e Península de Macau	50,500.00	2027	2026	1 ano
7	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Via de Acesso A2 entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e Península de Macau	83,158,360.00	2024	2025	-1 ano
8	Direcção dos Serviços de Obras Públicas / Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	237,675,809.53	2027	2024	3 anos
9	Polícia Judiciária	Aumento de equipamento auxiliar para investigação criminal - 2021	4,926,800.00	2024	2023	1 ano
10	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de construção do espaço recreativo para crianças na Avenida Marginal do Lam Mau	20,000.00	2024	2023	1 ano
11	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Obras de alargamento do Centro de Computação em Nuvem	41,250,000.00	2025	2024	1 ano










Anexo III

PIDDA do 4.º trimestre do ano económico de 2023 - Projectos com alteração do prazo de execução
 (comparação entre o 3.º e o 4.º trimestres de 2023)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão		Variação
				previsão no 4.º trimestre	previsão no 3.º trimestre	
12	Instituto de Habitação	Obra de reconstrução do edifício da sede do Instituto de Habitação	117,552,000.00	2026	2025	1 ano
13	Instituto de Acção Social	Edifício de Instalações Sociais , no Lote A8 da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	2,537,300.00	2029	2028	1 ano
14	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Vias do lado oeste da Zona A dos Novos Aterros Urbanos - obra de assentamento de condutas de abastecimento público de água canalizada	20,482,900.00	2024	2023	1 ano
15	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Ampliação e reordenamento do Reservatório de Seac Pai Van	400,000.00	2027	2026	1 ano
16	Serviços de Saúde	Obras de Melhoramento das Instalações de Centro Hospitalar Conde de S. Januário	24,275,000.00	2024	2023	1 ano
17	Universidade de Macau	Obras de construção de pisos adicionais nos Colégios Residenciais W11 e W12 da Universidade de Macau	24,830,000.00	2025	2024	1 ano
18	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Garantia inteligente	165,210,000.00	2025	2024	1 ano
19	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Prevenção e combate inteligente a incêndio	7,572,700.00	2025	2024	1 ano
20	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Segurança inteligente	5,500,000.00	2025	2024	1 ano
21	Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	Serviços de Alfândega Inteligentes	58,650,000.00	2023	2024	-1 ano





澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO IV

PLANO DE INVESTIMENTOS E DESPESAS DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2024

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a vertical line at the top, a signature, a checkmark, a signature, a signature, a signature, and a signature.

Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

Relatório da Execução Orçamental no 1.º trimestre do ano económico de 2024



Abril 2024

DSF

Página em branco

Introdução

De acordo com o disposto na alínea 2) do artigo 45.º da Lei n.º 15/2017, Lei de enquadramento orçamental, o Governo da RAEM deve entregar à Assembleia Legislativa, no prazo de 30 dias após o termo de cada trimestre, o Relatório da Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (doravante designado por PIDDA). Por este motivo, ao abrigo do n.º 2 do artigo 47.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental, elaborou-se o Relatório da Execução Orçamental do PIDDA no 1.º trimestre do ano de 2024.

Desagrega-se o presente relatório em duas partes, a primeira parte compreende a descrição sumária do orçamento do PIDDA, na qual se apresentam, principalmente, por escrito e por mapas, as informações e os dados essenciais do orçamento do PIDDA, de modo a revelar a execução orçamental global; a segunda parte compreende as informações sobre a execução concreta dos projectos, sendo que essas informações permitem um conhecimento pormenorizado em relação à execução de diversos projectos, ao prazo estimado para a execução, ao montante total do orçamento desses projectos, etc.

Primeira parte

O orçamento inicial do PIDDA, em 2024, cifrou-se em 17 418,29 milhões de patacas e o orçamento autorizado em 17 478,08 milhões de patacas, sendo a despesa efectiva de 5 204,97 milhões de patacas, traduzindo-se numa taxa de execução orçamental de 29,8%¹, quanto às verbas cabimentadas, foram de 13 877,68 milhões de patacas, com uma taxa de utilização orçamental de 79,4%².

Em termos de programas, o da “Habitação Pública” registou o montante orçamental mais elevado, com um orçamento autorizado no valor de 6 307,32 milhões de patacas, sendo, no qual, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros” com o valor do orçamento autorizado mais elevado em 708,46 milhões de patacas, a sua taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental foram, respectivamente, de 32,6% e de 61,8%; seguidamente, a “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros” com um orçamento autorizado no valor de 680,93 milhões de patacas, sendo a taxa de execução orçamental e a de utilização orçamental de 30,0% e de 75,0% respectivamente.

Em termos orgânicos, o Instituto de Habitação assumiu o maior peso do orçamento do PIDDA, com o orçamento autorizado de 5 526,14 milhões de patacas, perfazendo 31,6% do orçamento total, sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental, respectivamente, de 33,1% e 81,0%; de seguida, foram a Direcção dos Serviços de Obras Públicas e os Serviços de Saúde, o orçamento autorizado da Direcção dos Serviços de Obras Públicas situou-se em 4 945,00 milhões


¹ Despesa efectiva/ orçamento autorizado

² Verbas cabimentadas /orçamento autorizado

de patacas, representando 28,3% do orçamento total, bem como 43,4% e 91,0% relativos às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; e, o orçamento autorizado dos Serviços de Saúde foi de 1 298,45 milhões de patacas, representando 7,4% do orçamento total, e sendo as taxas de execução orçamental e de utilização orçamental de 8,2% e de 52,3% respectivamente.

Por classificação económica, a das “Habitações” assumiu o maior peso, com o orçamento autorizado de 6 396,62 milhões de patacas, representando 36,6% do orçamento total, bem como 34,9% e 81,7% respeitantes às taxas de execução orçamental e de utilização orçamental; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros”, da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros” e dentre outros; seguindo-se, a das “Estradas e pontes, e canais de navegação”, com o orçamento autorizado no valor de 4 211,13 milhões de patacas, representando 24,1% do orçamento total, e as suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 32,1% e de 86,8%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”, da “Quarta ponte Macau - Taipa”, etc.


Distribuição do orçamento autorizado por classificação económica

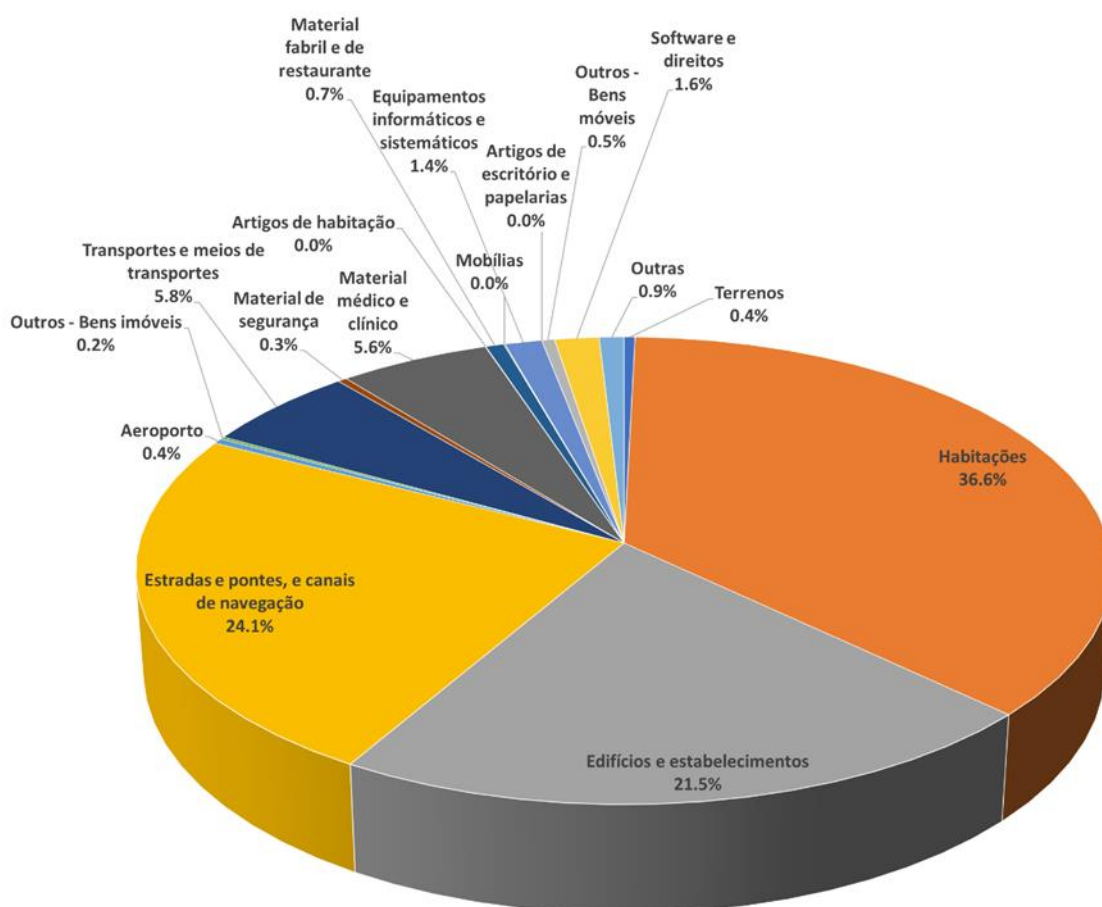

Quanto à classificação funcional, a dos “Serviços económicos” ocupou o maior peso, o seu orçamento autorizado foi de 6 916,66 milhões de patacas, registando uma proporção de 39,6% do orçamento total, bem como a taxa de execução orçamental de 33,1% e a de utilização orçamental de 84,6%; sendo, na qual, incluídos principalmente os projectos da “Linha Leste do Metro Ligeiro”, da “Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos”, etc.; seguindo-se a da “Habitação”, registou-se o orçamento autorizado no valor de 5 891,81 milhões de patacas, representando 33,7% do orçamento total, as

suas taxas de execução orçamental e de utilização orçamental foram, respectivamente, de 34,3% e de 82,0%; sendo, na qual, incluídos essencialmente os projectos da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A2 da Zona A dos Novos Aterros”, da “Empreitada de construção de habitação pública no Lote A4 da Zona A dos Novos Aterros”, etc.

Distribuição do orçamento autorizado por classificação funcional

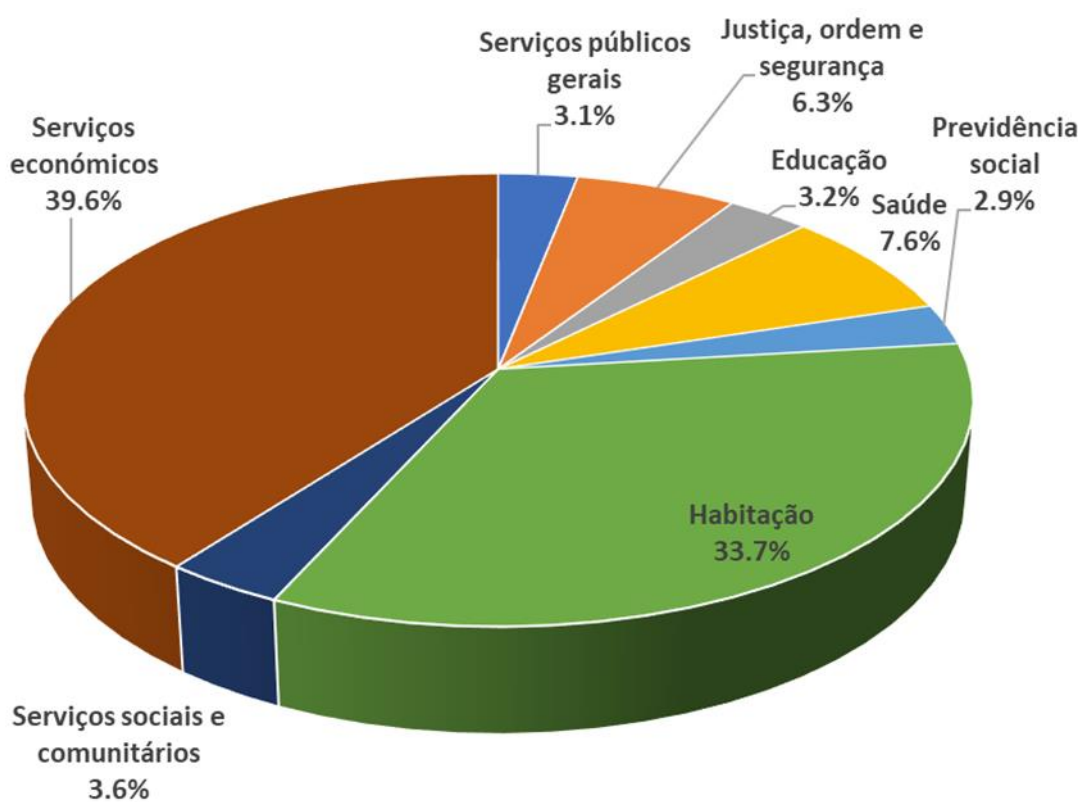

Por programa

	2024	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/03/2024
	a	b
Obra de instalações públicas	2,098,534,200.00	2,120,534,200.00
Sistema Transportes Colectivos Urbanos de Macau	1,968,157,700.00	1,968,157,700.00
Habitação Pública	6,307,322,100.00	6,307,322,100.00
Estradas e pontes, taludes e canais de navegação	1,880,067,100.00	1,880,067,100.00
Novo campus da UM na Ilha de Hengqin	214,227,800.00	214,227,800.00
Obras de instalações de serviços	1,344,409,400.00	1,381,042,400.00
Equipamentos de Serviços	575,583,200.00	575,583,200.00
Equipamento de instalações públicas	2,574,100.00	2,574,100.00
Equipamentos médicos	65,921,000.00	65,921,000.00
Construção do novo estabelecimento prisional	179,409,100.00	180,570,105.68
Meios de transporte	106,592,000.00	106,592,000.00
Construção do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	1,229,286,900.00	1,229,286,900.00
Instalação para água	3,773,900.00	3,773,900.00
Policimento inteligente em nuvem	32,450,000.00	32,450,000.00
Construção da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	1,409,980,600.00	1,409,980,600.00
Total	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68

Por programa

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
354,424,036.88	1,520,734,339.73	16.7	71.7
1,134,336,506.50	1,929,678,080.56	57.6	98.0
2,233,605,654.54	5,124,839,864.50	35.4	81.3
206,966,696.73	1,553,007,196.97	11.0	82.6
23,812,768.60	158,130,624.10	11.1	73.8
477,183,385.54	1,086,912,573.18	34.6	78.7
998,525.00	378,410,517.05	0.2	65.7
2,574,006.00	2,574,006.00	100.0	100.0
0.00	6,311,094.30	0.0	9.6
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
0.00	99,556,000.00	0.0	93.4
104,557,548.69	643,744,260.97	8.5	52.4
331,412.90	773,554.90	8.8	20.5
0.00	0.00	0.0	0.0
629,778,637.64	1,211,270,771.15	44.7	85.9
5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8	79.4

Por classificação orgânica

	2024	Orçamento
	Orçamento	autorizado
	Inicial	até 31/03/2024
	a	b
Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00
Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	587,792,300.00
Direcção dos Serviços de Identificação	34,700,000.00	34,700,000.00
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	123,776,400.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	21,996,000.00
Dir. dos Serviços de Administração e Função Pública	303,598,800.00	303,598,800.00
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	92,296,800.00
Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,300,000.00
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	850,000,000.00	850,000,000.00
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	4,945,004,200.00	4,945,004,200.00
Instituto Cultural	252,196,700.00	274,196,700.00
Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00
Dir. dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	415,084,500.00	415,084,500.00
Dir. dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	288,080,000.00
Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	180,570,105.68
Serviços de Alfândega da RAEM Especial de Macau	160,429,100.00	160,429,100.00
Dir. dos Ser. de Edu. e de Desen. da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00
Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00
Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00
Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00
Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00
Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00
Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00
Instituto de Formação Turística de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00
Gabinete do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00
Gab. do Presidente do Tribunal da Última Instância	156,013,400.00	156,013,400.00

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
0.00	31,590,125.97	0.0	59.1
143,632,624.79	496,670,564.86	24.4	84.5
0.00	6,703,125.00	0.0	19.3
998,525.00	123,776,216.22	0.8	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	95,770,351.70	0.0	31.5
0.00	8,907,978.86	0.0	99.0
0.00	86,230,691.00	0.0	93.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	47,051,011.80	0.0	61.7
259,738,527.80	682,751,002.05	30.6	80.3
248,000.00	1,328,000.00	18.7	100.0
2,146,498,560.92	4,500,012,958.59	43.4	91.0
2,321,500.00	30,061,996.00	0.8	11.0
9,252,461.83	181,485,070.76	5.1	99.9
321,712,904.69	373,196,371.66	77.5	89.9
26,178,172.13	248,635,384.10	9.1	86.3
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
5,416,175.15	145,596,266.95	3.4	90.8
0.00	24,511,000.00	0.0	85.1
106,159,968.19	679,201,250.27	8.2	52.3
224,225,558.05	383,198,726.59	43.9	75.1
1,827,652,303.79	4,473,945,665.40	33.1	81.0
0.00	0.00	0.0	0.0
17,050,167.76	187,095,229.52	7.4	81.0
23,812,768.60	158,130,624.10	11.1	73.8
6,358,636.53	89,127,666.66	7.0	98.4
4,630,224.20	23,369,190.20	19.8	100.0
23,921,934.09	147,582,650.76	15.3	94.6

Por classificação orgânica

	2024 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/03/2024 b
Comissariado Contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00
Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	673,155,500.00
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – C. Méd. de Macau do Peking Union Med. College Hospital	40,000,000.00	40,000,000.00
Total	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68

Por classificação orgânica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
0.00	3,682,100.00	0.0	18.4
18,760,165.50	486,331,664.39	2.8	72.2
0.00	0.00	0.0	0.0
5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8	79.4

Por classificação económica

	2024 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/03/2024 b
Terrenos	70,811,400.00	70,921,197.65
Habitacões	6,395,282,400.00	6,396,616,400.00
Edifícios e estabelecimentos	3,683,634,400.00	3,750,763,208.03
Estradas e pontes, e canais de navegação	4,548,362,000.00	4,211,125,204.17
Aeroporto	63,168,000.00	63,168,000.00
Outros - Bens imóveis	35,865,900.00	29,157,610.00
Transportes e meios de transportes	689,735,000.00	1,014,437,645.33
Material de segurança	59,137,600.00	59,137,600.00
Material médico e clínico	1,012,175,400.00	981,457,962.09
Artigos de habitação	3,467,400.00	3,467,400.00
Material fabril e de restaurante	118,143,700.00	118,143,700.00
Mobílias	6,689,200.00	7,771,260.00
Equipamentos informáticos e sistemáticos	226,563,500.00	240,725,300.00
Artesanato e colecções	202,800.00	202,800.00
Outros - Bens móveis	77,029,600.00	82,526,030.41
Software e direitos	289,501,000.00	287,897,600.00
Outros	138,519,800.00	160,564,188.00
Total	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68

Por classificação económica

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
11,740,411.64	65,094,089.51	16.6	91.8
2,233,614,478.54	5,223,152,839.50	34.9	81.7
937,565,593.58	2,909,497,980.99	25.0	77.6
1,353,488,135.18	3,654,952,899.92	32.1	86.8
0.00	0.00	0.0	0.0
331,412.90	4,139,264.90	1.1	14.2
639,975,000.00	976,407,652.37	63.1	96.3
0.00	9,351,125.97	0.0	15.8
1,243,116.85	409,716,757.49	0.1	41.7
0.00	0.00	0.0	0.0
20,332,768.60	62,625,903.60	17.2	53.0
0.00	1,346,247.00	0.0	17.3
2,574,006.00	175,939,725.63	1.1	73.1
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	71,995,430.86	0.0	87.2
2,800,000.00	161,059,470.00	1.0	55.9
1,309,400.00	152,396,594.00	0.8	94.9
5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8	79.4

Por classificação funcional

	2024 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/03/2024 b
1-00 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	500,194,100.00	536,827,100.00
1-01 Órg. adm. leg., ass. de natu. monet.e finan.	500,194,100.00	536,827,100.00
2-00 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,094,812,600.00	1,095,973,605.68
2-01 Comando	20,387,300.00	20,387,300.00
2-02 Polícia e alfândega	501,026,700.00	501,026,700.00
2-03 Bombeiros	10,500,000.00	10,500,000.00
2-04 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00
2-05 Justiça e ordem	379,839,500.00	379,839,500.00
2-06 Correccão	179,409,100.00	180,570,105.68
3-00 EDUCAÇÃO	564,528,200.00	564,528,200.00
3-02 Ensino	564,528,200.00	564,528,200.00
4-00 SAÚDE	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00
4-01 Admin., regulamentação e investigação	19,670,000.00	19,670,000.00
4-02 Cuidados de saúde	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00
5-00 PREVIDÊNCIA SOCIAL	510,316,800.00	510,316,800.00
5-02 Apoio social	510,316,800.00	510,316,800.00
6-00 HABITAÇÃO	5,891,813,100.00	5,891,813,100.00
6-01 Admin., regulamentação e investigação	94,807,800.00	94,807,800.00
6-02 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
123,551,529.96	449,521,979.61	23.0	83.7
123,551,529.96	449,521,979.61	23.0	83.7
379,161,813.95	937,346,720.17	34.6	85.5
19,208,640.32	20,272,792.40	94.2	99.4
294,995,871.07	447,782,948.51	58.9	89.4
0.00	8,399,998.00	0.0	80.0
0.00	0.0	0.0	0.0
28,552,158.29	299,157,882.93	7.5	78.8
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
47,221,572.89	458,864,520.28	8.4	81.3
47,221,572.89	458,864,520.28	8.4	81.3
106,159,968.19	677,174,113.27	7.9	50.7
0.00	13,222,500.00	0.0	67.2
106,159,968.19	663,951,613.27	8.1	50.5
224,225,558.05	383,198,726.59	43.9	75.1
224,225,558.05	383,198,726.59	43.9	75.1
2,020,255,282.39	4,833,650,026.91	34.3	82.0
10,875,185.90	92,008,889.00	11.5	97.0
2,009,380,096.49	4,741,641,137.91	34.7	81.8

Por classificação funcional

	2024 Orçamento Inicial a	Orçamento autorizado até 31/03/2024 b
7-00 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNIT.	604,599,600.00	626,599,600.00
7-01 Cultura	252,196,700.00	274,196,700.00
7-02 Desporto e recreio	343,402,900.00	343,402,900.00
7-04 Meteorologia e geofísica	9,000,000.00	9,000,000.00
8-00 SERVIÇOS ECONÓMICOS	6,916,656,400.00	6,916,656,400.00
8-01 Admin., regulamentação e investigação	123,776,400.00	123,776,400.00
8-04 Instalações básicas	1,769,919,900.00	1,813,150,964.76
8-05 Transportes	3,758,839,600.00	3,717,108,535.24
8-10 Protecção ambiental	849,464,000.00	847,964,000.00
8-12 Ciências e tecnologias	303,598,800.00	303,598,800.00
8-99 Outros	111,057,700.00	111,057,700.00
Total	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68

Por classificação funcional

(Unidade: MOP)

Despesa efectiva até 31/03/2024	Valor cabimentado até 31/03/2024	Taxa de execução orçamental (%)	Taxa de utilização orçamental (%)
c	d	e=c/b	f=d/b
11,573,961.83	289,720,040.36	1.8	46.2
2,321,500.00	30,061,996.00	0.8	11.0
9,252,461.83	250,750,065.50	2.7	73.0
0.00	8,907,978.86	0.0	99.0
2,292,824,636.03	5,848,199,854.55	33.1	84.6
998,525.00	123,776,216.22	0.8	100.0
671,985,319.36	1,630,234,466.87	37.1	89.9
1,336,390,669.04	3,248,284,381.46	36.0	87.4
259,738,527.80	680,715,002.05	30.6	80.3
0.00	95,770,351.70	0.0	31.5
23,711,594.83	69,419,436.25	21.4	62.5
5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8	79.4



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO V

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PIDDA

1.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2024

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O SERVIÇO PROPONENTE

Handwritten signature and vertical text on the right margin.

Anexo V

Execução orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 - Classificação segundo o serviço proponente

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da cabimentação orçamental	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	248,000.00	1,328,000.00	18.7%	100.0%	2	-
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	4,945,004,200.00	4,945,004,200.00	2,146,498,560.92	4,500,012,958.59	43.4%	91.0%	40	6
Instituto Cultural	252,196,700.00	274,196,700.00	2,321,500.00	30,061,996.00	0.8%	11.0%	10	6
Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00	-	31,590,125.97	0.0%	59.1%	6	2
Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	673,155,500.00	18,760,165.50	486,331,664.39	2.8%	72.2%	32	3
Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,300,000.00	-	47,051,011.80	0.0%	61.7%	2	-
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00	-	8,907,978.86	0.0%	99.0%	1	-
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	303,598,800.00	303,598,800.00	-	95,770,351.70	0.0%	31.5%	7	2
Direcção dos Serviços de Identificação	34,700,000.00	34,700,000.00	-	6,703,125.00	0.0%	19.3%	3	2
Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00	1,827,652,303.79	4,473,945,665.40	33.1%	81.0%	25	5

[Handwritten signatures and initials]

Anexo V

**Execução orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 -
Classificação segundo o serviço proponente**







Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	92,296,800.00	-	86,230,691.00	0.0%	93.4%	2	-
Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00	224,225,558.05	383,198,726.59	43.9%	75.1%	1	-
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	288,080,000.00	26,178,172.13	248,635,384.10	9.1%	86.3%	11	2
Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	587,792,300.00	143,632,624.79	496,670,564.86	24.4%	84.5%	9	4
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00	-	24,511,000.00	0.0%	85.1%	1	-
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	156,013,400.00	156,013,400.00	23,921,934.09	147,582,650.76	15.3%	94.6%	3	-
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	-	21,996,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	123,776,400.00	998,525.00	123,776,216.22	0.8%	100.0%	1	-
Comissariado Contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00	-	3,682,100.00	0.0%	18.4%	1	-
Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	106,159,968.19	679,201,250.27	8.2%	52.3%	10	2

[Handwritten signatures and initials]

Anexo V

**Execução orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 -
Classificação segundo o serviço proponente**

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da execução orçamental	Taxa de execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos	N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero
Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00	23,812,768.60	158,130,624.10	11.1%	73.8%	17	4
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	415,084,500.00	415,084,500.00	321,712,904.69	373,196,371.66	77.5%	89.9%	8	2
Instituto de Formação Turística de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00	6,358,636.53	89,127,666.66	7.0%	98.4%	1	-
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	160,429,100.00	160,429,100.00	5,416,175.15	145,596,266.95	3.4%	90.8%	7	-
Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00	17,050,167.76	187,095,229.52	7.4%	81.0%	1	-
Gabinete do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00	4,630,224.20	23,369,190.20	19.8%	100.0%	1	-
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	850,000,000.00	850,000,000.00	259,738,527.80	682,751,002.05	30.6%	80.3%	14	4
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	180,570,105.68	36,405,144.27	161,733,098.33	20.2%	89.6%	1	-
Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2

Anexo V

**Execução orçamental do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 -
Classificação segundo o serviço proponente**

Serviço proponente	Orçamento inicial	Orçamento autorizado	Despesa efectiva	Valor da execução orçamental	Taxa de utilização orçamental	Taxa de utilização orçamental	N.º de projectos com taxa de utilização orçamental de zero
Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00	9,252,461.83	181,485,070.76	5.1%	99.9%	2
Total	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68	5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8%	79.4%	49

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água executaram, em conjunto, a Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental executaram, em conjunto, a Empreitada de Construção da Galeria técnica no arruamento central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO VI

PROJECTOS DO PIDDA DO 1.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2024 COM TAXA DE UTILIZAÇÃO ORÇAMENTAL DE ZERO

d
B
f
張
黃
任
林
梁
L
吳

Anexo VI**Projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024
com taxa de utilização orçamental de zero**

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Construção de Habitação Pública na Avenida Wai Long	5,000,000.00	4,776,000.00
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Travessia Pedonal ao longo da Avenida de Kwong Tung na Taipa	5,600,000.00	3,902,500.00
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Travessia Pedonal ao longo da Avenida de Ip Heng de Coloane	3,800,000.00	3,800,000.00
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Instalações de Protecção contra Inundações (Marés) e de Drenagem na Zona Marginal do Lado Oeste de Coloane, Macau	3,056,900.00	3,056,900.00
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel da Colina da Taipa Grande	1,905,000.00	2,903,000.00
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel Pedonal e Passagem Superior para Peões da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	900,000.00	900,000.00
7	Instituto Cultural	Design de interiores e obra de decoração do Edifício dos Arquivos Históricos do Governo	125,240,000.00	125,240,000.00
8	Instituto Cultural	Obras de restauro e revitalização dos n.ºs 23 e 25 do Porto Interior	17,000,000.00	17,000,000.00
9	Instituto Cultural	Obras de revitalização da Pátio da Eterna Felicidade	15,000,000.00	15,000,000.00
10	Instituto Cultural	Obras de revitalização parcial da antiga Fábrica de Panchões Iec Long	15,000,000.00	12,000,000.00
11	Instituto Cultural	Centro de Preservação e Transmissão do Património Cultural do Museu do Palácio Imperial em Macau	10,500,000.00	10,500,000.00
12	Instituto Cultural	Plano de obras de revitalização dos Estaleiros Navais de Lai Chi Yuen – 2.ª Fase	4,445,400.00	4,445,400.00

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

Anexo VI

Projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 com taxa de utilização orçamental de zero

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
13	Polícia Judiciária	Equipamentos dedicados às ciências forenses da Polícia Judiciária – 2024	10,250,000.00	10,250,000.00
14	Polícia Judiciária	Aumento de equipamentos auxiliares para investigação criminal – 2024	9,900,000.00	9,900,000.00
15	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização de vias públicas da zona do Porto Exterior e dos Novos Aterros do Lago Nam Van	19,000,000.00	19,000,000.00
16	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de optimização de vias públicas da zona de Coloane	5,000,000.00	5,000,000.00
17	Instituto para os Assuntos Municipais	Obra de remodelação do escritório do Edifício Toi Fai	8,000,000.00	4,000,000.00
18	Autoridade de Aviação Civil	Segundo Terminal do Aeroporto e Heliporto do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	63,168,000.00	63,168,000.00
19	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Obras de implementação de nuvem de recuperação de desastres	28,200,000.00	28,200,000.00
20	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Produtos de exposição da governação electrónica	20,000,000.00	20,000,000.00
21	Direcção dos Serviços de Identificação	Aquisição dos sistemas próprios da plataforma em nuvem	19,200,000.00	19,200,000.00
22	Direcção dos Serviços de Identificação	Criação da Sala de Arquivo da Direcção dos Serviços de Identificação	3,000,000.00	3,000,000.00
23	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B14 da Zona A dos Novos Aterros	3,954,000.00	3,954,000.00








Anexo VI**Projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024
com taxa de utilização orçamental de zero**


N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
24	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B16 da Zona A dos Novos Aterros	3,709,000.00	3,709,000.00
25	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B13 da Zona A dos Novos Aterros	3,618,000.00	3,618,000.00
26	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote B15 da Zona A dos Novos Aterros	3,310,000.00	3,310,000.00
27	Instituto de Habitação	Empreitada de construção de habitação pública no Lote A13 da Zona A dos Novos Aterros	3,303,000.00	3,303,000.00
28	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Estrada Flor de Lótus no Cotai - Obra de assentamento de condutas públicas de abastecimento de água	-	7,977,340.00
29	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	Trem Naval da DSAMA – Rebocador	7,036,000.00	7,036,000.00
30	Direcção dos Serviços de Finanças	Obra de remodelação das instalações sociais sitas no QR/C do Edifício Zhu Kuan	-	14,637,000.00
31	Direcção dos Serviços de Finanças	Sistema de contas da RAEM	7,200,000.00	7,200,000.00
32	Direcção dos Serviços de Finanças	Finanças inteligentes 1.ª fase	4,809,000.00	4,809,000.00
33	Direcção dos Serviços de Finanças	1.ª fase da "Plataforma de Informações sobre a Contratação Pública"	4,500,000.00	4,500,000.00
34	Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	Obra de remodelação das instalações da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais no Centro Golden Dragon	-	21,996,000.00

Handwritten signatures and initials in the right margin.

Anexo VI**Projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024
com taxa de utilização orçamental de zero**

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
35	Serviços de Saúde	Bloco Operatório Central do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas	17,700,000.00	17,700,000.00
36	Serviços de Saúde	Obras de remodelação de uma parte do 17.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fronteiriço Qingmao destinada aos Serviços de Saúde	4,620,000.00	4,997,783.00
37	Universidade de Macau	Obras de construção do Laboratório de Referência do Estado de Internet das Coisas para a Cidade Inteligente, localizado no 6.º andar do Edifício de Investigação Científica N21 da Universidade de Macau	18,000,000.00	13,550,000.00
38	Universidade de Macau	Equipamentos de ensaio de materiais e dispositivos quânticos para o Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais da Universidade de Macau	8,000,000.00	8,000,000.00
39	Universidade de Macau	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S27 da Universidade de Macau	5,850,000.00	5,850,000.00
40	Universidade de Macau	Serviços de Consultoria para as Obras de Acabamento e de Remodelação Interiores da Universidade de Macau	264,000.00	264,000.00
41	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Garantia inteligente	28,800,000.00	28,800,000.00
42	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	Instalação do Sistema de Videovigilância da Cidade de Macau (6.ª fase)	8,200,000.00	8,200,000.00
43	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Instalações de tratamento centralizado de resíduos alimentares	87,790,900.00	75,267,304.63

林



Anexo VI**Projectos do PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024
com taxa de utilização orçamental de zero**

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento inicial	Orçamento autorizado
44	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	47,662,000.00	46,392,950.00
45	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais a Sul do Porto Interior	17,800,000.00	17,800,000.00
46	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Obra de Construção de Armazém Temporário para Cinzas Volantes	10,980,000.00	10,980,000.00
47	Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do <i>Peking Union Medical College Hospital</i>	Centro Médico de Macau - Instalações e equipamentos	40,000,000.00	40,000,000.00
48	Serviços de Polícia Unitários	Vida da população inteligente	1,850,000.00	1,850,000.00
49	Serviços de Polícia Unitários	Protecção civil inteligente	1,800,000.00	1,800,000.00
Total			733,921,200.00	752,743,177.63

Handwritten signature and stamp in Chinese characters, including the name "李卓人" (Li Zhuo Ren).



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

ANEXO VII

1.º TRIMESTRE DO ANO ECONÓMICO DE 2024

PIDDA - PROJECTOS COM ALTERAÇÕES DO PRAZO DE EXECUÇÃO

(COMPARAÇÃO ENTRE O 4.º TRIMESTRE DE
2023 E O 1.º TRIMESTRE DE 2024)

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical line at the top, a signature, and several initials.

Anexo VII PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 - Projectos com alteração do prazo de execução
(comparação entre o 4.º trimestre de 2023 e o 1.º trimestre de 2024)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no 1.º trimestre de 2024	Data de conclusão prevista no 4.º trimestre de 2023	Variação
1	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Linha Leste do Metro Ligeiro	1,142,881,468.00	2031	2028	3 anos
2	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Empreitada de Concepção e Construção da viaduto Entre Zona A e Zona B dos Novos Aterros	75,138,724.63	2030	2027	3 anos
3	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Obra de Reordenamento da rede viária e de drenagem periférica da Estrada Flor de Lótus no Cotal	48,977,597.32	2025	2024	1 ano
4	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Túnel da Colina da Taipa Grande	2,903,000.00	2029	2028	1 ano
5	Direcção dos Serviços de Obras Públicas	Passagem superior para peões na Doca do Lam Mau	31,158,651.68	2024	2026	-2 anos
6	Direcção dos Serviços de Obras Públicas / Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Empreitada de construção da Galeria Técnica no Arruamento Central da Zona A dos Novos Aterros Urbanos	993,322,141.00	2024	2027	-3 anos
7	Instituto Cultural	Obras de concepção e remodelação das escolas do Conservatório de Macau	20,060,000.00	2025	2024	1 ano
8	Instituto para os Assuntos Municipais	Plano de Desenvolvimento do Parque de Seac Pai Van	7,650,000.00	2025	2024	1 ano
9	Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	Obras de alargamento do Centro de Computação em Nuvem	75,398,800.00	2024	2025	-1 ano

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Anexo VII PIDDA do 1.º trimestre do ano económico de 2024 - Projectos com alteração do prazo de execução
 (comparação entre o 4.º trimestre de 2023 e o 1.º trimestre de 2024)

N.º de ordem	Serviço proponente	Designação do projecto	Orçamento autorizado	Data de conclusão prevista no 1.º trimestre de 2024	Data de conclusão prevista no 4.º trimestre de 2023	Variação
10	Universidade de Macau	Obras de Construção da Residência de Docentes e Funcionários S32 da Universidade de Macau	32,767,000.00	2025	2024	1 ano
11	Universidade de Macau	Obras de Construção de Residências de Estudantes de Pós-Graduação da Universidade de Macau	700,000.00	2027	2026	1 ano
12	Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	Modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Coloane II	46,392,950.00	2036	2030	6 anos

