



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 公共財政事務跟進委員會

### 第 3/VII/2024 號報告書

事由：跟進《二零二三財政年度第四季度及二零二四財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》

#### 一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”

1 黃  
林  
梁  
王  
吳  
王  
陳



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

4. 委員會履行本身職責，於 2024 年 4 月 30 日召開會議以跟進《二零二三財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》，以及於 2024 年 6 月 18 日召開會議以跟進《二零二四財政年度第一季度投資計劃預算執行報告》。會後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。
5. 政府分別於 2024 年 6 月 24 日、7 月 4 日及 7 月 15 日就委員會所提出的問題提供了回覆及補充資料。
6. 於 2024 年 7 月 24 日委員會召開會議，分析及討論政府的回覆及補充資料，經討論後，決定再向政府送交跟進的問題清單，以釐清委員會的疑問。
7. 於 2024 年 8 月 8 日，政府送來上點相關問題的回覆。
8. 為確保社會能適時知悉上述兩季度「投資計劃」預算的執行情況，委員會按照收到的資料編製本份報告書。至於，有關第 7 點的政府回覆，待日後再作分析及討論。
9. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

## 二、跟進情況

### 二零二三財政年度第四季度「投資計劃」預算執行狀況

10. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。

1  
黃  
龍  
村  
吳  
七  
吳  
文  
王  
王



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

11. 委員會關注在 2023 年的第三季與第四季期間，下述 10 個項目最新估算金額變動的原因：

序號	項目名稱
1	新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程
2	完善新口岸污水截流管
3	輕軌東線項目
4	澳氹第四條跨海大橋
5	慕拉士大馬路公共房屋
6	輕軌石排灣線
7	新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程
8	大潭山隧道
9	離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程
10	離島醫療綜合體-設施設備

12. 政府回覆：

下述項目公共建設局在輸入 2023 年第四季度資料時出現錯誤，因此將在續後的季度預算執行報告作出調整，同時亦將成立監察小組，以加強覆核季度資料的輸入工作。調整後資料及變動原因：

項目名稱	百萬澳門元	
	政府首次提供的第四季度 項目預算金額	經修正後的第四季度 項目預算金額
完善新口岸污水截流管	782	366
輕軌東線項目	10,928	10,886

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

項目名稱	政府首次提供的第四季度 項目預算金額	經修正後的第四季度 項目預算金額
慕拉士大馬路公共房屋	2,018	1,879
輕軌石排灣線	2,819	2,729
大潭山隧道	1,930	2,059

### 新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程

因應工程項目「新城填海區 A 區共同管道及道路設計連建造工程 - 南區」的判給而作出估算金額調整。此外，由於工程拆分為 6 個項目而增加技術支援金額，以便進行該 6 個項目的技術支援服務。

### 澳氹第四條跨海大橋

根據統計暨普查局的物價指數上漲，工程須進行價格修訂，故最新估算金額出現變動。

### 新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程

第三季度與第四季度的估算金額有變動，是由於第三季度有 1.1 億元已計算於 2024 年度的預算開支內，但沒有於 2025 年度預計開支作出相應的調減，導致估算金額增加至 16.7 億元，故於第四季度的執行進度報告修正為 15.6 億元。

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa



### 離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程

項目工程於 2023 年完工並完成支付，按實際支付狀況調整估算金額。

### 離島醫療綜合體-設施設備

項目是為承擔離島醫療綜合體配置專業設施設備的費用，擬購置的設施設備因應實際狀況有所調整，項目估算金額隨之調整；因應部份設施設備購置費用較估價有所減少，同時，隨著離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的成立，部份設施設備由其自行購置，故項目估算金額有所減少。

13. 經比較政府提供的 2023 年第三季與第四季的資料，顯示下述 4 個項目預計的完成日期有所推遲，但在交來的資料內未有說明有關推遲完成的原因，委員會欲了解項目預計完成日期推遲的原因：

序號	項目名稱
1	輕軌顧問、驗證及審查服務
2	輕軌氹仔線
3	新城 A 區公共道路及排放網絡建造工程
4	仁伯爵綜合醫院設施改善工程

潘化林  
梁卓  
梁卓  
梁卓  
梁卓  
梁卓



14. 政府回覆：

**輕軌顧問、驗證及審查服務**

由於輕軌氹仔線延伸媽閣站於完成臨時接收後，仍有部份文件需要待 09003016-C651-系統獨立安全審查提交及作有關支付，因此完成日期推遲。

**輕軌氹仔線**

輕軌氹仔線已於 2019 年 9 月投入營運，各子系統及列車特殊零件按合同要求涉及不同時間的保固期服務，因此預計完成日期較計劃推遲。

**新城 A 區公共道路及排放網絡建造工程**

新城 A 區的基礎建設包括道路、下水道及共同管道，其開支由「新城 A 區公共道路及排放網絡建造工程」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」兩個項目承擔，「新城 A 區公共道路及排放網絡建造工程」項目立項時計劃建設新城 A 區東、南、西及北側的道路及下水道工程，因應 A 區共同管道項目正式開展，將 A 區的道路及下水道的建設範圍重新作出分區，部分範圍的道路及下水道工程的建設範圍納入「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」項目。2023 年第三季預計完工期至 2025 年實屬輸入數據時筆誤，應維持原執行期至 2028 年。

黃龍林  
梁卓人  
李卓人  
李卓人  
李卓人



### 仁伯爵綜合醫院設施改善工程

項目包括鍋爐房設施設備更新工程、相應的監察和設計服務，更新工程於 2022 年 5 月進行工程委託，工期為 525 曆天，原預計 2023 年第四季完成，承建商因應 2022 年 6 月至 2023 年 9 月期間全日降雨量達 20mm 以上、黃色或紅色暴雨警告，或受 8 號風球等天氣影響施工安全及施工品質，要求延長施工期 57 天，需延至 2024 年完成，現時施工、培訓及測試已基本完成，將進行臨時驗收工作，較計劃有所推遲。

### 二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算執行狀況

15. 委員會關注 2023 年第四季度「輕軌東線項目」的項目預算估算為 109.3 億元，而 2024 年第一季度的項目預算估算增加至 137.8 億元。為此，要求政府就項目預算增加的具體原因、最新的計劃方案，以及預計進度作出說明。

16. 政府回覆：

由於 2024 年第一季新增了輕軌東線行車系統判給，故 2024 年第一季的項目最新估算金額高於 2023 年第四季的項目估算金額。尚須指出的是，本項目概算金額約為 314 億元，現時的估算金額 137.8 億元仍遠低於概算金額，沒有出現超支情況。

輕軌東線土木工程已於 2023 年判給及啟動工程，預計於 2028 年完工，而行車系統也於 2024 年第一季判給，預計至 2029 年上半年完成。

1  
黃  
92  
林  
梁  
上  
梁  
王  
王  
王



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

17. 委員會關注「慕拉士大馬路公共房屋」的項目預算由 2023 年第四季度的 20.2 億元，下降至 2024 年第一季度的 18.8 億元。為此要求政府提供說明。

18. 政府回覆：

「慕拉士大馬路公共房屋」的實際預算為 18.8 億元，由於預計未能於 2023 年支付約 1.4 億元的工程款，因此將該筆金額轉至 2024 年預計開支金額中，並在填報 2023 年第四季季度報告時，將 2024 年的預計開支由 3.6 億元改為 5 億元，但於 2023 年因具備條件最終支付了該筆 1.4 億元的款項，導致預算由 18.8 億元上升至 20.2 億元，有關問題已於 2024 年第一季度時作出更正。

19. 委員會關注「東北大馬路空中走廊」的項目預算由 2023 年第四季度的 2.3 億元，大幅下降至 2024 年第一季度的 2,045 萬元。為此，要求政府提供項目預算減少的原因，以及項目的最新計劃說明。

20. 政府回覆：

經查核後，2024 年第一季所填寫的估算金額 2,045 萬元為已判給工程及服務的金額，填寫 2024 年第一季季度報告時未有包含其他未作出招標/判給的工程及服務的預算。

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

步行系統由東北大馬路空中走廊、黑沙環公園風雨廊及互通行人天橋三部份組成，並會分期啟動。各部份預算仍待完成設計及啟動招標才作填報，現時不存在超支及變更規劃情況。

21. 委員會關注「離島醫療綜合體-設施設備」的項目預算由 2023 年第四季度的 17.2 億元，下降至 2024 年第一季度的 14.5 億元。然而，政府提供的說明卻表示，需增購多項設施設備，費用超出預期。為此，委員會欲了解該項目的實際情況。

22. 政府回覆：

隨着離島醫療綜合體各大樓的逐步落成，為優化離島醫療綜合體的營運、管理及服務模式，以及更好地規劃本地醫療資源的分配及運用，需要進行設施及設備的配置，因此，項目預算按實際需要進行調整，由 2014 年立項時的 4.3 億元，調升至 2024 年第一季度的 14.5 億元，故預算（2024 年第一季度的 14.5 億元）亦作相應的調整（2014 年立項時的 4.3 億元）。

「離島醫療綜合體—設施設備」的項目預算由 2023 年第四季度的 17.2 億元，下降至 2024 年第一季度的 14.5 億元，是由於部份設施設備實際採購金額較估算有所調整所致，同時，隨着離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心（下稱「澳門協和醫院」）於 2023 年第四季度成立，離島醫療綜合體內所需的設施設備，於 2024 年度逐步由澳門協和醫院自行採購和由其預算承擔，所以由衛生局執行「離島醫療綜合體—設施設備」項目的預算，於 2024 年第一季度的預算金額較 2023 年第四季度的預算為低。

黃  
紀  
林  
梁  
一  
周  
亞  
區



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

「離島醫療綜合體－設施設備」項目現時的狀況：

基於 2023 年年底接收離島醫療綜合體中央化驗大樓，按照用途規劃分配予不同部門使用，包括藥物監督管理局、澳門協和醫院及衛生局。其中，衛生局擬於中央化驗大樓內設置公共衛生化驗所實驗室、臨床病理實驗室、病理解剖實驗室等，需要進行裝修和配置專業的實驗室設備。因此，截至 2024 年第二季，「離島醫療綜合體－設施設備」整個項目的最新估算調升為 15 億元，當中已判給金額為 10.6 億元（累計支付 4.3 億元），未判給的 4.3 億元預算將用作承擔各實驗室設備設置、迴旋加速器室及其輔助功能室設置、磁力共振模擬器室設置，以及自動導引車運輸系統等設施設備，項目最新預計執行期至 2027 年。

23. 委員會關注「完善新口岸污水截流管」的項目預算由 2023 年第四季度的 7.8 億元，下降至 2024 年第一季度的 3.7 億元。為此，要求政府提供項目預算減少的原因。

24. 政府回覆：

因 2023 年第四季度輸入資料出現錯誤，因此，於 2024 年第一季度的執行報告作出更正，正確項目預算金額為 3.7 億元。

25. 委員會關注「大潭山隧道」的項目預算由 2023 年第四季度的 19.3 億元，大幅下降至 2024 年第一季度的 6,333 萬元。委員會欲了解項目預算減少的原因，以及相關項目的最新計劃，包括項目的進度節點及內容。

潘健林  
梁卓華  
李卓人  
李柱銘  
林卓廷



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

26. 政府回覆：

經查核後，2024 年第一季所填寫的估算金額 6,333 萬元為已判給服務的金額，填寫 2024 年第一季度報告時未有包含其他未作招標/判給的工程及服務的預算。

按照最新規劃及技術原因，大潭山隧道會分段招標，並陸續啟動，如隧道段已於 2024 年 5 月 29 日刊登招標公告，故金額及工期會隨完成招標程序即時作出更新。

27. 經比較政府提供的 2024 年第一季度與 2023 年第四季度的資料，顯示下述 4 個項目預計的完成日期有所推遲。為此，委員會要求政府就項目預計完成日期推遲的原因提供詳細說明：

**項目名稱**

路環污水處理廠升級工程 II

澳門大學 - 研究生宿舍建造工程

新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程

大潭山隧道

28. 政府回覆：

**路環污水處理廠升級工程 II**

環境保護局於 2023 年第三季對「路環污水處理廠升級工程 II」項目進行公開開標及評審標書，並於 2023 年第四季進行判給。

1  
考  
任  
林  
梁  
七  
學  
五  
V  
3



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

然而，鑒於其後特區政府收到有相關競投者就判給結果向行政長官提出聲明異議及向法院提起司法上訴，以及在調查後發現所述的部份理據成立，基此行政長官於 2024 年第一季宣告上述判給失效。

在完成重新評審標書後，特區政府已於 2024 年第二季對「路環污水處理廠升級工程 II」項目進行判給。環境保護局目前正跟進項目判給後的相關行政程序，按照目前最新進度，預計於 2024 年 9 月開展工程。

### 澳門大學 — 研究生宿舍建造工程

項目「澳門大學 — 研究生宿舍建造工程」按計劃進行中，其中編製計劃已按計劃於 2023 年開展採購程序，按最新的編製計劃，由於建造工程的施工面積由 35,000 平方米增加至 38,550 平方米，以及施工期由 14 個月調整為 16 個月，預計上述工程按計劃於 2026 年第四季完工。考慮到家具及電器需於工程完工後才接收，因此預計於 2027 年才能完成接收家具及電器。

### 新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程

項目採用預先評定資格的限制招標方式，分為資格甄審和評定標書階段，招標周期長，故工期會隨完成招標程序即時更新，項目最長施工期 900 工作天，最終落成年份待工程委託後可準確填報。

黃  
任  
林  
畢  
心  
學  
區  
區  
區  
區



## 大潭山隧道

大潭山隧道會分段招標，並陸續啟動，其中隧道段於 2024 年 5 月 29 日刊登招標公告，分為資格甄審和評定標書階段，招標周期長，故工期會隨完成招標程序即時更新，項目最長施工期 1165 工作天，最終落成年份待工程委託後可準確填報。

29. 按照政府提供的 2024 年第一季度的資料顯示，為配合「路環污水處理廠升級工程 II」和「澳門人工島污水處理設施建造」項目的執行進度，分別推遲了「路環中水站二期建造工程」和「人工島中水站建造工程」的執行日期至 2026 年及 2025 年。為此，委員會要求政府提供仍有否涉及或需配合「路環污水處理廠升級工程 II」和「澳門人工島污水處理設施建造」兩項目的其他項目，以及如何協調相關項目執行。

30. 政府回覆：

「路環污水處理廠升級工程 II」項目預計於 2024 年 9 月開展工程，在工程完成並投入運作後，將會提供生產中水的原水予「路環中水站二期建造工程」項目。

「澳門人工島污水處理設施建造」項目預計於 2024 年底開展工程，在工程完成並投入運作後，將會提供中水予「人工島中水站建造工程」項目。

黃廷林  
梁卓  
吳  
卜  
孫



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

就「路環污水處理廠升級工程 II」項目和「澳門人工島污水處理設施建造」項目的執行情況，環境保護局將持續與海事及水務局進行緊密協調及溝通，落實及推進相關項目的執行。

除了「路環中水站二期建造工程」和「人工島中水站建造工程」外，海事及水務局暫時沒有涉及或需配合「路環污水處理廠升級工程 II」和「澳門人工島污水處理設施建造」兩項目進行的項目。

31. 委員會要求政府提供「外港及南灣湖新填海區道路優化工程」和「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」兩項目的最新執行進度和未來計劃的說明。

32. 政府回覆：

### 外港及南灣湖新填海區道路優化工程

為改善外港及南灣湖新填海區內行車路面的安全性及增加路面的耐用性，現階段計劃對何鴻燊博士大馬路及周邊道路進行優化工程，以及為配合交通安排，有關工程需待約翰四世大馬路及周邊道路優化工程完成後，於 2024 年第二季才開展招標程序。按目前項目進度評估，何鴻燊博士大馬路及周邊道路優化工程預計 2024 年 7 月開始施工，並於本年第三季完工。另外，市政署未來將持續審視該區行車路面狀況，適時適當地制定道路優化工程計劃。

黃任林  
學  
七  
軍  
五  
十  
張



## 機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場

### 機場第二候機樓

因疫情過後機場客運量恢復需時，2023 年機場的總旅客量只有約 515 萬人次。縱然 2024 年首季機場容量接近 180 萬人次，恢復至 2019 年峰值同期約 77%，但按目前機場候機樓每年可接待 1,000 萬人次的設計容量相比，現時候機樓的處理能力仍足以應付當前的發展需求，故暫緩執行機場第二候機樓項目。

考慮到機場候機樓南面擴建工程已於 2022 年完成並投入使用，現時候機樓的處理能力足以應付當前的發展需求，未來將視乎本澳航空量的發展預期以及機場設施的發展規劃，適時探討重啟機場第二候機樓項目的必要性。

### 氹仔客運碼頭直升機場

鑒於氹仔客運碼頭直升機場的營運具必要性，但目前並未符合營運所需的要件，為着直升機場能適時投入營運，現時正準備相關招標文件，以爭取儘快開展其整治工作。

現時正積極籌備氹仔客運碼頭直升機場的整治工作，以期儘快開展並於完成後具備營運所需的要件，爭取於 2025 年下半年投入使用。此外，透過改變氹仔客運碼頭直升機場的經營及管理模式，預期將提供更開放的環境，吸引更多直升機航空公司提供直升機航班服務。

潘紀林  
梁  
吳  
吳  
吳  
吳



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

33. 委員會欲了解「珠光大廈 QR/C 社會設施裝修工程」和「勞工事務局金龍中心辦事處裝修工程」兩項目所指的裝修工程是否位於同一大廈。

34. 政府回覆：

珠光大廈由 4 個子部分組成，分別為 A 子部分（停車場）、B 子部分（商業）、C 子部分（社會設施及辦公室，又稱金龍中心）及 D 子部分（社會設施及住宅）。

珠光大廈 QR/C 社會設施（財政局使用）位處 D 子部分範圍，而金龍中心 3 樓（勞工局使用）則位處 C 子部分範圍。

珠光大廈 QR/C 社會設施與金龍中心 3 樓之間僅相隔一個平台。

### 三、財政分析

#### 二零二三財政年度第四季度「投資計劃」預算執行狀況

35. 2023 年的「投資計劃」最初預算為 223.1 億元，截至第四季度的經核准預算為 230.3 億元，較最初預算增加 7.2 億元，實際開支為 196.7 億元，預算執行率為 85.4%，預留金額為 207.3 億元，預算使用率為 90%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。

36. 在 2023 年財政年度，預算執行率低於 50% 的部門有如下 5 個：

黃任林學七





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

建議部門	最初 預算	經核准 預算	實際 開支	預留 金額	預算執 行率	項目 數	百萬澳門元
							預算執行 率為零項 目數
民航局	0	42	0	0	0.0%	1	1
警察總局	36	36	0	0	0.0%	2	2
廉政公署	20	19	6	6	33.8%	1	0
教育及青年發 展局	42	42	18	38	43.6%	2	0
交通事務局	82	60	28	29	46.5%	2	0

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

37. 值得一提的是，在 2023 年財政年度，民航局僅登錄了一個項目「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」，該項目於 2023 年第三季度登錄，設立項目的目的主要是增加機場候機樓，以及改善氹仔客運碼頭直升機場設施。按照政府在第四季度的說明，將暫緩機場第二候機樓的計劃，而直升機場的改善計劃則正與各單位協調有關工作安排。有關暫緩原因為機場旅客恢復相對較緩慢，2023 年旅客量為 515 萬人次，對比 2019 年的峰值（961 萬人次），整體旅客人次恢復 54%。預計 2024 年機場旅客量將在 2023 年的基礎上增加約 10%至 15%，按目前澳門機場候機樓的承载力與當前航空量相比仍有餘裕，能足以應付需求。因此，機場第二候機樓的計劃暫緩執行。

38. 在 2023 年財政年度，警察總局登錄的項目共有兩個，分別為「智慧民防」和「智慧民生」，該兩項目都是在 2020 年設立的項目，自 2020 年至 2024 年財政年度，皆有登錄預算，該兩項目在 2023 年財政年度的預算執行率皆為零，當中「智慧民生」的預算執行率更連續三年(2021 年至 2023 年)為零，按照政府提供的

Handwritten notes in the right margin, including the name '梁國治' and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

2023 年第四季度的說明，該項目將再作評估及分析，並將在 2024 年第一季開展項目調研及可行性分析程序。

39. 2023 年第四季度「投資計劃」與 2023 年第三季度「投資計劃」比較，經核准預算不變，實際開支則增加 57.9 億元，預留金額增加 10.9 億元，預算執行率上升 25.1%，而預算使用率則上升 4.7%。

百萬澳門元

2023 年	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
第四季	23,031	19,668	20,729	85.4%	90.0%	276
第三季	23,031	13,883	19,639	60.3%	85.3%	274
<b>變化</b>	-	<b>5,785</b>	<b>1,090</b>	<b>25.1%</b>	<b>4.7%</b>	<b>2</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

40. 截至 2023 年第四季度「投資計劃」共有 276 個項目，當中 2 個是在第四季度期間新登錄的項目。在該 2 個新登錄的項目中，有 1 個項目是在 2018 年已立項的舊項目，而另 1 個則是在 2023 年第四季度新設立的項目。該 2 個新登錄項目涉及的經核准預算合共為 1,140 萬元。

Handwritten notes on the right margin, including the name '梁家傑' (Leong Ka-ki) and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期
嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道	7,400,000.00	舊項目	32,217,500.00	2018 2023

市政署

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期
路氹填海區、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區道路優化工程	4,000,000.00	新項目	95,900,000.00	2023 2024

- 41. 截至 2023 年第四季度「投資計劃」的經核准預算較 2022 年同期增加 40.7 億元，實際開支增加 37.2 億元，預留金額增加 46.5 億元，預算執行率上升 1.3%，預算使用率則上升 5.2%。儘管 2023 年第四季度的經核准預算達 230.3 億元，高於 2022 年同期的 189.6 億元，然而，計得的預算執行率和預算使用率仍較 2022 年同期有所上升，可推斷截至 2023 年第四季度「投資計劃」預算的執行情況較 2022 年同期理想。「投資計劃」的項目數量為 276 個，較 2022 年同期的 230 個增加 46 個。

黃經林  
梁上  
梁上  
梁上  
梁上  
梁上



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

百萬澳門元

第四季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2023年	23,031	19,668	20,729	85.4%	90.0%	276
2022年	18,958	15,952	16,077	84.1%	84.8%	230
<b>變化</b>	<b>4,073</b>	<b>3,716</b>	<b>4,652</b>	<b>1.3%</b>	<b>5.2%</b>	<b>46</b>

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

42. 截至2023年第四季度預算執行率為零的項目共有20個，涉及經核准預算2.7億元：

### 公共建設局

項目名稱	經核准預算
二龍喉公園環境資訊中心重建工程	5,810,828.40
慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00
新城區海底隧道工程	0.02

### 文化局

項目名稱	經核准預算
澳門故宮文化遺產保護傳承中心	4,500,000.00
澳門博物館改陳提升	8,220,000.00
澳門文化中心廣場改造計劃	6,000,000.00
政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程	1,119,200.00

黃紅林  
梁卓軍  
陳海山  
陳海山  
陳海山



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

### 市政署

項目名稱	經核准預算
石排灣郊野公園發展規劃	600,000.00
林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	20,000.00
筷子基北灣新雨水及污水泵站 EP9 e EER 及周邊道路涵箱渠建造工程	5,000,000.00

### 澳門保安部隊事務局

項目名稱	經核准預算
智慧消防	7,572,700.00
智慧高校	11,559,000.00

### 警察總局

項目名稱	經核准預算
智慧民防	16,000,000.00
智慧民生	20,000,000.00

### 民航局

項目名稱	經核准預算
機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	42,112,000.00

### 旅遊局

項目名稱	經核准預算
利斯大廈重修工程	480,000.00

黃任林學上  
周  
五  
月



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

海事及水務局

項目名稱	經核准預算
接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程	1,555,000.00

財政局

項目名稱	經核准預算
《智慧財政》第一階段	19,236,000.00

衛生局

項目名稱	經核准預算
青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	7,320,000.00

環境保護局

項目名稱	經核准預算
路環污水處理廠升級工程 II	110,801,064.50

43. 在上述 20 個預算執行率為零的項目中，有 6 個項目已作出預留款項的程序，但卻未有作出任何支付開支的記錄，這表示在 2023 年財政年度，該 6 個項目已作出了判給開支的程序，並計劃在當年作出支付開支，但最終卻由於各自原因，而沒有按計劃作出支付開支：

項目名稱	經核准預算	預留金額	實際開支
政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程	1,119,200.00	1,119,200.00	0.00
石排灣郊野公園發展規劃	600,000.00	600,000.00	0.00

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

項目名稱	經核准預算	預留金額	實際開支
林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	20,000.00	19,998.34	0.00
筷子基北灣新雨水及污水泵站 EP9 e EER 及周邊道路涵箱渠建造工程	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
《智慧財政》第一階段	19,236,000.00	19,236,000.00	0.00
路環污水處理廠升級工程 II	110,801,064.50	110,801,064.50	0.00

44. 經分析 2023 年第四季度「投資計劃」項目的資料，以及將當中的 276 個項目與 2023 年第三季度「投資計劃」項目作比較後，發現政府對 21 個項目的執行期作出修改，其中有 19 個推遲了項目的完成日期。此外，有 2 個項目則將完成日期提前，詳細資料可參閱附件三。

— 45. 另外，經比較 2023 年第四季度「投資計劃」項目的最新估算金額與 2023 年第三季度的估算金額，發現有 27 個項目的最新估算金額有所增加，132 個項目的最新估算金額沒有變動，109 個項目的最新估算金額則有所減少。此外，有 6 個項目的預算從概算金額調整為估算金額。

46. 值得注意的是，將 2023 年第四季度與 2023 年第三季度的項目最新估算金額比較後，整體預算金額變動超過 1 億元的項目有如下 11 個：

黃  
元  
林  
學  
七  
學  
區  
區  
區



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

百萬澳門元

建議部門	項目名稱	第四季 項目最新 估算金額	第三季 項目最新 估算金額	變動金額
公共建設局/ 環境保護局	新城填海區 A 區中央道路共 同管道的建造工程	3,008	2,397	611
公共建設局	完善新口岸污水截流管	782	369	412
公共建設局	輕軌東線項目	10,928	10,606	322
公共建設局	澳氹第四條跨海大橋	6,554	6,361	192
公共建設局	慕拉士大馬路公共房屋	2,018	1,879	139
公共建設局	輕軌石排灣線	2,819	2,703	116
公共建設局	澳門輕軌延伸橫琴線	4,836	4,735	102
房屋局	新城 A 區 A1 地段公共房屋 建造工程	1,567	1,670	-103
公共建設局	大潭山隧道	1,930	2,059	-130
衛生局	離島醫療綜合體綜合醫院、 輔助設施大樓及綜合服務行 政大樓上蓋工程	8,174	8,332	-158
衛生局	離島醫療綜合體-設施設備	1,724	1,942	-218

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

47. 在上述 11 個估算金額變動大於一億元的項目中，除「澳門輕軌延伸橫琴線」政府有提供最新變動說明外，其餘項目皆沒有提供估算金額變動的說明，為此，委員會已要求提供補充說明。

## 二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算執行狀況

48. 2024 年的「投資計劃」最初預算為 174.2 億元，截至第一季度的經核准預算為 174.8 億元，較最初預算增加 5,979 萬元，實際開支為 52 億元，預算執行率為 29.8%，預留金額為 138.8 億元，預

潘永基





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

算使用率為 79.4%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件五。

49. 截至 2024 年第一季度「投資計劃」共有 222 個項目，當中有 9 個是在第一季度期間新登錄的項目，取消的項目有 2 個。在該 9 個新登錄的項目中，有 5 個項目是在 2024 年之前已立項的舊項目，而餘下的 4 個則是在 2024 年第一季度新設立的項目。該 9 個新登錄項目涉及的經核准預算合共為 4,972 萬元。

### 公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
罽些喇提督大馬路 EP3 污水泵站重建工程	1,697,500.00	新項目	115,100,000.00	2024	2027
輕軌顧問、驗證及審查服務	724,800.00	舊項目	898,226,425.54	2009	2024
輕軌氹仔線	440,000.00	舊項目	3,444,120,295.57	2010	2024

### 司法警察局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
擴建刑事偵查輔助設備—2021	956,000.00	舊項目	22,099,239.83	2021	2024

黃  
經  
林  
梁  
七  
梁  
海  
門  
強



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

### 市政署

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	19,998.34	舊項目	23,623,889.00	2020 2024

### 海事及水務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
路氹蓮花路-公共供水管網鋪設工程	7,977,340.00	新項目	9,336,000.00	2024 2024

### 財政局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
珠光大廈 QR/C 社會設施裝修工程	14,637,000.00	新項目	14,637,000.00	2024 2024

### 勞工事務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
勞工事務局金龍中心辦事處裝修工程	21,996,000.00	新項目	21,996,000.00	2024 2024

1  
黃  
經  
林  
梁  
上  
軍  
文  
下  
張



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
近外港碼頭臨時污水處理設施建造工程	1,269,050.00	舊項目	62,728,125.00	2020 2026

50. 2024 年第一季度取消的項目有以下 2 個：

建議部門	項目名稱	最初預算
海事及水務局	路環中水站二期建造工程	2,700,000.00
海事及水務局	人工島中水站建造工程	3,438,000.00

51. 按政府提供的「行政當局投資與發展開支計劃」二零二四財政年度第一季度項目執行狀況，參考當中的項目預算執行情況說明，取消「路環中水站二期建造工程」項目的主要原因，為按 2024 年施政報告，路環污水處理廠升級完成時間為 2030 年下半年，按目前的計劃，該水廠將於 2029 年初向路環中水站二期供應水源，為配合污水廠的開展時程，故將項目延後執行。

52. 另外，取消「人工島中水站建造工程」項目的主要原因，為按 2024 年施政報告，人工島污水處理廠建設完成時間為 2029 年上半年，按目前的計劃，該水廠將於 2029 年初向人工島中水處理站供應水源，為配合污水廠的開展時程，故將項目延後執行。

53. 上述兩個項目是在編製 2024 年財政年度預算時新立項的項目，現時延後執行之原因是配合 2024 年施政報告中其他項目的執行進度所致，這反映出部門在設立這兩項目時，未有綜合考慮與其相關的其他項目的執行狀況。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name '梁卓人' (Liang Cheong On) and other illegible characters.



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

54. 另外，除上述 2 個已經被取消的項目外，按照政府提供的「行政當局投資與發展開支計劃」二零二四財政年度第一季度項目執行狀況，參考相關的項目預算執行情況說明，預計下述 2 個項目也不會在 2024 年繼續執行。

建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	4,776,000.00	2017	2025
海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	402,000.00	2018	2027

「偉龍馬路公共房屋建造工程」預算執行情況說明：

“因應公共房屋項目暫停興建，因此預定的基建設施計劃工作亦暫緩展開。”

「石排灣水庫擴容整治」預算執行情況說明：

“本項目由公共建設局負責統籌及執行，工料測量已於 2023 年 8 月份判給。根據該局最新工作安排，“石排灣水庫擴容工程”於 2024 年暫停執行，將延後至 2025 年重啓。”

55. 2024 年第一季度的經核准預算較 2023 年同期減少 51.1 億元，實際開支增加 2.8 億元，預留金額減少 17.2 億元，預算執行率上升 8%，預算使用率則上升 10.4%。「投資計劃」的項目數量為 222 個，較 2023 年同期的 253 個減少 31 個。

潘經林  
梁  
L  
梁  
王  
L  
33





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

部門	第一季
警察總局	2
民航局	1
勞工事務局	1
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	1
<b>合計</b>	<b>49</b>

57. 在 49 個預算使用率為零的項目中，公共建設局和文化局各占 6 個，其次是房屋局占 5 個，以及財政局、澳門大學和環境保護局各占 4 個。

58. 經分析 2024 年第一季度「投資計劃」項目的資料，以及將當中的 222 個項目與 2023 年第四季度「投資計劃」項目作比較後，發現政府對 12 個項目的執行期作出修改，其中有 9 個為推遲項目的完成日期，當中政府並未為下述 3 個項目推遲完成日期的原因提供說明。另外，有 3 個項目則將完成日期提前，有關詳細資料可參閱附件七。

建議部門	項目名稱	2024 年第一季	2023 年第四季	變動
		預計完成日期	預計完成日期	
環境保護局	路環污水處理廠升級工程 II	2036	2030	6
澳門大學	澳門大學 - 研究生宿舍建造工程	2027	2026	1
公共建設局	新城 A、B 區行車天橋設計連建造工程	2030	2027	3

萬能林翠文



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

59. 此外，就「大潭山隧道」項目的完成日期推遲至 2029 年的原因，政府提供的說明亦未能使委員會釋疑。為此，按照委員會的要求，政府提供了上述 3 個推遲完成日期的項目，以及「大潭山隧道」項目的補充說明，有關解釋可參閱本報告書第 28 點。
60. 經比較 2024 年第一季度「投資計劃」項目的最新估算金額與 2023 年第四季度的估算金額，發現有 17 個項目的最新估算金額有所增加，120 個項目的最新估算金額沒有變動，44 個項目的最新估算金額則有所減少。此外，有 1 個項目的預算從概算金額調整為估算金額。
61. 值得注意的是，將 2024 年第一季度與 2023 年第四季度的項目最新估算金額比較後，整體預算金額變動超過 1 億元的項目有如下 6 個：

百萬澳門元

建議部門	項目名稱	2024 年第一季項目最新估算金額	2023 年第四季項目最新估算金額	變動金額
公共建設局	輕軌東線項目	13,780	10,928	2,853
公共建設局	慕拉士大馬路公共房屋	1,879	2,018	-139
公共建設局	東北大馬路空中走廊	20	229	-209
衛生局	離島醫療綜合體-設施設備	1,447	1,724	-277
公共建設局	完善新口岸污水截流管	366	782	-415
公共建設局	大潭山隧道	63	1,930	-1,867

\*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

62. 在上述的 6 個最新估算金額變動大於一億元的項目中，除「輕軌東線項目」的金額增加外，其餘為金額減少的項目。當中政府並未對「東北大馬路空中走廊」及「完善新口岸污水截流管」兩個項目提供估算金額變動的說明。
63. 至於其餘 4 個項目，雖然政府提供了說明，委員會為進一步了解其項目預算變動的原因，故要求政府作補充說明，政府隨後亦已按委員會的要求提供有關補充說明。

#### 四、意見和建議

- 64. 截至 2023 年第四季度「投資計劃」的預算執行率達 85.4%，而預算使用率亦達 90%，較 2022 年分別微升 1.3%及 5.2%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。
65. 截至 2024 年第一季度「投資計劃」的預算執行率達 29.8%，而預算使用率亦達 79.4%，較 2023 年同期分別上升 8%及 10.4%，整體進度理想，委員會對此表示肯定。
66. 「投資計劃」季度預算執行情況報告為了解政府各投資項目狀況的有效途徑。為此，政府應確保項目資料的準確性，除須保證資料輸入的準確性外，亦應設有審查或核對機制，以加強內部監督。
67. 委員會於 8 月 8 日已收到政府對項目的跟進問題回覆，對相關回覆的內容，委員會認為仍需要討論和分析。為此，將會在跟進 2024 年第二季度「投資計劃」預算執行報告時繼續作討論。

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32





澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

68. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

69. 委員會總結如下：

- (1) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- (2) 將本報告書送交特區政府。

二零二四年八月十二日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)


陳澤武


黃  
能  
林  
梁  
卓  
卓  
卓  
卓  
卓  
卓  
卓





澳門特別行政區立法會  
 Região Administrativa Especial de Macau  
 Assembleia Legislativa


  
 邱庭彪


  
 龐川

  
 林倫偉

  
 梁鴻細

  
 張健中

  
 羅彩燕

  
 李良汪

黃  
 龍  
 林  
 梁  
 上  
 軍



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件一

# 行政當局投資與發展開支計劃 二零二三財政年度第四季度 預算執行報告

黃龍林  
梁心  
吳  
[Signature]  
[Signature]

行政當局投資與發展開支計劃  
二零二三財政年度第四季度  
預算執行報告



此頁留空

## 概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二三年第四季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

## 第一部份

二零二三年「投資計劃」的最初預算為澳門元 223 億 824 萬元，經核准預算為澳門元 230 億 3,112 萬元，實際開支為澳門元 196 億 6,787 萬元，預算執行率為 85.4%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 207 億 2,911 萬元，預算使用率為 90.0%<sup>2</sup>。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准預算為澳門元 47 億 377 萬元。當中「長者公寓」的經核准預算金額最高，為澳門元 10 億 2,249 萬元，預算執行率及使用率分別為 75.0% 及 75.1%。其次為「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 5 億 4,599 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.9% 及 100.0%。

按組織分類分，公共建設局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 87 億 2,184 萬元，佔整體預算的 37.9%，預算執行率及使用率分別為 97.3% 及 99.1%。其次為房屋局及衛生局，房屋局的經核准預算為澳門元 32 億 6,888 萬元，佔整體預算的 14.2%，預算執行率及使用率分別為 99.5% 及 100.0%；衛生局的經核准預算為澳門元 28 億 5,880 萬元，佔整體預算的 12.4%，預算執行率及使用率分別為 55.4% 及 62.6%。

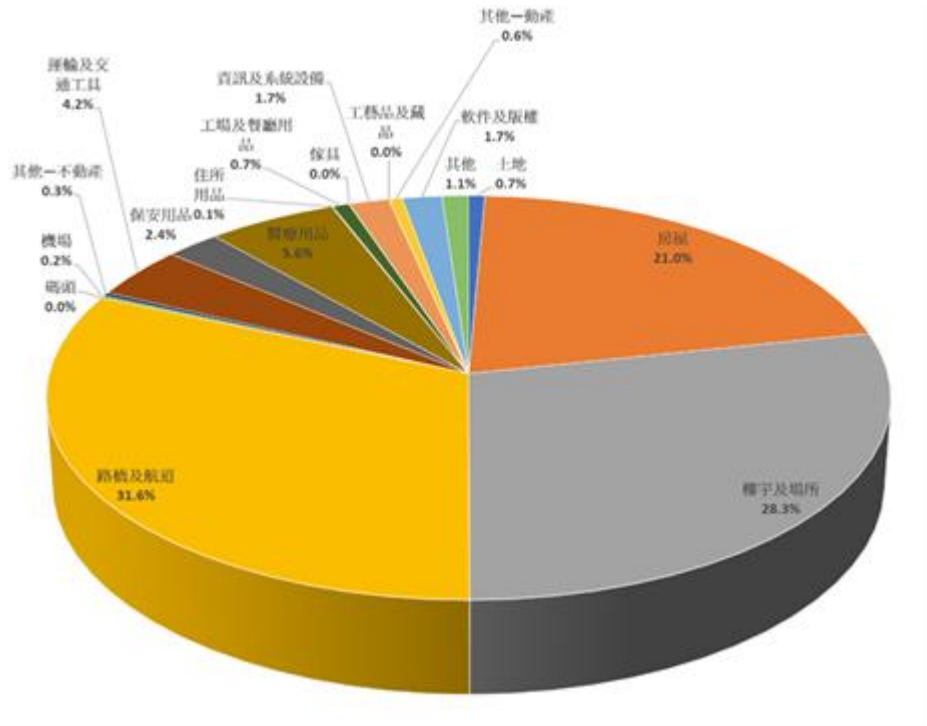
按經濟分類分，「路橋及航道」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 72 億 6,879 萬元，佔整體預算的 31.6%，預算執行率及使用率分別為 96.7% 及 98.8%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」等項目。其次為「樓宇及場所」，其經核准預算為澳門元 65 億 1,133 萬元，佔整體預算的 28.3%，預算執行率及使用率分別為 83.4% 及 91.2%，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「焚化中心第三期設施建造」等項目。

---

1 實際開支 / 經核准預算

2 預留金額 / 經核准預算

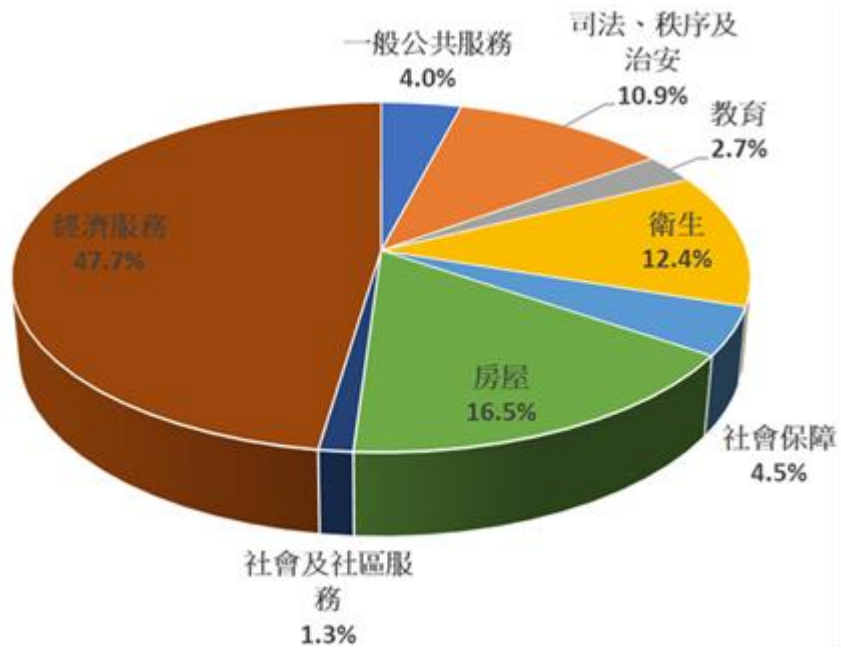
### 按經濟分類的經核准預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 109 億 7,783 萬元，佔整體預算的 47.7%，預算執行率及使用率分別為 91.0% 及 97.3%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」等項目。其次為「房屋」，其經核准預算為澳門元 37 億 9,883 萬元，佔整體預算的 16.5%，預算執行率及使用率分別為 99.5% 及 99.9%，當中主要包括「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」及「慕拉士大馬路公共房屋」等項目。



### 按功能分類的經核准預算分配



此頁留空

# 按項目群

	二零二三年度 最初預算 <b>a</b>	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 <b>b</b>
公共設施工程	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
澳門城市集體運輸系統	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
公共房屋	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
路橋、山坡及航道	2,984,965,500.00	3,422,160,331.00
填海造地	33,462,800.00	33,462,800.00
澳門大學橫琴新校園	313,021,600.00	313,021,600.00
部門設施工程	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
部門設備	942,504,300.00	942,504,300.00
交通樞紐	925,000.00	7,295,700.00
公共設施設備	5,500,000.00	130,717,000.00
醫療設備	78,000,000.00	78,000,000.00
新監獄建造	473,258,800.00	569,576,406.54
運輸工具	137,323,000.00	137,323,000.00
建造離島醫療綜合體	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
儲水設施	60,985,900.00	60,985,900.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	582,600.00	582,600.00
智慧雲警務	314,381,700.00	314,381,700.00
新城填海區 A 區建造	744,268,400.00	744,268,400.00
<b>總額</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# 按項目群

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
2,185,108,375.50	2,605,298,836.93	78.3	93.3
4,163,792,502.86	4,193,190,353.82	98.8	99.5
4,430,394,355.18	4,448,447,701.90	94.2	94.6
3,223,107,477.20	3,347,795,152.34	94.2	97.8
33,423,384.32	33,462,761.62	99.9	100.0
285,775,259.95	290,823,922.95	91.3	92.9
1,776,351,446.75	1,803,579,486.38	90.9	92.2
675,537,349.95	870,392,046.67	71.7	92.3
7,295,602.00	7,295,602.00	100.0	100.0
128,385,666.00	128,385,666.00	98.2	98.2
5,272,694.70	10,863,789.00	6.8	13.9
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
132,872,936.50	132,872,936.50	96.8	96.8
1,447,790,196.20	1,637,162,973.30	55.5	62.7
42,277,047.29	59,238,050.20	69.3	97.1
582,520.00	582,520.00	100.0	100.0
71,560,285.69	71,560,285.69	22.8	22.8
647,830,318.25	667,938,049.48	87.0	89.7
<b>19,667,870,161.08</b>	<b>20,729,107,858.92</b>	<b>85.4</b>	<b>90.0</b>

# 按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 b
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00
財政局	980,333,600.00	1,143,047,077.97
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00
交通事務局	81,600,000.00	60,339,400.00
環境保護局	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	842,062,100.00
海事及水務局	303,400,000.00	222,097,171.60
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00
衛生局	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00
社會工作局	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00
民航局	0.00	42,112,000.00
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00

# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
123,230,587.84	126,015,673.85	73.8	75.4
1,092,686,807.32	1,141,604,393.42	95.6	99.9
38,673,026.50	38,673,026.50	86.9	86.9
142,181,472.68	233,020,719.41	56.2	92.2
159,203,357.00	206,603,357.00	62.6	81.3
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
4,387,511.98	4,430,000.00	97.5	98.4
98,281,277.60	102,679,663.60	95.3	99.5
0.00	0.00	0.0	0.0
28,038,749.28	29,244,450.03	46.5	48.5
961,108,939.60	1,310,163,842.62	69.6	94.9
4,574,279.05	4,632,662.25	96.4	97.6
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
8,483,673,363.01	8,645,759,348.45	97.3	99.1
109,689,180.46	115,286,672.02	60.6	63.7
64,989,824.69	65,505,998.30	89.9	90.6
635,161,025.74	636,271,714.49	75.4	75.6
188,563,922.34	212,932,092.35	84.9	95.9
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
573,765,239.37	580,879,907.35	86.5	87.6
18,252,370.00	37,733,045.00	43.6	90.1
2,286,655.10	2,286,655.10	51.0	51.0
1,583,139,030.09	1,789,917,635.14	55.4	62.6
769,768,682.29	770,834,273.21	75.1	75.2
3,251,050,536.84	3,267,720,207.40	99.5	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
152,894,258.87	170,006,472.89	84.2	93.7
285,775,259.95	290,823,922.95	91.3	92.9
48,518,556.00	50,537,182.00	67.7	70.6
18,906,572.98	19,213,084.78	96.8	98.3

## 按組織分類

	二零二三年度 最初預算 <b>a</b>	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 <b>b</b>
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	132,464,600.00
廉政公署	19,620,000.00	19,170,000.00
市政署	239,634,000.00	311,366,083.00
<b>總額</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
14,521,491.67	14,558,602.00	99.7	100.0
123,849,044.76	131,327,226.20	93.5	99.1
6,480,000.00	6,480,000.00	33.8	33.8
271,246,595.33	301,288,506.47	87.1	96.8
<b>19,667,870,161.08</b>	<b>20,729,107,858.92</b>	<b>85.4</b>	<b>90.0</b>



# 按經濟分類

	二零二三年度 最初預算 <b>a</b>	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 <b>b</b>
土地	541,177,700.00	161,258,157.67
房屋	4,867,378,900.00	4,834,083,168.40
樓宇及場所	6,018,341,300.00	6,511,328,553.50
路橋及航道	6,424,971,300.00	7,268,792,067.15
碼頭	4,184,100.00	4,381,271.60
機場	0.00	42,112,000.00
其他—不動產	84,793,400.00	67,918,400.00
運輸及交通工具	1,220,810,100.00	957,753,809.45
保安用品	411,359,500.00	541,376,500.00
醫療用品	1,412,754,300.00	1,280,928,073.12
住所用品	18,159,800.00	13,106,763.20
工場及餐廳用品	107,146,000.00	161,968,566.35
傢具	812,000.00	4,812,000.00
資訊及系統設備	362,631,100.00	396,285,900.00
工藝品及藏品	1,500,000.00	1,500,000.00
其他—動產	125,827,600.00	130,796,998.00
軟件及版權	405,862,300.00	391,325,580.00
其他	300,534,000.00	261,387,812.10
<b>總額</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# 按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
158,027,525.57	158,188,984.89	98.0	98.1
4,571,131,547.08	4,590,002,821.90	94.6	95.0
5,431,794,091.21	5,940,559,589.52	83.4	91.2
7,031,131,191.19	7,185,099,690.11	96.7	98.8
4,372,862.45	4,372,862.45	99.8	99.8
0.00	0.00	0.0	0.0
44,893,822.29	62,840,395.20	66.1	92.5
918,880,182.05	932,531,109.06	95.9	97.4
325,207,434.01	326,163,209.98	60.1	60.2
207,288,087.31	364,763,048.20	16.2	28.5
11,474,272.20	11,474,272.20	87.5	87.5
120,659,354.80	125,039,354.80	74.5	77.2
1,540,694.00	2,622,754.00	32.0	54.5
276,077,067.92	347,418,468.18	69.7	87.7
0.00	0.00	0.0	0.0
64,039,805.57	73,287,124.00	49.0	56.0
246,102,769.09	345,411,555.09	62.9	88.3
255,249,454.34	259,332,619.34	97.7	99.2
<b>19,667,870,161.08</b>	<b>20,729,107,858.92</b>	<b>85.4</b>	<b>90.0</b>

# 按功能分類

	二零二三年度 最初預算 <b>a</b>	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 <b>b</b>
<b>1-00 一般公共服務</b>	<b>858,237,000.00</b>	<b>932,008,728.00</b>
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	858,237,000.00	932,008,728.00
<b>2-00 司法、秩序及治安</b>	<b>2,263,808,700.00</b>	<b>2,521,471,806.54</b>
2-01 指揮部	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 警察及海關	1,114,282,000.00	1,272,909,000.00
2-03 消防	115,931,700.00	116,100,200.00
2-04 民防	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 司法及秩序	467,336,200.00	469,886,200.00
2-06 懲教	473,258,800.00	569,576,406.54
<b>3-00 教育</b>	<b>625,347,800.00</b>	<b>619,565,300.00</b>
3-02 教育	625,347,800.00	619,565,300.00
<b>4-00 衛生</b>	<b>2,875,340,600.00</b>	<b>2,855,465,255.00</b>
4-01 行政、規範及研究	7,320,000.00	22,916,655.00
4-02 醫療服務	2,868,020,600.00	2,832,548,600.00
<b>5-00 社會保障</b>	<b>1,096,347,800.00</b>	<b>1,025,030,300.00</b>
5-02 社會援助	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00
<b>6-00 房屋</b>	<b>3,727,514,200.00</b>	<b>3,798,831,700.00</b>
6-01 行政、規範及研究	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 公共房屋	3,609,962,200.00	3,681,279,700.00

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>868,186,406.99</b>	<b>922,863,497.66</b>	<b>93.2</b>	<b>99.0</b>
868,186,406.99	922,863,497.66	93.2	99.0
<b>1,967,924,536.50</b>	<b>2,000,511,474.96</b>	<b>78.0</b>	<b>79.3</b>
24,210,000.00	24,315,000.00	42.5	42.7
1,035,134,858.26	1,043,213,051.54	81.3	82.0
104,077,500.00	104,077,500.00	89.6	89.6
0.00	0.00	0.0	0.0
393,989,435.50	408,688,199.28	83.8	87.0
410,512,742.74	420,217,724.14	72.1	73.8
<b>505,440,444.82</b>	<b>549,100,622.84</b>	<b>81.6</b>	<b>88.6</b>
505,440,444.82	549,100,622.84	81.6	88.6
<b>1,581,904,615.24</b>	<b>1,786,508,629.79</b>	<b>55.4</b>	<b>62.6</b>
4,954,155.00	8,557,935.00	21.6	37.3
1,576,950,460.24	1,777,950,694.79	55.7	62.8
<b>769,768,682.29</b>	<b>770,834,273.21</b>	<b>75.1</b>	<b>75.2</b>
769,768,682.29	770,834,273.21	75.1	75.2
<b>3,779,436,732.52</b>	<b>3,796,543,984.09</b>	<b>99.5</b>	<b>99.9</b>
116,340,309.63	116,393,305.40	99.0	99.0
3,663,096,422.89	3,680,150,678.69	99.5	100.0

# 按功能分類

	二零二三年度 最初預算 <b>a</b>	二零二三年度 截至十二月三十一日 經核准預算 <b>b</b>
<b>7-00 社會及社區服務</b>	<b>334,053,200.00</b>	<b>300,916,728.40</b>
7-01 文化	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 體育及康樂	129,929,700.00	113,543,228.40
7-04 氣象及地球物理	21,620,000.00	4,870,000.00
7-06 社會傳播	1,631,800.00	1,631,800.00
<b>8-00 經濟服務</b>	<b>10,527,594,100.00</b>	<b>10,977,825,802.60</b>
8-01 行政、規範及研究	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 基礎設施	1,026,972,700.00	889,522,460.03
8-05 運輸	6,983,949,000.00	7,621,859,494.67
8-08 旅遊	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 環保	1,579,122,300.00	1,374,923,822.03
8-12 科學技術	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 其他	415,034,200.00	580,050,125.87
<b>總額</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二三年度 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>200,250,544.13</b>	<b>222,072,168.66</b>	<b>66.5</b>	<b>73.8</b>
109,689,180.46	115,286,672.02	60.6	63.7
84,672,051.69	100,853,696.64	74.6	88.8
4,757,511.98	4,800,000.00	97.7	98.6
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
<b>9,994,958,198.59</b>	<b>10,680,673,207.71</b>	<b>91.0</b>	<b>97.3</b>
142,181,472.68	233,020,719.41	56.2	92.2
828,868,786.48	865,045,277.84	93.2	97.2
7,332,928,031.30	7,490,919,234.58	96.2	98.3
2,286,655.10	2,286,655.10	51.0	51.0
954,821,319.60	1,303,876,222.62	69.4	94.8
159,203,357.00	206,603,357.00	62.6	81.3
574,668,576.43	578,921,741.16	99.1	99.8
<b>19,667,870,161.08</b>	<b>20,729,107,858.92</b>	<b>85.4</b>	<b>90.0</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件二

# 二零二三財政年度第四季度 「投資計劃」預算執行情況

## 按建議部門

黃  
龍  
林  
學  
L.  
學  
區  
區  
區  
區

附件二

二零二三財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00	4,574,279.05	4,632,662.25	96.4%	97.6%	1	0
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	0
公共建設局	8,105,855,400.00	8,721,839,219.40	8,483,673,363.01	8,645,759,348.45	97.3%	99.1%	59	3
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00	109,689,180.46	115,286,672.02	60.6%	63.7%	10	3
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00	123,230,587.84	126,015,673.85	73.8%	75.4%	10	0
市政署	239,634,000.00	311,366,083.00	271,246,595.33	301,288,506.47	87.1%	96.8%	31	0
民航局	-	42,112,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
交通事務局	81,600,000.00	60,339,400.00	28,038,749.28	29,244,450.03	46.5%	48.5%	2	0
地球物理氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00	4,387,511.98	4,430,000.00	97.5%	98.4%	1	0
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00	159,203,357.00	206,603,357.00	62.6%	81.3%	5	0
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00	38,673,026.50	38,673,026.50	86.9%	86.9%	2	0
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,884,740.00	3,251,050,536.84	3,267,720,207.40	99.5%	100.0%	25	0
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00	98,281,277.60	102,679,663.60	95.3%	99.5%	1	0
社會工作局	1,096,347,800.00	1,025,030,300.00	769,768,682.29	770,834,273.21	75.1%	75.2%	2	0

張一林



附件二

二零二三財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00	2,286,655.10	2,286,655.10	51.0%	51.0%	2	1
海事及水務局	303,400,000.00	222,097,171.60	188,563,922.34	212,932,092.35	84.9%	95.9%	15	1
財政局	980,333,600.00	1,143,047,077.97	1,092,686,807.32	1,141,604,393.42	95.6%	99.9%	6	0
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00	18,252,370.00	37,733,045.00	43.6%	90.1%	2	0
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	132,464,600.00	123,849,044.76	131,327,226.20	93.5%	99.1%	3	0
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00	142,181,472.68	233,020,719.41	56.2%	92.2%	1	0
廉政公署	19,620,000.00	19,170,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	33.8%	33.8%	1	0
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	69.4%	69.4%	1	0
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00	18,906,572.98	19,213,084.78	96.8%	98.3%	1	0
衛生局	2,892,058,200.00	2,858,799,700.00	1,583,139,030.09	1,789,917,635.14	55.4%	62.6%	17	1
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00	285,775,259.95	290,823,922.95	91.3%	92.9%	24	0
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	842,062,100.00	635,161,025.74	636,271,714.49	75.4%	75.6%	15	2
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00	48,518,556.00	50,537,182.00	67.7%	70.6%	1	0
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00	573,765,239.37	580,879,907.35	86.5%	87.6%	11	0

林

附件二

二零二三財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00	152,894,258.87	170,006,472.89	84.2%	93.7%	1	0
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00	14,521,491.67	14,558,602.00	99.7%	100.0%	1	0
環境保護局	1,584,560,000.00	1,381,211,522.03	961,108,939.60	1,310,163,842.62	69.6%	94.9%	17	0
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54	410,512,742.74	420,217,724.14	72.1%	73.8%	1	0
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00	64,989,824.69	65,505,998.30	89.9%	90.6%	4	0
<b>合計</b>	<b>22,308,243,400.00</b>	<b>23,031,115,620.54</b>	<b>19,667,870,161.08</b>	<b>20,729,107,858.92</b>	<b>85.4%</b>	<b>90.0%</b>	<b>276</b>	<b>14</b>

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件三

# 二零二三財政年度第四季度 「投資計劃」- 執行期變動的項目

(二零二三年第三季度與二零二三年第四季度比較)

黃任林  
梁七軍  
何  
張

附件三

二零二三財政年度第四季度「投資計劃」 -  
執行期變動的項目  
(二零二三年第三季度與二零二三年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	第四季預計 完成日期	第三季預計 完成日期	變動
1	公共建設局	新城A區公共道路及排放網絡建造工程	76,779,972.95	2028年	2025年	3年
2	公共建設局	輕軌東線項目	1,608,531,535.07	2028年	2027年	1年
3	公共建設局	輕軌顧問、驗證及審查服務	7,066,800.00	2024年	2023年	1年
4	公共建設局	輕軌氹仔線	500,000.00	2024年	2023年	1年
5	公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	2024年	2023年	1年
6	公共建設局	新城填海A區與澳門半島連接橋(A3)	50,500.00	2027年	2026年	1年
7	公共建設局	新城填海A區與澳門半島連接橋A2	83,158,360.00	2024年	2025年	-1年
8	公共建設局/環境保護局	新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程	237,675,809.53	2027年	2024年	3年
9	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備 - 2021	4,926,800.00	2024年	2023年	1年
10	市政署	林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	20,000.00	2024年	2023年	1年
11	行政公職局	雲計算中心擴建工程	41,250,000.00	2025年	2024年	1年
12	房屋局	房屋局大樓重建工程	117,552,000.00	2026年	2025年	1年
13	社會工作局	新城A區A8地段社會設施大樓	2,537,300.00	2029年	2028年	1年
14	海事及水務局	新城A區西側道路 - 自來水公共供水管道鋪設工程	20,482,900.00	2024年	2023年	1年

Handwritten signature and date: 2023年7月7日

附件三

二零二三財政年度第四季度「投資計劃」 -  
執行期變動的項目  
(二零二三年第三季度與二零二三年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	第四季預計 完成日期	第三季預計 完成日期	變動
15	海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	400,000.00	2027年	2026年	1年
16	衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	24,275,000.00	2024年	2023年	1年
17	澳門大學	澳門大學 - 書院W11及W12加建層建造工程	24,830,000.00	2025年	2024年	1年
18	澳門保安部隊事務局	智慧保障	165,210,000.00	2025年	2024年	1年
19	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00	2025年	2024年	1年
20	澳門保安部隊事務局	智慧治安	5,500,000.00	2025年	2024年	1年
21	澳門特別行政區海關	智慧海關	58,650,000.00	2023年	2024年	-1年

林果



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件四

# 行政當局投資與發展開支計劃 二零二四財政年度第一季度 預算執行報告

潘任林  
梁  
七  
梁  
再  
一  
一  
三

行政當局投資與發展開支計劃  
二零二四財政年度第一季度  
預算執行報告



此頁留空



## 概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二四年第一季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

## 第一部份

二零二四年「投資計劃」的最初預算為澳門元 174 億 1,829 萬元，經核准後預算為澳門元 174 億 7,808 萬元，實際開支為澳門元 52 億 497 萬元，預算執行率為 29.8%<sup>1</sup>，預留金額為澳門元 138 億 7,768 萬元，預算使用率為 79.4%<sup>2</sup>。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准後預算為澳門元 63 億 732 萬元。當中「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 7 億 846 萬元，預算執行率及使用率分別為 32.6% 及 61.8%。其次為「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」，經核准後預算為澳門元 6 億 8,093 萬元，預算執行率及使用率分別為 30.0% 及 75.0%。

按組織分類分，房屋局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 55 億 2,614 萬元，佔整體預算的 31.6%，預算執行率及使用率分別為 33.1% 及 81.0%。其次為公共建設局及衛生局，公共建設局的經核准後預算為澳門元 49 億 4,500 萬元，佔整體預算的 28.3%，預算執行率及使用率分別為 43.4% 及 91.0%；衛生局的經核准後預算為澳門元 12 億 9,845 萬元，佔整體預算的 7.4%，預算執行率及使用率分別為 8.2% 及 52.3%。

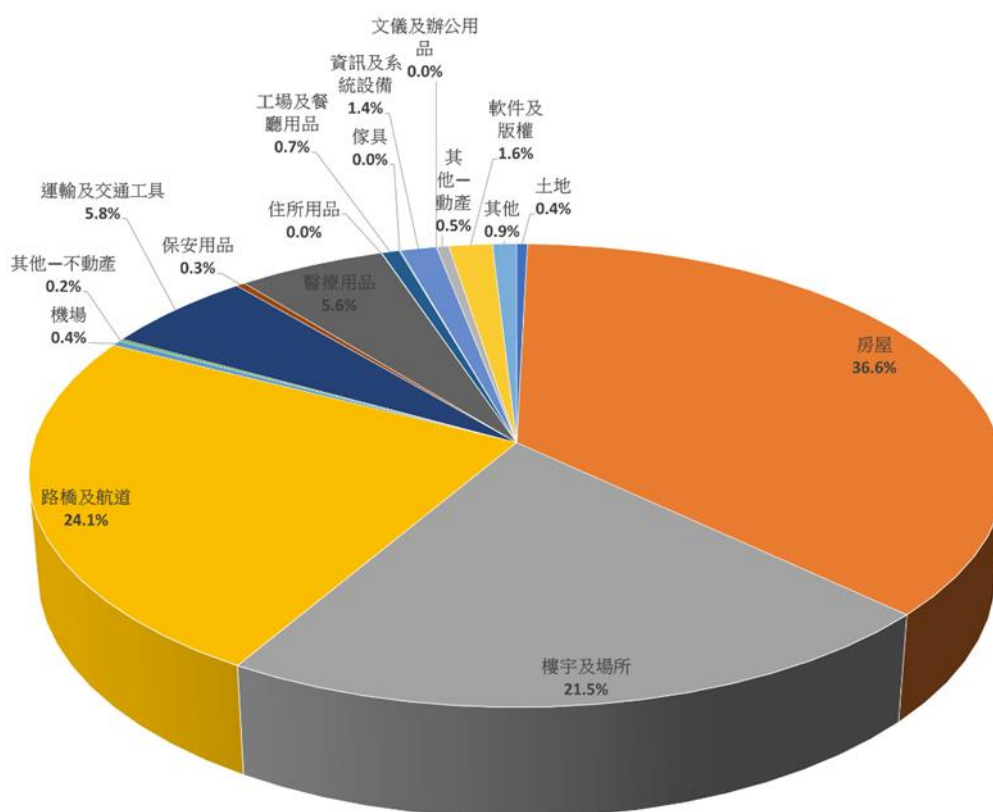
按經濟分類分，「房屋」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 63 億 9,662 萬元，佔整體預算的 36.6%，預算執行率及使用率分別為 34.9% 及 81.7%。當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 42 億 1,113 萬元，佔整體預算的 24.1%，預算執行率及使用率分別為 32.1% 及 86.8%，主要涉及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

---

1 實際開支 / 經核准後預算

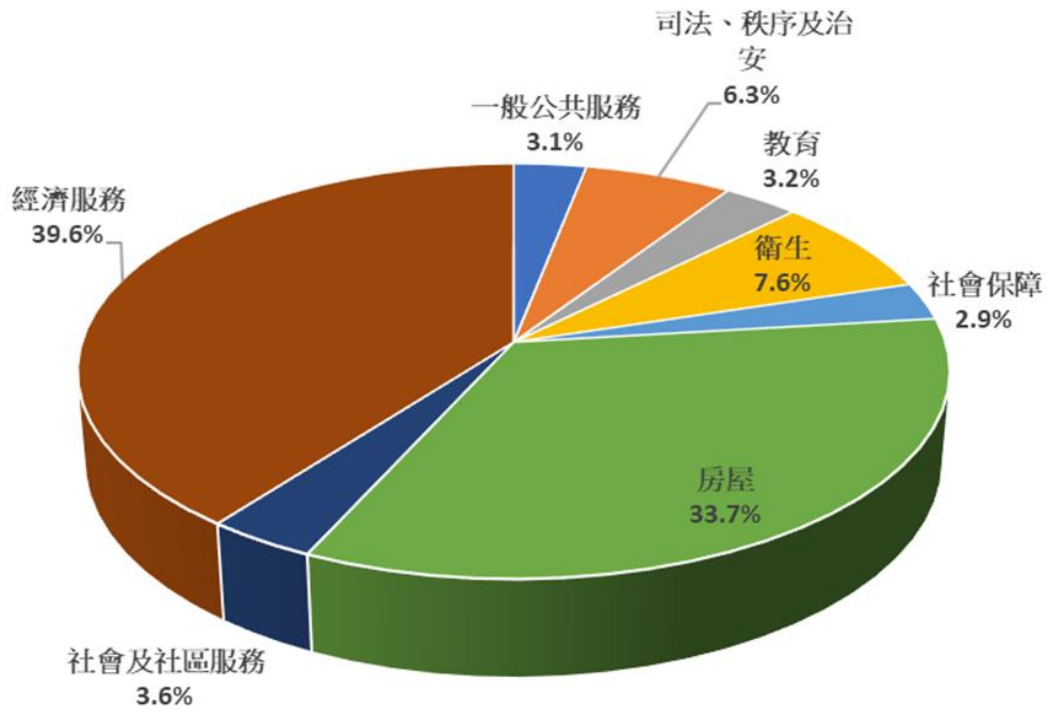
2 預留金額 / 經核准後預算

### 按經濟分類的經核准後預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 69 億 1,666 萬元，佔整體預算的 39.6%，預算執行率及使用率分別為 33.1% 及 84.6%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」等項目。其次為「房屋」，其經核准後預算為澳門元 58 億 9,181 萬元，佔整體預算的 33.7%，預算執行率及使用率分別為 34.3% 及 82.0%，當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配



此頁留空

# 按項目群

	二零二四年度 最初預算 <b>a</b>	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 <b>b</b>
公共設施工程	2,098,534,200.00	2,120,534,200.00
澳門城市集體運輸系統	1,968,157,700.00	1,968,157,700.00
公共房屋	6,307,322,100.00	6,307,322,100.00
路橋、山坡及航道	1,880,067,100.00	1,880,067,100.00
澳門大學橫琴新校園	214,227,800.00	214,227,800.00
部門設施工程	1,344,409,400.00	1,381,042,400.00
部門設備	575,583,200.00	575,583,200.00
公共設施設備	2,574,100.00	2,574,100.00
醫療設備	65,921,000.00	65,921,000.00
新監獄建造	179,409,100.00	180,570,105.68
運輸工具	106,592,000.00	106,592,000.00
建造離島醫療綜合體	1,229,286,900.00	1,229,286,900.00
儲水設施	3,773,900.00	3,773,900.00
智慧雲警務	32,450,000.00	32,450,000.00
新城填海區 A 區建造	1,409,980,600.00	1,409,980,600.00
<b>總額</b>	<b>17,418,289,100.00</b>	<b>17,478,083,105.68</b>

# 按項目群

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
354,424,036.88	1,520,734,339.73	16.7	71.7
1,134,336,506.50	1,929,678,080.56	57.6	98.0
2,233,605,654.54	5,124,839,864.50	35.4	81.3
206,966,696.73	1,553,007,196.97	11.0	82.6
23,812,768.60	158,130,624.10	11.1	73.8
477,183,385.54	1,086,912,573.18	34.6	78.7
998,525.00	378,410,517.05	0.2	65.7
2,574,006.00	2,574,006.00	100.0	100.0
0.00	6,311,094.30	0.0	9.6
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
0.00	99,556,000.00	0.0	93.4
104,557,548.69	643,744,260.97	8.5	52.4
331,412.90	773,554.90	8.8	20.5
0.00	0.00	0.0	0.0
629,778,637.64	1,211,270,771.15	44.7	85.9
<b>5,204,974,323.29</b>	<b>13,877,675,981.74</b>	<b>29.8</b>	<b>79.4</b>

# 按組織分類

	二零二四年度 最初預算 a	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00
財政局	573,155,300.00	587,792,300.00
身份證明局	34,700,000.00	34,700,000.00
博彩監察協調局	123,776,400.00	123,776,400.00
勞工事務局	0.00	21,996,000.00
行政公職局	303,598,800.00	303,598,800.00
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00
法務局	92,296,800.00	92,296,800.00
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00
交通事務局	76,300,000.00	76,300,000.00
環境保護局	850,000,000.00	850,000,000.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	4,945,004,200.00	4,945,004,200.00
文化局	252,196,700.00	274,196,700.00
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	415,084,500.00
海事及水務局	288,080,000.00	288,080,000.00
懲教管理局	179,409,100.00	180,570,105.68
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00
房屋局	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00
澳門旅遊學院	90,600,000.00	90,600,000.00
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00



# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
0.00	31,590,125.97	0.0	59.1
143,632,624.79	496,670,564.86	24.4	84.5
0.00	6,703,125.00	0.0	19.3
998,525.00	123,776,216.22	0.8	100.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	95,770,351.70	0.0	31.5
0.00	8,907,978.86	0.0	99.0
0.00	86,230,691.00	0.0	93.4
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	47,051,011.80	0.0	61.7
259,738,527.80	682,751,002.05	30.6	80.3
248,000.00	1,328,000.00	18.7	100.0
2,146,498,560.92	4,500,012,958.59	43.4	91.0
2,321,500.00	30,061,996.00	0.8	11.0
9,252,461.83	181,485,070.76	5.1	99.9
321,712,904.69	373,196,371.66	77.5	89.9
26,178,172.13	248,635,384.10	9.1	86.3
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
5,416,175.15	145,596,266.95	3.4	90.8
0.00	24,511,000.00	0.0	85.1
106,159,968.19	679,201,250.27	8.2	52.3
224,225,558.05	383,198,726.59	43.9	75.1
1,827,652,303.79	4,473,945,665.40	33.1	81.0
0.00	0.00	0.0	0.0
17,050,167.76	187,095,229.52	7.4	81.0
23,812,768.60	158,130,624.10	11.1	73.8
6,358,636.53	89,127,666.66	7.0	98.4
4,630,224.20	23,369,190.20	19.8	100.0
23,921,934.09	147,582,650.76	15.3	94.6

# 按組織分類

	二零二四年度 最初預算 <b>a</b>	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 <b>b</b>
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00
市政署	673,155,500.00	673,155,500.00
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門 醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>總額</b>	<b>17,418,289,100.00</b>	<b>17,478,083,105.68</b>

# 按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
0.00	3,682,100.00	0.0	18.4
18,760,165.50	486,331,664.39	2.8	72.2
0.00	0.00	0.0	0.0
<b>5,204,974,323.29</b>	<b>13,877,675,981.74</b>	<b>29.8</b>	<b>79.4</b>

# 按經濟分類

	二零二四年度 最初預算 <b>a</b>	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 <b>b</b>
土地	70,811,400.00	70,921,197.65
房屋	6,395,282,400.00	6,396,616,400.00
樓宇及場所	3,683,634,400.00	3,750,763,208.03
路橋及航道	4,548,362,000.00	4,211,125,204.17
機場	63,168,000.00	63,168,000.00
其他—不動產	35,865,900.00	29,157,610.00
運輸及交通工具	689,735,000.00	1,014,437,645.33
保安用品	59,137,600.00	59,137,600.00
醫療用品	1,012,175,400.00	981,457,962.09
住所用品	3,467,400.00	3,467,400.00
工場及餐廳用品	118,143,700.00	118,143,700.00
傢具	6,689,200.00	7,771,260.00
資訊及系統設備	226,563,500.00	240,725,300.00
文儀及辦公用品	202,800.00	202,800.00
其他—動產	77,029,600.00	82,526,030.41
軟件及版權	289,501,000.00	287,897,600.00
其他	138,519,800.00	160,564,188.00
<b>總額</b>	<b>17,418,289,100.00</b>	<b>17,478,083,105.68</b>

# 按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
11,740,411.64	65,094,089.51	16.6	91.8
2,233,614,478.54	5,223,152,839.50	34.9	81.7
937,565,593.58	2,909,497,980.99	25.0	77.6
1,353,488,135.18	3,654,952,899.92	32.1	86.8
0.00	0.00	0.0	0.0
331,412.90	4,139,264.90	1.1	14.2
639,975,000.00	976,407,652.37	63.1	96.3
0.00	9,351,125.97	0.0	15.8
1,243,116.85	409,716,757.49	0.1	41.7
0.00	0.00	0.0	0.0
20,332,768.60	62,625,903.60	17.2	53.0
0.00	1,346,247.00	0.0	17.3
2,574,006.00	175,939,725.63	1.1	73.1
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	71,995,430.86	0.0	87.2
2,800,000.00	161,059,470.00	1.0	55.9
1,309,400.00	152,396,594.00	0.8	94.9
<b>5,204,974,323.29</b>	<b>13,877,675,981.74</b>	<b>29.8</b>	<b>79.4</b>

# 按功能分類

	二零二四年度 最初預算 <b>a</b>	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 <b>b</b>
<b>1-00 一般公共服務</b>	<b>500,194,100.00</b>	<b>536,827,100.00</b>
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	500,194,100.00	536,827,100.00
<b>2-00 司法、秩序及治安</b>	<b>1,094,812,600.00</b>	<b>1,095,973,605.68</b>
2-01 指揮部	20,387,300.00	20,387,300.00
2-02 警察及海關	501,026,700.00	501,026,700.00
2-03 消防	10,500,000.00	10,500,000.00
2-04 民防	3,650,000.00	3,650,000.00
2-05 司法及秩序	379,839,500.00	379,839,500.00
2-06 懲教	179,409,100.00	180,570,105.68
<b>3-00 教育</b>	<b>564,528,200.00</b>	<b>564,528,200.00</b>
3-02 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
<b>4-00 衛生</b>	<b>1,335,368,300.00</b>	<b>1,335,368,300.00</b>
4-01 行政、規範及研究	19,670,000.00	19,670,000.00
4-02 醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00
<b>5-00 社會保障</b>	<b>510,316,800.00</b>	<b>510,316,800.00</b>
5-02 社會援助	510,316,800.00	510,316,800.00
<b>6-00 房屋</b>	<b>5,891,813,100.00</b>	<b>5,891,813,100.00</b>
6-01 行政、規範及研究	94,807,800.00	94,807,800.00
6-02 公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00

# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>123,551,529.96</b>	<b>449,521,979.61</b>	<b>23.0</b>	<b>83.7</b>
123,551,529.96	449,521,979.61	23.0	83.7
<b>379,161,813.95</b>	<b>937,346,720.17</b>	<b>34.6</b>	<b>85.5</b>
19,208,640.32	20,272,792.40	94.2	99.4
294,995,871.07	447,782,948.51	58.9	89.4
0.00	8,399,998.00	0.0	80.0
0.00	0.0	0.0	0.0
28,552,158.29	299,157,882.93	7.5	78.8
36,405,144.27	161,733,098.33	20.2	89.6
<b>47,221,572.89</b>	<b>458,864,520.28</b>	<b>8.4</b>	<b>81.3</b>
47,221,572.89	458,864,520.28	8.4	81.3
<b>106,159,968.19</b>	<b>677,174,113.27</b>	<b>7.9</b>	<b>50.7</b>
0.00	13,222,500.00	0.0	67.2
106,159,968.19	663,951,613.27	8.1	50.5
<b>224,225,558.05</b>	<b>383,198,726.59</b>	<b>43.9</b>	<b>75.1</b>
224,225,558.05	383,198,726.59	43.9	75.1
<b>2,020,255,282.39</b>	<b>4,833,650,026.91</b>	<b>34.3</b>	<b>82.0</b>
10,875,185.90	92,008,889.00	11.5	97.0
2,009,380,096.49	4,741,641,137.91	34.7	81.8

# 按功能分類

	二零二四年度 最初預算 <b>a</b>	二零二四年度 截至三月三十一日 經核准後預算 <b>b</b>
<b>7-00 社會及社區服務</b>	<b>604,599,600.00</b>	<b>626,599,600.00</b>
7-01 文化	252,196,700.00	274,196,700.00
7-02 體育及康樂	343,402,900.00	343,402,900.00
7-04 氣象及地球物理	9,000,000.00	9,000,000.00
<b>8-00 經濟服務</b>	<b>6,916,656,400.00</b>	<b>6,916,656,400.00</b>
8-01 行政、規範及研究	123,776,400.00	123,776,400.00
8-04 基礎設施	1,769,919,900.00	1,813,150,964.76
8-05 運輸	3,758,839,600.00	3,717,108,535.24
8-10 環保	849,464,000.00	847,964,000.00
8-12 科學技術	303,598,800.00	303,598,800.00
8-99 其他	111,057,700.00	111,057,700.00
<b>總額</b>	<b>17,418,289,100.00</b>	<b>17,478,083,105.68</b>



# 按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二四年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
<b>11,573,961.83</b>	<b>289,720,040.36</b>	<b>1.8</b>	<b>46.2</b>
2,321,500.00	30,061,996.00	0.8	11.0
9,252,461.83	250,750,065.50	2.7	73.0
0.00	8,907,978.86	0.0	99.0
<b>2,292,824,636.03</b>	<b>5,848,199,854.55</b>	<b>33.1</b>	<b>84.6</b>
998,525.00	123,776,216.22	0.8	100.0
671,985,319.36	1,630,234,466.87	37.1	89.9
1,336,390,669.04	3,248,284,381.46	36.0	87.4
259,738,527.80	680,715,002.05	30.6	80.3
0.00	95,770,351.70	0.0	31.5
23,711,594.83	69,419,436.25	21.4	62.5
<b>5,204,974,323.29</b>	<b>13,877,675,981.74</b>	<b>29.8</b>	<b>79.4</b>



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件五

# 二零二四財政年度第一季度 「投資計劃」預算執行情況

## 按建議部門

潘健林  
梁卓偉  
何志華  
何君堯  
梁家傑

附件五

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	248,000.00	1,328,000.00	18.7%	100.0%	2	-
公共建設局	4,945,004,200.00	4,945,004,200.00	2,146,498,560.92	4,500,012,958.59	43.4%	91.0%	40	6
文化局	252,196,700.00	274,196,700.00	2,321,500.00	30,061,996.00	0.8%	11.0%	10	6
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00	-	31,590,125.97	0.0%	59.1%	6	2
市政署	673,155,500.00	673,155,500.00	18,760,165.50	486,331,664.39	2.8%	72.2%	32	3
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
交通事務局	76,300,000.00	76,300,000.00	-	47,051,011.80	0.0%	61.7%	2	-
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00	-	8,907,978.86	0.0%	99.0%	1	-
行政公職局	303,598,800.00	303,598,800.00	-	95,770,351.70	0.0%	31.5%	7	2
身份證明局	34,700,000.00	34,700,000.00	-	6,703,125.00	0.0%	19.3%	3	2
房屋局	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00	1,827,652,303.79	4,473,945,665.40	33.1%	81.0%	25	5
法務局	92,296,800.00	92,296,800.00	-	86,230,691.00	0.0%	93.4%	2	-
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00	224,225,558.05	383,198,726.59	43.9%	75.1%	1	-
海事及水務局	288,080,000.00	288,080,000.00	26,178,172.13	248,635,384.10	9.1%	86.3%	11	2
財政局	573,155,300.00	587,792,300.00	143,632,624.79	496,670,564.86	24.4%	84.5%	9	4

林一

附件五

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	項目使用率	預算為零的項目
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00	-	24,511,000.00	0.0%	85.1%	1	-	-
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00	23,921,934.09	147,582,650.76	15.3%	94.6%	3	-	-
勞工事務局	-	21,996,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1
博彩監察協調局	123,776,400.00	123,776,400.00	998,525.00	123,776,216.22	0.8%	100.0%	1	-	-
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00	-	3,682,100.00	0.0%	18.4%	1	-	-
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	106,159,968.19	679,201,250.27	8.2%	52.3%	10	2	2
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00	23,812,768.60	158,130,624.10	11.1%	73.8%	17	4	4
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	415,084,500.00	321,712,904.69	373,196,371.66	77.5%	89.9%	8	2	2
澳門旅遊學院	90,600,000.00	90,600,000.00	6,358,636.53	89,127,666.66	7.0%	98.4%	1	-	-
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00	5,416,175.15	145,596,266.95	3.4%	90.8%	7	-	-
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00	17,050,167.76	187,095,229.52	7.4%	81.0%	1	-	-
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00	4,630,224.20	23,369,190.20	19.8%	100.0%	1	-	-
環境保護局	850,000,000.00	850,000,000.00	259,738,527.80	682,751,002.05	30.6%	80.3%	14	4	4
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1

3/3

黃紀林

附件五

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算執行情況  
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	執行率	預算使用率	項目數量	項目使用率為零的項目	預算
懲教管理局	179,409,100.00	180,570,105.68	36,405,144.27	161,733,098.33	20.2%	89.6%	1	-	-
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2	2
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00	9,252,461.83	181,485,070.76	5.1%	99.9%	2	-	-
合計	17,418,289,100.00	17,478,083,105.68	5,204,974,323.29	13,877,675,981.74	29.8%	79.4%	222	49	49

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

林



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件六

# 二零二四財政年度第一季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目

潘紀林  
梁  
L.  
曾  
區  
丁  
強

附件六

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	5,000,000.00	4,776,000.00
2	公共建設局	丞仔廣東大馬路空中走廊	5,600,000.00	3,902,500.00
3	公共建設局	路環業興大馬路空中走廊	3,800,000.00	3,800,000.00
4	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	3,056,900.00	3,056,900.00
5	公共建設局	大潭山隧道	1,905,000.00	2,903,000.00
6	公共建設局	新城 A 區行人隧道及行人天橋	900,000.00	900,000.00
7	文化局	政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程	125,240,000.00	125,240,000.00
8	文化局	內港碼頭23號及25號修復及活化工程	17,000,000.00	17,000,000.00
9	文化局	永福圍活化工程	15,000,000.00	15,000,000.00
10	文化局	益隆炮竹廠舊址局部活化工程	15,000,000.00	12,000,000.00
11	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	10,500,000.00	10,500,000.00
12	文化局	荔枝碗船廠片區第二期活化工程	4,445,400.00	4,445,400.00
13	司法警察局	司法警察局法證專用設備-2024	10,250,000.00	10,250,000.00
14	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備-2024	9,900,000.00	9,900,000.00

陳國治

附件六

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
15	市政署	外港及南灣湖新填海區道路優化工程	19,000,000.00	19,000,000.00
16	市政署	路環區道路優化工程	5,000,000.00	5,000,000.00
17	市政署	台暉樓辦公室裝修工程	8,000,000.00	4,000,000.00
18	民航局	機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	63,168,000.00	63,168,000.00
19	行政公職局	災備雲建設工程	28,200,000.00	28,200,000.00
20	行政公職局	電子政務展廳展品	20,000,000.00	20,000,000.00
21	身份證明局	購買專有雲平台系統	19,200,000.00	19,200,000.00
22	身份證明局	構建身份證明局檔案室	3,000,000.00	3,000,000.00
23	房屋局	新城A區B14地段公共房屋建造工程	3,954,000.00	3,954,000.00
24	房屋局	新城A區B16地段公共房屋建造工程	3,709,000.00	3,709,000.00
25	房屋局	新城A區B13地段公共房屋建造工程	3,618,000.00	3,618,000.00
26	房屋局	新城A區B15地段公共房屋建造工程	3,310,000.00	3,310,000.00
27	房屋局	新城A區A13地段公共房屋建造工程	3,303,000.00	3,303,000.00
28	海事及水務局	路氹蓮花路-公共供水管網鋪設工程	-	7,977,340.00

林業



附件六

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
29	海事及水務局	海事及水務局船隊—拖輪	7,036,000.00	7,036,000.00
30	財政局	珠光大廈QR/C社會設施裝修工程	-	14,637,000.00
31	財政局	特區帳目系統	7,200,000.00	7,200,000.00
32	財政局	《智慧財政》第一階段	4,809,000.00	4,809,000.00
33	財政局	《公共採購資訊平台》第一階段	4,500,000.00	4,500,000.00
34	勞工事務局	勞工事務局金龍中心辦事處裝修工程	-	21,996,000.00
35	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	17,700,000.00	17,700,000.00
36	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	4,620,000.00	4,997,783.00
37	澳門大學	澳門大學 - N21科研大樓六樓智慧城市物聯網國家重點實驗室建造工程	18,000,000.00	13,550,000.00
38	澳門大學	澳門大學 - IAPME量子材料及器件測試設備	8,000,000.00	8,000,000.00
39	澳門大學	澳門大學 - S27教職員宿舍建造工程	5,850,000.00	5,850,000.00
40	澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	264,000.00	264,000.00
41	澳門保安部隊事務局	智慧保障	28,800,000.00	28,800,000.00

李佩林

附件六

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
42	澳門保安部隊事務局	第六階段「全澳城市電子監察系統」建設	8,200,000.00	8,200,000.00
43	環境保護局	廚餘集中處理設施	87,790,900.00	75,267,304.63
44	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	47,662,000.00	46,392,950.00
45	環境保護局	內港南臨時污水處理設施建造工程	17,800,000.00	17,800,000.00
46	環境保護局	飛灰暫存倉建造工程	10,980,000.00	10,980,000.00
47	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	醫學中心-設施設備	40,000,000.00	40,000,000.00
48	警察總局	智慧民生	1,850,000.00	1,850,000.00
49	警察總局	智慧民防	1,800,000.00	1,800,000.00
合計			733,921,200.00	752,743,177.63

潘任林 梁上 軍 氏 氏 氏



澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## 附件七

# 二零二四財政年度第一季度 「投資計劃」 - 執行期變動的項目

(二零二三年第四季度與二零二四年第一季度比較)

林業  
學  
心  
甲  
區  
下  
行

附件七

二零二四財政年度第一季度「投資計劃」 -  
執行期變動的項目  
(二零二三年第四季度與二零二四年第一季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	2024年第一季		2023年第四季	變動
				預計完成日期	預計完成日期		
1	公共建設局	輕軌東線項目	1,142,881,468.00	2031年	2028年	2028年	3年
2	公共建設局	新城A、B區行車天橋設計連建造工程	75,138,724.63	2030年	2027年	2027年	3年
3	公共建設局	路氹蓮花路公共道路及排水網重整工程	48,977,597.32	2025年	2024年	2024年	1年
4	公共建設局	大潭山隧道	2,903,000.00	2029年	2028年	2028年	1年
5	公共建設局	林茂塘區行人天橋	31,158,651.68	2024年	2026年	2026年	-2年
6	公共建設局/環境保護局	新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程	993,322,141.00	2024年	2027年	2027年	-3年
7	文化局	澳門演藝學院分校設計及裝修工程	20,060,000.00	2025年	2024年	2024年	1年
8	市政署	石排灣郊野公園發展規劃	7,650,000.00	2025年	2024年	2024年	1年
9	行政公職局	雲計算中心擴建工程	75,398,800.00	2024年	2025年	2025年	-1年
10	澳門大學	澳門大學 - S32教職員宿舍建造工程	32,767,000.00	2025年	2024年	2024年	1年
11	澳門大學	澳門大學 - 研究生宿舍建造工程	700,000.00	2027年	2026年	2026年	1年
12	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	46,392,950.00	2036年	2030年	2030年	6年

梁卓人
