



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共財政事務跟進委員會

第 3/VII/2025 號報告書

事由：跟進《二零二四財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》

一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第1/2004號決議、第2/2009號決議、第1/2013號決議、第1/2015號決議及第2/2017號決議修改的第1/1999號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於2021年11月19日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第1/2021號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

4. 委員會履行本身職責，於2025年5月22日召開會議以跟進《二零二四財政年度第四季度投資計劃預算執行報告》。會後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。
5. 政府於2025年6月11日就委員會所提出的問題提供了回覆。
6. 委員會經分析政府提供的回覆後，一致認為政府提供的回覆資料內容詳細，為此，委員會決定不再邀請政府代表列席會議就相關事宜向委員會作介紹與溝通。
7. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
8. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

二、跟進情況

9. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。
10. 按照政府提供的資料，「輕軌東線項目」2024年第三季度的項目預算為138.8億元；2024年第四季度項目的項目預算則增加1.4億元至140.2億元。按照政府的說明，表示因有新服務及後加工程判給，故金額作出相應調整。然而，經查閱上述兩季度的資料，該項目的判給金額僅增加1.3億元。為此，要求政府詳細說明有關差異的原因，以及調整項目預算金額的準則。此外，是否尚有涉及該項目的工作所需預算未被納入項目預算內。

黃
一
致
認
為
政
府
提
供
的
回
覆
資
料
內
容
詳
細
，
為
此
，
委
員
會
決
定
不
再
邀
請
政
府
代
表
列
席
會
議
就
相
關
事
宜
向
委
員
會
作
介
紹
與
溝
通
。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

11. 政府回覆：

東線項目於 2024 年第四季的项目估算金額為 140.2 億元，於填寫 2024 年第四季季度報告時，項目估算金額包含當時正在進行判給程序及近期將會判給的後加工程及服務，因實際判給金額及時程與預計有出入，故導致出現差異。

在 2024 年第四季度預算執行報告中所示已判給金額基礎上，2025 年已有的新判給包括：輕軌東線之行車系統-機電設施質量控制、輕軌東線之行車系統-土建工程質量控制及管線遷移等。

12. 按照政府提供的資料，「輕軌東線項目」的完成日期由最初的 2027 年，延長至 2031 年。為此，要求政府詳細說明有關項目現時的工作進度、各個進度節點，以及相關年度的預算安排。

13. 政府回覆：

「輕軌東線項目」於立項時的預計執行期為至 2027 年，東線項目判給後，按施工期計算，土建工程預計於 2028 年完工，而行車系統預計於 2029 年完工，而由於行車系統方面有部分工作會在通車之後繼續執行，故財務上亦需預留至 2031 年。

輕軌東線土建工程正進行車站主體結構、盾構隧道及明挖隧道等施工，總體進度已完成約 42%，行車系統進度已完成約



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

23%，基本符合進度要求，所有工作均沒有超出各個里程碑所定的期限。

有關東線項目相關年度預算安排如下（未包含未判給的工程、服務及後加工作等）：

2025 年之前年度已支付開支	3,614,107,145.16
2025 年預計開支	3,962,680,100.00
2026 年預計開支	3,070,000,000.00
2027 年預計開支	2,100,000,000.00
2028 年預計開支	820,000,000.00
2029 年預計開支	330,000,000.00
2030 年預計開支	85,000,000.00
2031 年預計開支	51,715,340.84

14. 按照政府提供的資料，「路環西側防洪排澇設施」的項目預算由2024年第三季度的7億元增加至2024年第四季度的12.6億元，按照政府的說明是因為增加第二期的工程內容所致。為此，請政府詳細說明：

- (1) 增加的項目預算具體用以承擔哪些工作開支；
- (2) 現時的具體工作進度，第一期的工作是否已完成，完成後是否可達到預期的初步效益；
- (3) 整個項目分多少期執行，除已披露的第一期和第二期外，尚有多少期的工作。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

15. 政府回覆：

- (1) 增加的項目估算主要用以承擔項目第二期的工程、監察、質量控制、環境監控、供電及供水等的費用。
- (2) 「路環西側防洪排澇設施」的第一期工程於2025年3月31日正式開展，預計將於2027年第3季完成，而工程第二期會視乎第一期工程的實際進度適時展開招標工作，以確保兩期工程的前後銜接；另外，項目第一期工程僅包括有關的涉水工作，完成後將達致防洪規劃的初步效益，然而整體項目將於完成第二期工程後滿足防洪（潮）及排澇的要求。
- (3) 按計劃，項目整體分為兩期進行，第一期主要包括建造防洪圍堤、換水閘及臨時水文觀測站等涉水工作，而第二期則主要包括建造兩污水泵站、擋水閘、人行橋、圍堤上的飾面綠化，以及對陸域的排水渠網擴容等工作，除此，暫無其他安排。

16. 按照在2025年4月30日市政署發佈的消息，於同日啟動「黑沙青少年活動體驗營」項目首階段園區遊具設施招標，並在第三季將進行園區第一期工程公開招標。然而，截至2024年第四季度，「黑沙青少年活動體驗營」項目的預算執行率為零，而提供的



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

項目進度說明亦僅表示由於整個項目尚於概念設計階段，並會於廣納社會意見後作優化及調整。為此，要求政府詳細說明項目最新具體計劃，以及計劃將包含的主要元素和設施。

17. 政府回覆：

市政署經廣泛收集意見及深入分析後，制定「黑沙青少年活動體驗營」2025 年建設方案，在確保安全質量、嚴格控制預算的前提下，維持體驗營的定位及核心項目、園區佈局及功能分區等不變，對建築構造及工法、專項設計等方面作出調整和優化，控制估算在 5 至 6 億元內。

「黑沙青少年活動體驗營」選址位於路環鄰近賈梅士大馬路之土地，土地總面積約為 94,613 平方米。計劃為全澳居民，尤其是兒童、青少年提供一個“水、陸、空”多方位的立體歷奇體驗營，項目由 12 個主題功能區組成、提供逾 200 個“水、陸、空”遊樂歷奇項目，主要包括歷奇塔、高空滑索、網袋攀爬、網繩訓練、山地自行場、滑板場、Wargame 場、兒童四輪車場、親水及戲水區、創意積木區、自然科普區、夢想舞台區(多用途大草坪)、露營區、兒童遊樂場區、蹦蹦雲區、手工作坊區、露天停車場、商業配套區及後勤區等，同時項目尚包括建造及完善本地段之防滯排水等基建設施。由於「黑沙青少年活動體驗營」規劃面積大，計劃分期發展，分四個標段進行招標：



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

第一標段：《黑沙青少年活動體驗營工程－遊具設施之供應連建造工程》，已於 2025 年 4 月 30 日進行招標；

第二標段：《黑沙青少年活動體驗營工程－園區建造工程(第一期)》，正根據收集的意見進行修改，預計於 2025 年第三季招標；

第三標段：《黑沙青少年活動體驗營工程－園區建造工程(第二期)》，因工期較短，故將配合園區第一期工程進度，適時進行招標；

第四標段：《黑沙青少年活動體驗營工程－綠化工程》，涉及全區的綠化工作，將配合園區工程進度，適時進行招標。

預計 2026 年下半年先開放露營區和四輪車場予居民使用，爭取 2027 年第四季工程全部竣工，進入試營運階段。

18. 按照政府的資料，截至2024年第四季度「永福圍活化工程」和「荔枝碗船廠片區第二期活化工程」兩項目的預算執行率皆為零。該兩項目的建議部門及執行部門皆為文化局。而早前於立法會辯論經濟財政領域2025年度施政方針政策時，政府表示，決定由經濟財政司統領六大片區的開發工作，而社會文化司轄



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

下部門也會協助。為此，要求政府詳細說明上述兩個項目的最新計劃和進度。

19. 政府回覆：

永福圍活化工程目前執行情況

「永福圍活化工程」目前已基本完成設計工作，已於 2024 年 10 月向土地工務局提交工程計劃，土地工務局於 2025 年 4 月發出不核准工程計劃的意見，設計公司正進行有關修改計劃，文化局將積極與各權限部門溝通協調修改次階段建築計劃。

活動名稱	執行進度
建造工程	- 首階段工程預計 2025 年 6 月簽署合同及開展工程，預計於 2026 年第一季完成工程。 - 次階段將待圖則獲土地工務局批准後開展。
監察	正上呈監察服務的開展書面諮詢建議。
建造施工技術支援服務	正上呈建造施工技術支援服務的開展書面諮詢建議。
電力接駁工程	正準備上呈電力接駁工程的開展書面諮詢建議。
供水接駁工程	正準備上呈供水接駁工程的開展書面諮詢建議。
工程質量檢測服務	正上呈工程質量檢測服務的開展書面諮詢建議。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

延期原因：

由於本項目屬舊有建築物的擴建工程，具複雜性（如更改建築物用途、原建築物未能符合現行結構條例、消防條例等），與部門討論及達到共識的時間較長，故設計工作及核准工程計劃的時段有所延遲。

目前計劃：

本次執行的「永福圍活化工程」項目主要目的是更改建築用途、結構加固、建造消防系統等基礎建設，令建築物將來可以兼容更多不同的功能（包括展覽、演出、工作坊、商業等），為日後商戶進駐、或文化團體進駐創造條件。文化局將按原訂計劃積極推進有關活化工程的實施。

同時，六大片區的開發工作繼續由跨司協作，但已改由經濟財政司統籌，因此，文化局將持續與經濟財政司相關部門保持溝通，探討活化後的功能用途，相互配合共同推進有關活化工作。

荔枝碗船廠片區第二期活化工程項目最新進度

「荔枝碗船廠片區第二期活化工程」現正處於設計階段，預計 2025 年第二季可完成圖則設計工作，向土地工務局提交工程計劃審批，通過後開展相關工程招標程序。因設計工作有所延遲，目前預計整個項目需順延至 2027 年完成。

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

活動名稱	執行進度
監察服務/質量控制服務	配合設計工作的進度，預計 2026 年 2 月上呈開展書面諮詢建議。
設計	設計預計 2025 年第二季可完成圖則設計工作，並向土地工務局提交工程計劃。
工料測量服務	配合設計工作的進度，預計 2025 年 7 月上呈開展書面諮詢建議。
建造工程	配合設計工作的進度，並待土地工務局審批工程計劃後才具條件開展公開招標程序，預計 2025 年 10 月開展相關招標程序。

延期原因：

由於荔枝碗船廠片區 X3、X5~X10 地段現場環境狀況較預期中複雜，前期的測繪及現況調查工作進度受影響，深化設計時亦需結合現場實際情況對設計方案進行修改完善，故設計工作進度有所延遲，後續工作計劃因應設計工作的進度而需進行調整。

目前計劃：

本次執行的「荔枝碗船廠片區第二期活化工程」項目，主要目的是修復加固船廠結構、建造地基、供水供電及消防系統等基礎建設，令建築物將來可以兼容更多不同的功能（包括展覽、



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

演出、工作坊、商業等），為日後商戶進駐、或文化團體進駐創造條件。文化局將按原訂計劃積極推進有關活化工程的實施。

同時，文化局將持續與經濟財政司相關部門保持溝通，探討活化後的功能用途，相互配合共同推進有關活化工作。

20. 按照政府的資料顯示「醫學中心-設施設備」項目中有關醫院手術室和深切治療部（ICU）服務於2024年仍處於規劃階段，具體服務計劃將於稍後開展，並將執行期延至2026年。為此，要求政府詳細說明有關該手術室和深切治療部（ICU）醫療設備的採購程序進度，以及手術室和深切治療部（ICU）預計投入服務的日期。

21. 政府回覆：

手術室和深切治療部（ICU）醫療設備的採購程序進度：

- (1) 手術室醫療設備的預算是為 8,000 萬元，將為三個複合手術室配置數位減影血管造影成像系統（DSA）設備。2025 年第一季主要為開展前期籌備工作，其中一個 DSA 複合手術室設備（預計 2,880 萬元）的書面諮詢條款現正草擬中，已進入最後階段，開標建議書將於6月初上呈批示，預計2025年第三季可作出判給。餘下的兩個 DSA 複合手術室術間設備（預計共 5,000 萬元），現正編製技術規格要求及詢價文件中，預計 6 月中旬可上呈開標建議書，預計 2025 年第四季後期



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

可作出判給。

- (2) 深切治療部（ICU）醫療設備 2025 年預算為 2,000 萬元，部分項目已確定技術規格要求，現正草擬諮詢文件，6 月中旬可陸續上呈開標建議書，預計 2025 年度第四季起陸續作出判給。

手術室和深切治療部（ICU）預計投入服務的日期：

按現時情況及預計採購進度，手術室和深切治療部（ICU）預計可於 2026 年第二季開始逐步投入服務。

22. 按照政府提供的資料，在2024年第三季度，「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」項目中，有關「澳門理工學院總部新圖書館及辦公樓連停車場興建工程」的判給金額為6.3億元。然而，在2024年第四季度，該項工程的判給金額調整為5.4億元，減少8,296萬元，較政府表示的減少6,589萬元，多約1,707萬元。為此，要求政府說明有關差異的原因。

23. 政府回覆：

有關差異之原因如下：

就「澳門理工學院總部新圖書館及辦公樓連停車場興建工程」的判給而言：



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

有關工程於 2019 年判給，判給金額為 6.47 億元，但於實際興建過程中，因預視部分工程量調整，故澳門理工大學調低判給金額至 6.3 億元。上述工程最終於 2024 年年底竣工，因部分分項工程的實際工程量及使用原材料量較原判給數量減少故調低判給金額至 5.4 億元，因此，2024 年第四季度所顯示的判給金額對比第三季度減少 8,296 萬元。

就上述工程於 2024 年度之開支預算而言：

2024 年度獲核准開支預算約為 1 億 7,892 萬元，而當年度實際結算金額約為 1 億 1,303 萬元，兩者相差約 6,589 萬元，基此，2024 年度第四季 PIDDA 預算執行報告中所載該項工程活動的實際開支較原獲核准之預算金額減少 6,589 萬元。

綜上所述，減少 8,296 萬元（判給總金額相差）與減少 6,589 萬元（2024 年度預算與實際差額）屬不同計算基礎。

三、財政分析

24. 2024 年的「投資計劃」最初預算為 174.2 億元，截至第四季度的經核准預算為 190.9 億元，較最初預算增加 16.7 億元，實際開支為 176.8 億元，預算執行率為 92.6%，預留金額為 184.6 億元，預算使用率為 96.7%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

25. 值得一提的是，2024年的「投資計劃」預算執行率低於50%的部門有如下2個：

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	百萬澳門元	
						預算 使用率為	預算 項目 數量
民航局	63	63	7	7	11.7%	2	1
身份證明局	35	28	9	9	32.4%	3	1

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

26. 截至2024年第四季度民航局登錄了2個項目，預算執行率為11.7%，該2個項目分別是「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」和「氹仔客運碼頭直升機場」。「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」項目的預算執行率為0，按照政府提供的項目預算執行情況說明顯示，「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」項目中的機場第二候機樓的項目已暫緩執行，而氹仔客運碼頭直升機場的項目，則為了配合公共建設局開展氹仔客運碼頭直升機場的整治工作，故將該項目轉移至「氹仔客運碼頭直升機場」項目；按照資料，政府於2024年第三季度設立了「氹仔客運碼頭直升機場」項目，而截至2024年第四季度，該項目的預算執行率為91.9%。

27. 另外，截至2024年第四季度，身份證明局登錄了3個項目，預算執行率為32.4%，該3個項目分別是「購買電子旅行證件製作系統硬件升級服務」、「構建身份證明局檔案室」和「購買專有



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

雲平台系統」，按政府提供的資料分析，身份證明局預算執行率偏低的原因，主要是該局為配合澳門特別行政區政府的整體電子政務規劃及發展，以及為善用資源，經重新審視所有網上服務後，計劃將外網系統遷移至澳門特別行政區政府的專有雲平台上；同時，該局考慮到外網專有雲平台及內網專有雲平台的需求不同，在系統配置上需作調整。故此，取消了「購買專有雲平台系統」項目的採購，以致該項目的預算執行率為0，涉及預算開支1,800萬元，占該局整體投資計劃預算的65%。

28. 按部門分析，2024年第四季度「投資計劃」的經核准預算金額發生變動的部門有如下8個：

		百萬澳門元		
序號	建議部門	第四季度 經核准預算	第三季度 經核准預算	變動金額
1	公共建設局	6,214	5,282	932
2	終審法院院長辦公室	286	156	129
3	房屋局	5,525	5,526	-1
4	勞工事務局	18	19	-1
5	海事及水務局	197	198	-1
6	財政局	599	604	-5
7	環境保護局	903	917	-14
8	文化局	285	409	-124

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

29. 在上述經核准預算金額發生變動的8個部門中，公共建設局的經核准預算增加的金額最高，為9.3億元，按照政府提供的資料顯



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

示，主要是增加「輕軌東線項目」的經核准預算，涉及的金額為7.3億元；其次是終審法院院長辦公室的經核准預算增加1.3億元，分別增加「南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程」項目6,949萬元和「南灣大馬路終審法院大樓建造工程」項目6,000萬元。

30. 此外，文化局的經核准預算減少1.2億元，為減少「政府歷史檔案大樓室內設計及裝修工程」項目的經核准預算，截至2024年第四季度，該局正上呈「政府歷史檔案大樓室內裝修工程」的判給建議書予權限實體。
31. 將2024年第四季度「投資計劃」與2024年第三季度「投資計劃」比較，經核准預算增加9.2億元，實際開支增加48.7億元，預留金額增加14.8億元，預算執行率上升22.1%，預算使用率亦上升3.3%。

百萬澳門元

2024 年	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數量
第四季	19,092	17,684	18,459	92.6%	96.7%	243
第三季	18,175	12,815	16,977	70.5%	93.4%	241
變化	916	4,869	1,481	22.1%	3.3%	2

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

32. 截至2024年第四季度「投資計劃」共登錄243個項目，其中有2個項目是在第四季度期間登錄的新設立項目，涉及的經核准預算為147萬元。2024年第四季度沒有項目被取消。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
嘉樂庇總督大橋結構維修工程	1,224,620.00	新項目	55,984,620.00	2024	2027

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
環保加 Fun 站設計及建造工程—慕拉士	245,000.00	新項目	10,600,000.00	2024	2025

33. 截至2024年第四季度「投資計劃」的經核准預算較2023年同期減少39.4億元，實際開支減少19.8億元，預留金額減少22.7億元，預算執行率上升7.2%，預算使用率則上升6.7%。「投資計劃」共登錄243個項目，較2023年同期的276個項目，減少33個。

百萬澳門元

第四季	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量
2024 年	19,092	17,684	18,459	92.6%	96.7%	243
2023 年	23,031	19,668	20,729	85.4%	90.0%	276
變化	-3,940	-1,984	-2,270	7.2%	6.7%	-33

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

34. 截至2024年第四季度，「投資計劃」預算執行率為零的項目有12個，涉及的經核准預算為1.6億元：



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

環境保護局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
路環污水處理廠升級工程 II	37,659,000.00	37,102,430.00	0.0%	98.5%

澳門保安部隊事務局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
消防局港珠澳大橋行動站 新控制中心建造工程	1,128,960.00	0.00	0.0%	0.0%

衛生局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
青茂口岸澳門邊檢大樓十 七樓衛生局部份裝修工程	4,997,783.00	4,997,783.00	0.0%	100.0%

海事及水務局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
石排灣水庫擴容整治	402,000.00	401,960.00	0.0%	100.0%

身份證明局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
購買專有雲平台系統	18,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%

Handwritten signature and notes on the right margin.



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

行政公職局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
災備雲建設工程	19,144,480.00	0.00	0.0%	0.0%
電子政務展廳展品	980,000.00	0.00	0.0%	0.0%

民航局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	55,118,000.00	0.00	0.0%	0.0%

市政署

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
黑沙青少年活動體驗營	12,308,520.26	4,066,600.00	0.0%	33.0%

文化局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
永福圍活化工程	5,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
荔枝碗船廠片區第二期活化工程	4,445,400.00	1,512,000.00	0.0%	34.0%

公共建設局

項目名稱	經核准預算	預留金額	預算 執行率	預算 使用率
偉龍馬路公共房屋建造工程	4,307,233.33	0.00	0.0%	0.0%



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

35. 在上述12個預算執行率為零的項目中，有5個項目已作出預留款項的程序，但卻未有作出任何支付開支的記錄，這表示在2024年財政年度，該5個項目已作出了判給開支的程序，並計劃在當年作出支付開支，但最終卻由於各自原因，而沒有按計劃作出支付開支。
36. 經分析2024年第四季度「投資計劃」項目的資料，以及將當中的243個項目與2024年第三季度「投資計劃」項目作比較後，得悉政府對其中40個項目的執行期作出修改，分別有36個為推遲預計完成日期和4個為預計完成日期提前的項目，詳細可參閱附件三。
37. 值得一提的是，按照項目執行期變動的資料顯示，「新城區海底隧道工程」項目2024年第三季度預計於2027年完成，至第四季度則預計於2024年完成，政府表示，該項目已變為「新城A、B區行車天橋設計連建造工程」項目，原項目已終止。有關該項目的預計完成日期的變動(由2024年第二季度指出預計完成日期為2024年，調整為第三季指出預計完成日期為2027年)，委員會已要求政府作出說明，按照政府寄來的回覆，表示為錯誤輸入所致，預計完成日期應維持為2024年。
38. 此外，經分析及比較2024年第三季度及2024年第四季度「投資計劃」項目的最新估算金額，得悉有25個項目的最新估算金額有所增加，50個項目的最新估算金額有所減少，162個項目的最



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

新估算金額則沒有變動。另外，有4個項目的預算從概算金額調整為估算金額。

39. 經比較2024年第三季度與2024年第四季度「投資計劃」的項目最新估算金額，整體預算金額變動超過1億元的項目有如下4個：

百萬澳門元

序號	建議部門	項目名稱	第四季度項目 最新估算金額	第三季度項目 最新估算金額	變動
1	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	1,262	703	559
2	公共建設局	輕軌東線項目	14,019	13,878	140
3	離島醫療綜合體北 京協和醫院澳門醫 學中心	醫學中心-設施設備	150	40	110
4	社會工作局	長者公寓	2,210	2,359	-149

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

四、意見和建議

40. 截至2024年第四季度「投資計劃」的預算執行率達92.6%，整體執行進度理想，委員會對此表示肯定。
41. 此外，值得一提的是，政府交來的「行政當局投資與發展開支計劃」二零二四財政年度第四季度項目執行狀況的資料內，新增了一欄名稱“項目最新估算金額與上一期季度報告/預算案不同的原因”，該欄目是為說明項目預算在季度間變動的原因，新增的欄目，有助委員會更好地跟進項目預算變動的原因。



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

五、總結

42. 委員會總結如下：

- (1) 將本報告書向立法會主席提交，並建議派發予全體議員；
- (2) 將本報告書送交特區政府。

二零二五年八月七日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

陳澤武

邱庭彪

龐川

林倫偉

黃
吳
陳
陳
陳



澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

梁鴻細

梁鴻細

張健中

張健中

羅彩燕

李良汪

李良汪

黃
一
區
一
任
林

李 友 珍 仁 林

林 仁 弘

行政當局投資與發展開支計劃

二零二四財政年度第四季度

預算執行報告



二零二五年二月
財政局

此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二四年第四季的「投資計劃」預算執行報告。

本報告共分兩部份，第一部份為對「投資計劃」預算的扼要說明，主要以文字及圖表的方式介紹「投資計劃」預算的一些重要資訊及數據，以反映預算的總體執行狀況。第二部份為各項目的具體執行狀況資料，透過該等項目資料，可詳細了解各項目的執行狀況，乃至其預計的執行期、項目預算總額等資料。

第一部份

二零二四年「投資計劃」的最初預算為澳門元 174 億 1,829 萬元，經核准預算為澳門元 190 億 9,161 萬元，實際開支為澳門元 176 億 8,430 萬元，預算執行率為 92.6%¹，預留金額為澳門元 184 億 5,874 萬元，預算使用率為 96.7%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准預算為澳門元 63 億 732 萬元。當中「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」的經核准預算金額最高，為澳門元 7 億 2,055 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.9%及 100.0%。其次為「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 6 億 8,093 萬元，預算執行率及使用率分別為 99.8%及 100.0%。


按組織分類分，公共建設局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 62 億 1,392 萬元，佔整體預算的 32.5%，預算執行率及使用率分別為 96.3%及 99.1%。其次為房屋局及衛生局，房屋局的經核准預算為澳門元 55 億 2,485 萬元，佔整體預算的 28.9%，預算執行率及使用率分別為 98.9%及 99.8%；衛生局的經核准預算為澳門元 12 億 9,845 萬元，佔整體預算的 6.8%，預算執行率及使用率分別為 69.9%及 89.5%。

1 實際開支 / 經核准預算

2 預留金額 / 經核准預算


按經濟分類分，「房屋」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 64 億 450 萬元，佔整體預算的 33.5%，預算執行率及使用率分別為 98.2%及 99.3%。當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准預算為澳門元 53 億 9,872 萬元，佔整體預算的 28.3%，預算執行率及使用率分別為 93.8%及 98.0%，主要涉及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「輕軌東線項目」等項目。

按經濟分類的經核准預算分配

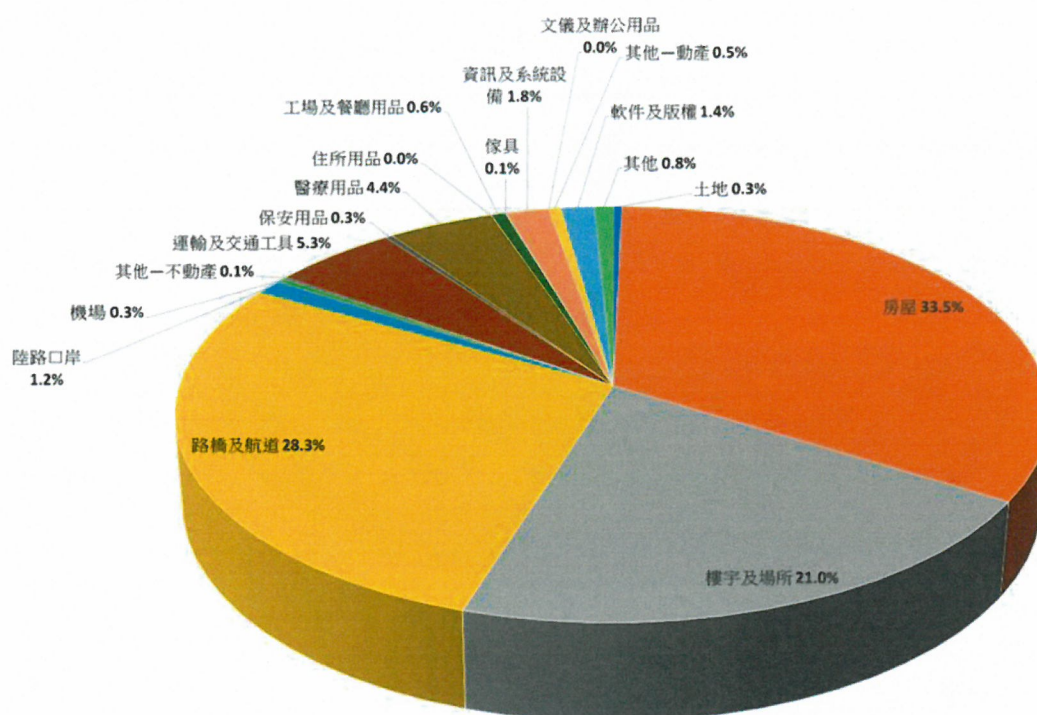

按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 82 億 149 萬元，佔整體預算的 43.0%，預算執行率及使用率分別為 93.4%及 97.2%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」等項目。其次為「房屋」，其經核准預算為澳門元 58 億 9,135 萬元，佔整體預算的 30.9%，預算執行率及使用率分別為 98.8%及 99.8%，當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。

按功能分類的經核准預算分配

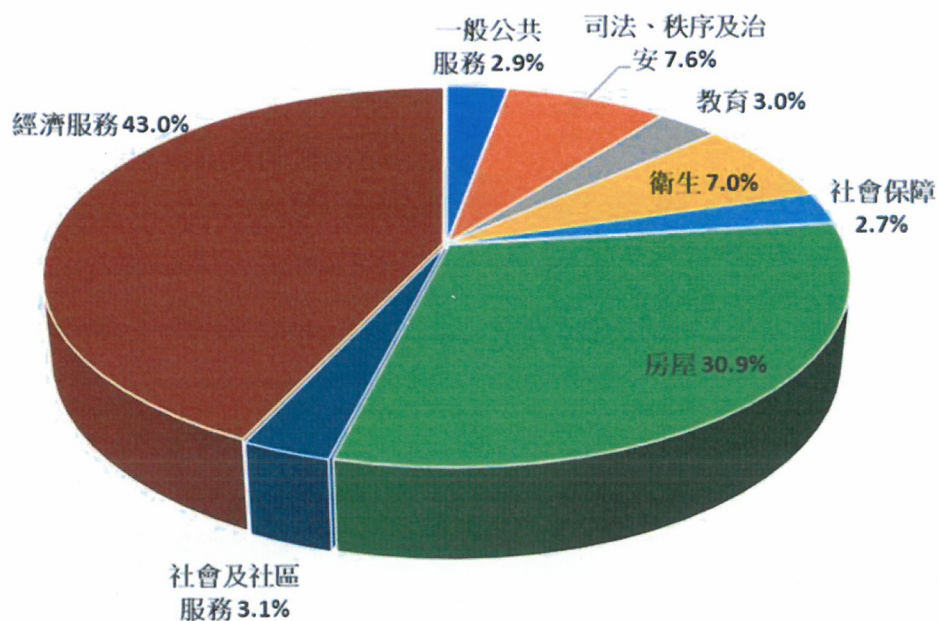

此頁留空

按項目群

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算 b
公共設施工程	2,098,534,200.00	2,473,770,800.00
澳門城市集體運輸系統	1,968,157,700.00	2,697,157,700.00
公共房屋	6,307,322,100.00	6,307,322,100.00
路橋、山坡及航道	1,880,067,100.00	1,880,067,100.00
澳門大學橫琴新校園	214,227,800.00	214,227,800.00
部門設施工程	1,344,409,400.00	1,394,579,840.00
部門設備	575,583,200.00	655,627,198.00
公共設施設備	2,574,100.00	2,574,100.00
醫療設備	65,921,000.00	65,921,000.00
新監獄建造	179,409,100.00	181,083,105.68
運輸工具	106,592,000.00	106,592,000.00
建造離島醫療綜合體	1,229,286,900.00	1,229,286,900.00
儲水設施	3,773,900.00	3,773,900.00
智慧雲警務	32,450,000.00	32,450,000.00
新城填海區 A 區建造	1,409,980,600.00	1,847,177,600.00
總額	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68

按項目群

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
2,040,836,812.60	2,196,665,141.79	82.5	88.8
2,630,379,699.39	2,696,592,689.57	97.5	100.0
6,186,559,729.56	6,256,568,197.83	98.1	99.2
1,658,609,105.56	1,791,364,155.99	88.2	95.3
196,586,740.10	202,389,540.10	91.8	94.5
1,343,297,894.62	1,365,036,298.16	96.3	97.9
587,259,325.62	623,755,285.84	89.6	95.1
2,574,006.00	2,574,006.00	100.0	100.0
37,981,374.50	51,441,993.80	57.6	78.0
178,704,955.78	179,832,730.45	98.7	99.3
106,592,000.00	106,592,000.00	100.0	100.0
872,489,210.32	1,107,237,489.98	71.0	90.1
3,317,567.53	3,719,527.53	87.9	98.6
30,807,863.00	30,807,863.00	94.9	94.9
1,808,300,342.50	1,844,159,277.41	97.9	99.8
17,684,296,627.08	18,458,736,197.45	92.6	96.7

按組織分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算 b
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00
財政局	573,155,300.00	599,339,801.90
身份證明局	34,700,000.00	27,704,000.00
博彩監察協調局	123,776,400.00	192,353,900.00
勞工事務局	0.00	18,009,900.00
行政公職局	303,598,800.00	290,543,280.00
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00
法務局	92,296,800.00	110,129,300.00
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00
交通事務局	76,300,000.00	76,640,116.90
環境保護局	850,000,000.00	902,795,820.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28
文化局	252,196,700.00	284,775,900.00
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	631,521,098.00
海事及水務局	288,080,000.00	196,788,400.00
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00
房屋局	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	285,502,300.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
50,714,069.67	50,791,575.47	94.9	95.0
548,952,685.33	556,317,900.96	91.6	92.8
8,967,241.80	8,967,241.80	32.4	32.4
178,424,782.29	191,309,915.51	92.8	99.5
14,667,962.00	14,667,962.00	81.4	81.4
250,693,225.95	253,701,325.52	86.3	87.3
8,907,978.86	8,907,978.86	99.0	99.0
86,091,148.00	109,701,975.00	78.2	99.6
2,866,800.00	2,866,800.00	78.5	78.5
49,278,482.85	50,373,342.85	64.3	65.7
850,353,057.82	899,207,739.49	94.2	99.6
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
5,983,840,706.58	6,160,513,737.53	96.3	99.1
178,422,104.17	189,190,867.62	62.7	66.4
181,306,757.30	181,485,070.76	99.8	99.9
618,979,177.59	618,979,177.59	98.0	98.0
179,889,872.63	190,020,853.43	91.4	96.6
178,704,955.78	179,832,730.45	98.7	99.3
159,696,177.56	159,993,927.95	99.5	99.7
26,439,900.00	28,672,600.00	91.8	99.6
907,276,436.27	1,162,005,860.23	69.9	89.5
462,449,003.65	472,635,136.28	90.6	92.6
5,463,815,152.10	5,515,406,306.98	98.9	99.8
7,399,340.66	7,399,340.66	11.7	11.7
144,783,311.20	211,105,556.52	62.7	91.4
196,586,740.10	202,389,540.10	91.8	94.5
89,074,213.37	89,127,666.66	98.3	98.4
23,257,867.48	23,369,190.20	99.5	100.0
276,346,097.66	278,432,349.76	96.8	97.5

按組織分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算 b
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00
市政署	673,155,500.00	626,273,500.00
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門 醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00
總額	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
16,117,897.68	19,632,982.00	80.5	98.1
501,609,582.73	583,345,647.27	80.1	93.1
37,055,898.00	37,055,898.00	92.6	92.6
17,684,296,627.08	18,458,736,197.45	92.6	96.7

按經濟分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算 b
土地	70,811,400.00	66,214,447.11
房屋	6,395,282,400.00	6,404,498,266.67
樓宇及場所	3,683,634,400.00	4,001,926,305.29
路橋及航道	4,548,362,000.00	5,398,719,919.97
陸路口岸	0.00	223,422,705.06
機場	63,168,000.00	63,168,000.00
其他—不動產	35,865,900.00	23,673,620.00
運輸及交通工具	689,735,000.00	1,008,888,624.50
保安用品	59,137,600.00	59,137,600.00
醫療用品	1,012,175,400.00	849,511,689.09
住所用品	3,467,400.00	3,352,240.00
工場及餐廳用品	118,143,700.00	110,600,140.50
傢具	6,689,200.00	9,549,200.00
資訊及系統設備	226,563,500.00	339,425,914.00
文儀及辦公用品	202,800.00	91,090.00
其他—動產	77,029,600.00	98,081,238.41
軟件及版權	289,501,000.00	272,477,277.01
其他	138,519,800.00	158,872,866.07
總額	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
65,549,921.01	65,860,334.01	99.0	99.5
6,289,841,345.31	6,358,940,208.03	98.2	99.3
3,585,048,777.75	3,778,356,094.24	89.6	94.4
5,063,622,957.05	5,290,659,776.78	93.8	98.0
217,575,477.50	217,575,477.50	97.4	97.4
7,399,340.66	7,399,340.66	11.7	11.7
13,887,372.78	15,818,640.23	58.7	66.8
1,005,353,396.86	1,008,888,624.50	99.6	100.0
56,197,225.47	56,197,225.47	95.0	95.0
505,644,667.87	735,438,425.99	59.5	86.6
2,754,946.00	2,754,946.00	82.2	82.2
82,204,734.10	87,706,824.10	74.3	79.3
7,980,653.00	7,980,653.00	83.6	83.6
307,396,343.05	320,416,376.27	90.6	94.4
81,750.00	81,750.00	89.7	89.7
87,956,397.67	90,977,692.67	89.7	92.8
233,948,950.00	257,559,777.00	85.9	94.5
151,852,371.00	156,124,031.00	95.6	98.3
17,684,296,627.08	18,458,736,197.45	92.6	96.7

按功能分類

	二零二四年 最初預算	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算
	a	b
1-00 一般公共服務	500,194,100.00	548,018,040.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	500,194,100.00	548,018,040.00
2-00 司法、秩序及治安	1,094,812,600.00	1,453,357,376.53
2-01 指揮部	20,387,300.00	20,387,300.00
2-02 警察及海關	501,026,700.00	718,543,112.85
2-03 消防	10,500,000.00	9,528,958.00
2-04 民防	3,650,000.00	3,650,000.00
2-05 司法及秩序	379,839,500.00	520,164,900.00
2-06 懲教	179,409,100.00	181,083,105.68
3-00 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
3-02 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
4-00 衛生	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00
4-01 行政、規範及研究	19,670,000.00	19,670,000.00
4-02 醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00
5-00 社會保障	510,316,800.00	510,316,800.00
5-02 社會援助	510,316,800.00	510,316,800.00
6-00 房屋	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31
6-01 行政、規範及研究	94,807,800.00	94,345,015.31
6-02 公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
530,667,657.78	537,537,910.71	96.8	98.1
530,667,657.78	537,537,910.71	96.8	98.1
1,378,751,492.09	1,409,280,258.70	94.9	97.0
20,276,850.40	20,276,850.40	99.5	99.5
707,008,565.62	707,008,565.62	98.4	98.4
8,399,998.00	8,399,998.00	88.2	88.2
2,866,800.00	2,866,800.00	78.5	78.5
461,494,322.29	490,895,314.23	88.7	94.4
178,704,955.78	179,832,730.45	98.7	99.3
456,884,164.67	531,295,363.28	80.9	94.1
456,884,164.67	531,295,363.28	80.9	94.1
942,161,527.27	1,196,850,951.23	70.6	89.6
12,539,276.00	18,220,283.00	63.7	92.6
929,622,251.27	1,178,630,668.23	70.7	89.6
462,449,003.65	472,635,136.28	90.6	92.6
462,449,003.65	472,635,136.28	90.6	92.6
5,817,717,707.81	5,877,597,047.55	98.8	99.8
93,606,981.90	93,663,986.00	99.2	99.3
5,724,110,725.91	5,783,933,061.55	98.7	99.8

按功能分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至十二月三十一日 經核准預算 b
7-00 社會及社區服務	604,599,600.00	587,178,800.00
7-01 文化	252,196,700.00	284,775,900.00
7-02 體育及康樂	343,402,900.00	293,402,900.00
7-04 氣象及地球物理	9,000,000.00	9,000,000.00
8-00 經濟服務	6,916,656,400.00	8,201,493,311.84
8-01 行政、規範及研究	123,776,400.00	192,353,900.00
8-04 基礎設施	1,769,919,900.00	2,147,090,753.34
8-05 運輸	3,758,839,600.00	4,559,163,396.60
8-10 環保	849,464,000.00	901,795,820.00
8-11 商業及工業	0.00	2,491,600.00
8-12 科學技術	303,598,800.00	290,543,280.00
8-99 其他	111,057,700.00	108,054,561.90
總額	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至十二月三十一日 實際開支 c	二零二四年 截至十二月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
432,403,112.97	463,500,236.96	73.6	78.9
178,422,104.17	189,190,867.62	62.7	66.4
245,073,029.94	265,401,390.48	83.5	90.5
8,907,978.86	8,907,978.86	99.0	99.0
7,663,261,960.84	7,970,039,292.74	93.4	97.2
178,424,782.29	191,309,915.51	92.8	99.5
2,091,916,680.19	2,130,290,510.79	97.4	99.2
4,220,483,813.09	4,424,104,249.93	92.6	97.0
849,853,057.82	898,207,739.49	94.2	99.6
1,759,760.00	1,759,760.00	70.6	70.6
250,693,225.95	253,701,325.52	86.3	87.3
70,130,641.50	70,665,791.50	64.9	65.4
17,684,296,627.08	18,458,736,197.45	92.6	96.7

附件二

二零二四財政年度第四季度
「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

黃
王
梁
陸
丁
何
七
林

附件二

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況 按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數量	預算 使用率為 零的項目 數量
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	0
公共建設局	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28	5,983,840,706.58	6,160,513,737.53	96.3%	99.1%	47	1
文化局	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	189,190,867.62	62.7%	66.4%	11	1
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00	50,714,069.67	50,791,575.47	94.9%	95.0%	6	0
市政署	673,155,500.00	626,273,500.00	501,609,582.73	583,345,647.27	80.1%	93.1%	32	0
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	7,399,340.66	11.7%	11.7%	2	1
交通事務局	76,300,000.00	76,640,116.90	49,278,482.85	50,373,342.85	64.3%	65.7%	3	0
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	8,907,978.86	99.0%	99.0%	1	0
行政公職局	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	253,701,325.52	86.3%	87.3%	7	2
身份證明局	34,700,000.00	27,704,000.00	8,967,241.80	8,967,241.80	32.4%	32.4%	3	1
房屋局	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92	5,463,815,152.10	5,515,406,306.98	98.9%	99.8%	26	0
法務局	92,296,800.00	110,129,300.00	86,091,148.00	109,701,975.00	78.2%	99.6%	2	0
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	472,635,136.28	90.6%	92.6%	1	0

林 1/3

黃 吳 陳 李

附件二

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況 按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目 數量	預算 使用率為 零的項目 數量
海事及水務局	288,080,000.00	196,788,400.00	179,889,872.63	190,020,853.43	91.4%	96.6%	12	0
財政局	573,155,300.00	599,339,801.90	548,952,685.33	556,317,900.96	91.6%	92.8%	11	0
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00	26,439,900.00	28,672,600.00	91.8%	99.6%	1	0
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	278,432,349.76	96.8%	97.5%	3	0
勞工事務局	-	18,009,900.00	14,667,962.00	14,667,962.00	81.4%	81.4%	1	0
博彩監察協調局	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	191,309,915.51	92.8%	99.5%	1	0
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00	16,117,897.68	19,632,982.00	80.5%	98.1%	1	0
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	907,276,436.27	1,162,005,860.23	69.9%	89.5%	12	0
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00	196,586,740.10	202,389,540.10	91.8%	94.5%	17	0
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	631,521,098.00	618,979,177.59	618,979,177.59	98.0%	98.0%	10	1
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00	89,074,213.37	89,127,666.66	98.3%	98.4%	1	0
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00	159,696,177.56	159,993,927.95	99.5%	99.7%	7	0
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00	144,783,311.20	211,105,556.52	62.7%	91.4%	1	0

2/3

1

附件二

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」預算執行情況 按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目數量
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00	23,257,867.48	23,369,190.20	99.5%	100.0%	1	0
環境保護局	850,000,000.00	902,795,820.00	850,353,057.82	899,207,739.49	94.2%	99.6%	17	0
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00	37,055,898.00	37,055,898.00	92.6%	92.6%	1	0
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	179,832,730.45	98.7%	99.3%	1	0
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	2,866,800.00	78.5%	78.5%	2	0
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00	181,306,757.30	181,485,070.76	99.8%	99.9%	2	0
合計	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	18,458,736,197.45	92.6%	96.7%	243	7

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

林

3/3

93

張

吳

黃

附件三

二零二四財政年度第四季度 「投資計劃」 - 執行期變動的項目

(二零二四年第三季度與二零二四年第四季度比較)

黃
✓
西
單
張
一
紅
七
林

附件三

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」 -

執行期變動的項目

(二零二四年第三季度與二零二四年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第四季度預計 完成日期	第三季度預計 完成日期	變動
1	公共建設局	輕軌東線項目	2031年	2027年	4年
2	公共建設局/環境保護局	新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程	2027年	2025年	2年
3	環境保護局	林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施建造工程	2026年	2024年	2年
4	公共建設局	輕軌氹仔線	2025年	2024年	1年
5	公共建設局	慕拉士大馬路公共房屋	2025年	2024年	1年
6	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	2029年	2028年	1年
7	公共建設局	澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網建造工程	2025年	2024年	1年
8	公共建設局	奧林匹克游泳館圓形地西南匝道橋建造工程	2025年	2024年	1年
9	公共建設局	友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修工程	2027年	2026年	1年
10	文化局	澳門戶外表演區建造工程	2025年	2024年	1年
11	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	2025年	2024年	1年
12	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	2025年	2024年	1年

1/4

林

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

附件三

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」 - 執行期變動的項目 (二零二四年第三季度與二零二四年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第四季度預計 完成日期	第三季度預計 完成日期	變動
13	市政署	筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程	2025年	2024年	1年
14	市政署	看台街及周邊道路優化工程	2025年	2024年	1年
15	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	2025年	2024年	1年
16	市政署	竹灣馬路至黑沙海灘行人道優化工程	2025年	2024年	1年
17	市政署	澳門科學館圓形地及周邊道路優化工程	2025年	2024年	1年
18	市政署	澳門東亞運體育館下水道整治工程	2025年	2024年	1年
19	市政署	西灣湖廣場及周邊道路優化工程	2025年	2024年	1年
20	市政署	高士德及雅廉訪區、新橋區、荷蘭園區、東望洋區道路優化工程	2025年	2024年	1年
21	市政署	外港及南灣湖新填海區道路優化工程	2025年	2024年	1年
22	市政署	氹仔中心區道路優化工程	2025年	2024年	1年
23	市政署	新口岸區道路優化工程	2025年	2024年	1年
24	市政署	青洲區、筷子基區及林茂塘區道路優化工程	2025年	2024年	1年

2/4

林

2/4

附件三

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」 - 執行期變動的項目 (二零二四年第三季度與二零二四年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第四季度預計 完成日期	第三季度預計 完成日期	變動
25	市政署	沙梨頭及大三巴區、中區道路優化工程	2025年	2024年	1年
26	行政公職局	電子政務展廳展品	2025年	2024年	1年
27	房屋局	新城A區B4地段公共房屋建造工程	2025年	2024年	1年
28	房屋局	新城A區B8地段公共房屋建造工程	2029年	2028年	1年
29	房屋局	新城A區B9地段公共房屋建造工程	2025年	2024年	1年
30	房屋局	新城A區B10地段公共房屋建造工程	2025年	2024年	1年
31	法務局	為特區政府構建新的登記公證資訊系統	2025年	2024年	1年
32	財政局	政府(路環)辦公大樓3樓設計連裝修工程	2025年	2024年	1年
33	衛生局	公共衛生專科大樓一設施設備	2025年	2024年	1年
34	澳門大學	澳門大學 - IAPME量子材料及器件測試設備	2026年	2025年	1年
35	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	2032年	2031年	1年
36	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	醫學中心-設施設備	2026年	2025年	1年
37	財政局	外港新填海區25地段 - 公共辦公大樓	2027年	2028年	-1年

附件三

二零二四財政年度第四季度「投資計劃」 -

執行期變動的項目

(二零二四年第三季度與二零二四年第四季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第四季度預計 完成日期	第三季度預計 完成日期	變動
38	澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	2024年	2025年	-1年
39	房屋局	新城A區B5地段公共房屋建造工程	2026年	2028年	-2年
40	公共建設局	新城區海底隧道工程	2024年	2027年	-3年

林

92

梁

五

李
